



Prefeitura Municipal de Alfenas

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico**

Ofício n.º 252/2025/CG/PMA

Alfenas, 14 de novembro de 2025.

Senhor Presidente,

Segue anexa resposta ao requerimento nº 132/2025 de autoria do Vereador Gilmar Costa.

Atenciosamente,

**Antônio Carlos Esteves Pereira
Secretário Executivo**

**À Sua Excelência, o Senhor
Vereador Matheus Paccini Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Alfenas (MG)**



Prefeitura Municipal de Alfenas
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Gestão 2025-2028

Ofício nº 48/2025

Vereador: Gilmar Costa da Silva
Câmara Municipal de Alfenas

Prezado Vereador,

Em resposta ao requerimento nº 132/2025, informamos que os documentos e informações solicitados serão apresentados conforme segue:

- 1. Fornecer cópia integral dos processos administrativos e documentos contábeis relativos às duas emendas impositivas (ex-Vereador Paulo Agenor Madeira e ex-Vereadora Tani Rose), incluindo empenhos, liquidações e pagamentos;**

R: Conforme solicitado anteriormente, seguem anexas as cópias dos empenhos liquidados, que já haviam sido encaminhadas previamente.

- 2. Especificação detalhada dos serviços realizados (metragem executada de calçadas e sarjetas, materiais utilizados, empresa contratada e valores correspondentes);**

R: Anexamos também as cópias detalhadas solicitadas no item acima.

- 3. Documentos que comprovem o alegado remanejamento da emenda da ex-vereadora Tani Rose, incluindo o número do decreto ou ato que autorizou a mudança de finalidade, bem como o novo destino dos recursos e o comprovante do que foi feito com referida emenda;**

R: Esclarecemos que não houve a emissão de decreto, uma vez que se tratou de um procedimento informal, realizado por meio de ofício, no qual foi informado que a emenda poderia ser utilizada em outra data e local. Destaca-se que já havia sido comunicado que o valor destinado pelo Vereador Paulo Agenor era suficiente para a execução da obra.

- 4. Informar por qual motivo foi feito o remanejamento da emenda da ex-vereadora Tani Rose, pois, a resposta anterior informava que era porque o valor da emenda de Paulo Agenor Madeira era suficiente para obra, mas na verdade foi feito apenas o serviço estrutural e objetivo principal que eram os brinquedos e academia não foram cumpridos. Assim, qual o objetivo de remanejar uma emenda se o cronograma não foi cumprido?**

R: A Secretaria de Obras ficou responsável exclusivamente pela parte estrutural. Ressaltamos que o parque e os brinquedos não são de competência desta Pasta. E referente a emenda da Vereadora: Tani Rose, já foi usada e concluída no complexo da chapada. Segue Anexo empenhos e medições.

- 5. Caso não tenha havido remanejamento formal, esclarecer o motivo pelo qual não foram executados o parquinho, os bancos e a academia ao ar livre, conforme objeto original das emendas, uma vez que conforme resposta enviada, foi feito apenas construção de calçadas, sarjetas e boca de lobo, que não era o objeto propriamente das emendas.**

R: No que se refere aos bancos, cabe informar que os moradores da região solicitaram, de maneira geral, que não fossem instalados, por receio de que pudessem favorecer a comercialização e o uso de substâncias ilícitas.

- 6. Informar se há previsão de conclusão ou complementação da obra, que foi amplamente divulgada e não foi realizada, ou seja, a construção de academias ao ar livre, parquinho infantil e colocação de bancos.**

R: Por fim, conforme mencionado, o parque e os brinquedos são de responsabilidade de outra secretaria. Informamos que todas as etapas sob responsabilidade desta Secretaria já foram concluídas. Os itens remanescentes referem-se à competência de outra secretaria, conforme já comunicado.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,



Iolanda da Silva dos Santos
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

Recebi: ____/____/2025



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
MUNICIPIO DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01

Município: ALFENAS

Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, nº 347 - Centro

Código: EO 7379/2024

Tipo: ORDINARIO

Emissão: 14/11/2024

Processo: 62/2022 Pregão presencial Contrato: 83/2023 Solicitação: 7196

CREDOR: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 12.799.453/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV LINCOLN WESTIN DA SILVEIRA 2131 SAL -

Cidade: Alfenas

UF: MG

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta: 611503-1

Agência: 0095-* - 0095

Tipo da Conta: Corrente

Dotação: 381
Órgão: 13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB
Unidade: 13.007 COORDENADORIA DE PÁTIOS PÚBLICOS
Funcional: 11.452.0018 ALFENAS DESENVOLVIDA
Projeto/Atividade: 1209 EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR PAULO AGENOR MADEIRA
Natureza de despesa: 4.4.90.51.01.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Saldo da dotação:

Saldo inicial e alterações da dotação: 69.959,02
Total empenhado anterior: 0,00
Valor do empenho: 69.959,02
Saldo atualizado da dotação: 0,00

Dados do empenho:

Valor do empenho: 69.959,02
Retenções: 2.238,79
Valor líquido: 67.720,23

Discriminação das retenções:

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

839,61

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

1.399,18

Total de retenções:

2.238,79

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E BOCAS DE LOBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE ALFENAS, SENDO ESTE O PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR PAULO AGENOR MADEIRA, CONFORME O PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 11/11 A 15/11/2024. INFORMAMOS QUE O VALOR DE R\$ 0,02 A MAIOR QUE O VALOR DA MEDIÇÃO SE DEVE A QUESTÕES DE ARREDONDAMENTO DO SISTEMA BETHA CLOUD.

Ordenador da despesa

IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLV. URBANO -

Responsável técnico

GUILHERME HENRIQUE PIRES BONIFÁCIO
CONTADOR - CRC 119.661/O-7

Liquidação Nº: 13546

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: 19/12/2024

WELLINGTON DA SILVA RICARDO 104
LIQUIDANTE

0095

Ordem de pagamento

Nº: 9913

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).

Data: 02/04/2025

CÁSSIO WELLINGTON DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

Dados do pagamento:

Data: 02/04/2025

Banco:

Agência:

Conta:

Documento bancário:

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

CÓPIA

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICIPIO DE ALFENAS****Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS**

Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG

CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300

E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO**Nr.: 7196/2024**

Processo Administrativo:	62/2022
Contrato:	83/2023
Nº da Licitação:	26/2022
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	02/05/2023
Data da Solicitação:	14/11/2024
Sequencial do Contrato:	253

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Data da tramitação: 14/11/2024

Fornecedor: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - ME**Telefone(s): 3532912226****CPF/CNPJ:** 12.799.453/0001-09**Endereço:** LINCOLN WESTIN DA SILVEIRA, , Centro - 37130-001, ALFENAS - MG**E-mail:** jagodoyneto@yahoo.com.br

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma:	1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO
Condição de Pagamento:	ATÉ 21 DIAS
Prazo de Entrega:	7
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Contratação:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE
Observações:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E BOCAS DE LOBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE ALFENAS
Empenho:	7379/2024
Despesas:	381 - 13.007.11.452.0018.1209.4.4.90.51.00 - Emenda Impositiva Vereador Paulo Agenor Madeira
Desdobramento:	4.4.90.51.01.00.00.00
Recurso :	1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	29,360	M3	22011028 1.1	EXECUÇÃO DE CALCADA ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA - SETOP TER-ESC-050		48,9868	1.438,25
			2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) 2.817,24 M3			
				R\$ 33,10 41,07			
2	367,000	M2	22011028 1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE - SETOP TER-REG-005		12,0606	4.426,24
			3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE 35215,00 M2 R\$ 7,99 9,91			
3	29,360	M3	22011028 1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PI - SINAPI 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 2817,24 M3 R\$ 572,14		987,0688	28.980,34
			4	709,91			
10	3,515	M3	22011029 3.1	SETOP TER-ESC-050 ESCAVAÇÃO MANUAL- GUIA M.FIO - 3.1 SETOP TER-ESC-050 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) 804,60 M3		48,9868	172,19
			1	R\$ 33,10 R\$ 41,07			
11	35,150	M2	22011029 3.2	SETOP TER-REG-005 REGULARIZAÇÃO E - 3.2 SETOP TER-REG-005 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE 8046,00 M2 R\$ 7,99 R\$ 9,91		12,0606	423,93
			2				

CÓPIA


* AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Data da tramitação: 14/11/2024

12	185,000	M2	22011029	3.3	SINAPI 94273	ASSENTAMENTO DE		
			3		GUIA MEIO FIO - 3.3 SINAPI 94273		88,2209	16.320,87
					ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 41340,00 M R\$ 49,38 R\$ 61,27			
13	9,945	M3	22011029	4.1	SETOP	TER-ESC-050		
			4		ESCAVAÇÃO MANUAL - 4.1 SETOP		48,9868	487,17
					TER-ESC-050 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) 1864,36M3 R\$ 33,10 R\$ 41,07			
14	99,450	M2	22011029	4.2	SETOP	TER-REG-005		
			5		REGULARIZAÇÃO E C - 4.2 SETOP		12,0606	1.199,43
					TER-REG-005 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE 18643,60 M2 R\$ 7,99 R\$ 9,91			
15	221,000	M2	22011029	4.3	SINAPI 94289	EXECUÇÃO		
			6		DE SARJETA DE CON - 4.3 SINAPI		74,7086	16.510,60
					94289 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 41430,00 M R\$ 45,11 R\$ 55,97			

Total Geral: 69.959,02

Alfenas/MG, 14 de Novembro de 2024


IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
Assinatura e Carimbo do Responsável

CÓPIA

Contábil - MUNICÍPIO DE ALFENAS

contabil.betha.cloud/#/entidades/ZGF0YWJhc2U6MjM4LGVudGI0eTozNzQ=/contabil/empenhamentos/emitidos

ContábilVisão geralConfigurandoAdministrandoExecutandoEscrutando

MUNICÍPIO DE ALFENASPPA 2022 - 2025Exercício 2025

7379/2024

INNOVAR ENGENHARIA (12.799.453/0001-09)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO

14/11/2024

R\$ 69.959,02

TRAMITAR

\$

7379

19546

1217

14/11/2024

Empenho

R\$ 69.959,02

Imposto sobre a Renda - Retido...

R\$ 839,61

Imposto sobre Serviços de Qua...

R\$ 1.399,18

19/12/2024

Liquidação

R\$ 69.959,02

NF 540

R\$ 69.959,02

02/04/2025

Pagamento

R\$ 69.959,02

Caixa Econômica Federal 0095-116-D...

R\$ 67.720,23

Imposto sobre a Renda - Retido...

R\$ 839,61

Imposto sobre Serviços de Qua...

R\$ 1.399,18

7379/2024

INNOVAR ENGENHARIA (12.799.453/0001-09)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO

14/11/2024

R\$ 69.959,02

TRAMITAR

\$

7379

19546

1217

1-1

ANTERIORES

PRÓXIMAS

Solicitações de folha de pagamento

Pesquisar

Q

Y

Não há solicitações no momento

Saldo da despesa

Pesquisar

Q

Y

Faça uma pesquisa ou utilize os filtros para mostrar resultados.

\$

Pesquisar

PCB 15:35

PTB2 22/10/2025



entregue copia para Camila da empresa

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV.

URBANO

Em: 17.12.2024

CI Nº: 82/2024

Para: Departamento de Compras

CÓPIA

Senhor (a) Chefe (a),

Solicitamos o pagamento de serviços prestados.

Os serviços prestados, bem como os locais da realização dos mesmos encontram-se no Relatório anexo fornecido pelo Prestador de Serviços e devidamente assinados pelo Engenheiro de Segurança e Secretária desta Pasta.

De acordo com o Processo 62/2022 e Pregão Presencial 26/2022.

Empresa: **INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA ME**

Período: 11.11.2024 a 15.11.2024

Medição n.2

Valor Total: R\$69.959,00 (sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e nove reais)

- Reconstrução de calçadas
- Obras e Instalação – 381
- Anexo Relatório de serviços prestados devidamente assinados

IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

Recebido na Superintendência de
Compras e Padronização de Material

Data: 17/12/2024

As: 15 : 05 H

Por:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

OBJETO : Execução de Serviços para futura e eventual construção e reconstrução de calçadas , meio-fio,sarjetas, rampas de acessibilidade e bocas de lobo com material ,equipamentos e mão de obra

DATA: 17.12.2024

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11.11.2024 A 15.11.2024


Proponente: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 12.799.453/0001-09

CAÇADAS...- PREGAO: PP: 026/2022 PL: 062/2022 - REGISTRO DE PREÇOS-PM ALFENAS-MG

PLANILHA MEDIÇÃO (2ª MEDIÇÃO) EMENDA IMPOSITIVA
(PAULO AGENOR MADEIRA - FICHA 381)

ITEM PLANILHADO	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT. PREVISTA	UNID	QUANTIDADES EXECUTADAS			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (24,08%)	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
						ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO				
	1		EXECUÇÃO DE CALÇADA									
				1479,980	M3	2535,63	29,36	2564,99	R\$ 39,48	R\$ 48,9868	R\$ 34.844,8236	R\$ 2.196.717,46
1	1.1	SETOP TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)									
				1479,980	M3	2535,63	29,36	2564,99	R\$ 39,48	R\$ 48,9868	R\$ 1.438,2520	R\$ 125.650,61
2	1.2	SETOP TER-REG-005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	12500,000	M2	8016,06	367	8383,06	R\$ 9,72	R\$ 12,0606	R\$ 4.426,2314	R\$ 101.104,53
				12500,000	M2	8016,06	367	8383,06	R\$ 9,72	R\$ 12,0606	R\$ 4.426,2314	R\$ 101.104,53
3	1.3	SINAPI 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.AF_07/2016	1479,980	M3	1966,41	29,36	1995,77	R\$ 795,51	R\$ 987,0688	R\$ 28.980,3402	R\$ 1.969.962,31
	2		EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE									
				30,00	M3	18,1		18,1	R\$ 245,01	R\$ 304,0084	R\$ -	R\$ 5.502,55
4	2.1	SETOP DEM-CON-005	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	30,00	M3	18,1		18,1	R\$ 245,01	R\$ 304,0084	R\$ -	R\$ 5.502,55
				30,00	M3	18,1		18,1	R\$ 8,81	R\$ 10,9314	R\$ -	R\$ 197,86
5	2.2	SINAPI 100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	30,00	M3	18,1		18,1	R\$ 8,81	R\$ 10,9314	R\$ -	R\$ 197,86
				30,00	M3	18,1		18,1	R\$ 8,81	R\$ 10,9314	R\$ -	R\$ 197,86
6	2.3	SINAPI 97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	100,0	M3XKM	21,6		21,6	R\$ 2,76	R\$ 3,4246	R\$ -	R\$ 73,97
				100,0	M3XKM	21,6		21,6	R\$ 2,76	R\$ 3,4246	R\$ -	R\$ 73,97
7	2.4	SETOP TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	30,00	M3	81		81	R\$ 39,48	R\$ 48,9868	R\$ -	R\$ 3.967,93
				30,00	M3	81		81	R\$ 39,48	R\$ 48,9868	R\$ -	R\$ 3.967,93
8	2.5	SETOP TER-REG-005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	300,00	M2	81		81	R\$ 14,12	R\$ 18,6000	R\$ -	R\$ 1.506,60
				300,00	M2	81		81	R\$ 14,12	R\$ 18,6000	R\$ -	R\$ 1.506,60
				300,00	M2	81		81	R\$ 14,12	R\$ 18,6000	R\$ -	R\$ 1.506,60
9	2.6	SETOP URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCC = 25 MPa, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	100,00	UNID	19		19	R\$ 636,77	R\$ 838,7500	R\$ -	R\$ 15.936,25
				100,00	UNID	19		19	R\$ 636,77	R\$ 838,7500	R\$ -	R\$ 15.936,25
	3		EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO FIO)									
				150,00	M3	134,873	3,515	138,388	R\$ 39,48	R\$ 48,9868	R\$ 172,1885	R\$ 6.779,18
10	3.1	SETOP TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	150,00	M3	134,873	3,515	138,388	R\$ 39,48	R\$ 48,9868	R\$ 172,1885	R\$ 6.779,18
				150,00	M3	134,873	3,515	138,388	R\$ 39,48	R\$ 48,9868	R\$ 172,1885	R\$ 6.779,18
11	3.2	SETOP TER-REG-005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	1000,00	M2	1350,22	35,15	1385,37	R\$ 9,72	R\$ 12,0606	R\$ 423,9292	R\$ 16.708,36
				1000,00	M2	1350,22	35,15	1385,37	R\$ 9,72	R\$ 12,0606	R\$ 423,9292	R\$ 16.708,36
				1000,00	M2	1350,22	35,15	1385,37	R\$ 9,72	R\$ 12,0606	R\$ 423,9292	R\$ 16.708,36

[Handwritten signature]

12	3.3	SINAPI 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	5000,00	M	7095,9	185	7280,9	R\$ 71,10	R\$ 88,2209	R\$ 16.320,8628	R\$ 642.327,41
EXECUÇÃO DE SARIETAS												
13	4	SETOP TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	80,00	M3	204,1425	9,945	214,0875	R\$ 39,48	R\$ 48,9868	R\$ 487,1736	R\$ 10.487,46
14	4.1	SETOP TER-REG-005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	1000,00	M2	1450,935	99,45	1550,385	R\$ 9,72	R\$ 12,0606	R\$ 1.199,4243	R\$ 18.698,54
15	4.2	SINAPI 94289	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	5000,00	M	3771,5	221	3992,5	R\$ 60,21	R\$ 74,7086	R\$ 16.510,5935	R\$ 298.273,96
GRELHA												
16	5	SUDECAP 19.13.01	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP	50,00	UNID	45		45	R\$ 565,03	R\$ 701,0892	R\$ -	R\$ 31.549,02
17	5.1	SUDECAP 19.13.01	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP	50,00	UNID	60		60	R\$ 314,96	R\$ 390,8024	R\$ -	R\$ 23.448,14
VALOR MEDIÇÃO "21"												
R\$ 69.959,00												
Importa a seguinte medição : Sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais.												
				SECRETARIA DE OBRAS				ENGº RESPONSÁVEL PREFEITURA:		ENGº RESPONSÁVEL :		
										JOSÉ AUGUSTO GODOY NETO CREA : 30.471/D - 		

 inovar PROJETO CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		FL. 0101	
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Afonso		OBRA:		DATA: 33 / 11 / 2019	
RESP. TÉCNICO: José Augusto Gedeon Neto		ENCARREGADO:			
PRAZO DA OBRA:		TEMPO		BOM	CHUVA FRACA
PRAZO DECORRIDO:		PRAZO RESTANTE:		MANHÃ	CHUVA FORTE
HORÁRIO DE TRABALHO:				TARDE	
				NOITE	
EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
	1 - PATROL		10 - CAMINHÃO BASCULANTE		
	2 - ROLO PÉ CARNEIRO		11 - GRADE		
	3 - ROLO CHAPA		12 - EXTRUSOR		
	4 - ROLO PNEU		13 - CAMINHÃO BETONEIRA	1	
	5 - ESCAVADEIRA		14 - ACABADORA		
	6 - RETRO ESCAVADEIRA		15 - PIPA	1	
	7 - TRATOR		16 - PÁ CARREGADEIRA		
	8 - ESPARGIDOR				
	9 - VASSOURÃO				
PESSOAL	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
	1 - ENGENHEIRO	1	10 - RASTELEIRO		
	2 - ENCARREGADO	1			
	3 - PEDREIRO	2			
	4 - SERVENTE	2			
	5 - PATROLEIRO				
	6 - OPERADOR DE MÁQUINA				
	7 - TRATORISTA				
	8 - CAMINHONEIRO				
	9 - AJUDANTE	2			
SERVIÇOS EXECUTADOS: Execução de calçada com concreto armado Montagem de obra de meio fio Local: Rua Maria da Glória Torres			ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: 		
					
ENGº RESPONSÁVEL / INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.			VISTO E DATA FISCALIZAÇÃO		

(*) OBS. PODEM SER APRESENTADAS NO VERSO DESTA FOLHA.

		DIÁRIO DE OBRAS		FL. 0102			
CLIENTE:		Município de Olivença		DATA: 12/11/14			
OBRA:		Linha 001/022					
RESP. TÉCNICO:		José Augusto Lopes Neto					
ENCARREGADO:		Gustavo Silva		TEMPO	BOM	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
PRAZO DA OBRA:				MANHÃ	X		
PRAZO DECORRIDO:		PRAZO RESTANTE:		TARDE	X		
HORÁRIO DE TRABALHO:		07:00 - 17:00		NOITE			
EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*		
	1 - PATROL		10 - CAMINHÃO BASCULANTE				
	2 - ROLO PÉ CARNEIRO		11 - GRADE				
	3 - ROLO CHAPA		12 - EXTRUSOR				
	4 - ROLO PNEU		13 - CAMINHÃO BETONEIRA	1			
	5 - ESCAVADEIRA		14 - ACABADORA				
	6 - RETRO ESCAVADEIRA		15 - PIPA	1			
	7 - TRATOR		16 - PÁ CARREGADEIRA				
	8 - ESPARGIDOR						
	9 - VASSOURÃO						
PESSOAL	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*		
	1 - ENGENHEIRO	1	10 - RASTELEIRO				
	2 - ENCARREGADO	1					
	3 - PEDREIRO	2					
	4 - SERVENTE	2					
	5 - PATROLEIRO						
	6 - OPERADOR DE MÁQUINA						
	7 - TRATORISTA						
	8 - CAMINHONEIRO						
	9 - AJUDANTE	2					
SERVIÇOS EXECUTADOS:				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:			
Execução de alinhamento com concreto armado. Execução de muro de meio fio. Projeto: José Augusto Lopes Neto							
				VISTO E DATA FISCALIZAÇÃO			

ENGº RESPONSÁVEL / INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

(*) OBS. PODEM SER APRESENTADAS NO VERSO DESTA FOLHA.

		DIÁRIO DE OBRAS		FL. 70 0103			
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Afonso		DATA: 13 / 11 / 20					
OBRA: Rua Velha							
RESP. TÉCNICO: Eng.º Roberto Gomes Neto							
ENCARREGADO: Roberto Neto		TEMPO	BOM	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE		
PRAZO DA OBRA:							
PRAZO DECORRIDO:		PRAZO RESTANTE:		MANHÃ	☒		
HORÁRIO DE TRABALHO:		07:00 - 17:00		TARDE	☒		
				NOITE			
EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*		
	1 - PATROL		10 - CAMINHÃO BASCULANTE				
	2 - ROLO PÉ CARNEIRO		11 - GRADE				
	3 - ROLO CHAPA		12 - EXTRUSOR				
	4 - ROLO PNEU		13 - CAMINHÃO BETONEIRA	2			
	5 - ESCAVADEIRA		14 - ACABADORA				
	6 - RETRO ESCAVADEIRA		15 - PIPA	1			
	7 - TRATOR		16 - PÂ CARREGADEIRA				
	8 - ESPARGIDOR						
	9 - VASSOURÃO						
PESSOAL	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*		
	1 - ENGENHEIRO	1	10 - RASTELEIRO				
	2 - ENCARREGADO	1					
	3 - PEDREIRO	2					
	4 - SERVENTE	2					
	5 - PATROLEIRO						
	6 - OPERADOR DE MÁQUINA						
	7 - TRATORISTA						
	8 - CAMINHONEIRO						
	9 - AJUDANTE	2					
SERVIÇOS EXECUTADOS: Limpeza de calçada com concreto armado Limpeza de bueiros Total Rua Velha Duas Ladeiras Terceira Rua Ladeira da Igreja Velha			ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:				
							
ENG.º RESPONSÁVEL / INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.			VISTO E DATA FISCALIZAÇÃO				

(*) OBS. PODEM SER APRESENTADAS NO VERSO DESTA FOLHA.

CLIENTE:	<i>Prefeitura Municipal de Mafra</i>			DATA: <i>14 / 11 / 20</i>			
OBRA:	<i>Av. Brasil</i>						
RESP. TÉCNICO:	<i>Eng. Alexandre Gomes Neto</i>						
ENCARREGADO:	<i>Eng. Alex</i>			TEMPO	BOM	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
PRAZO DA OBRA:				MANHÃ	☒		
PRAZO DECORRIDO:		PRAZO RESTANTE:		TARDE	☒		
HORÁRIO DE TRABALHO:	<i>07:00 - 17:00</i>			NOITE			

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
	1 - PATROL		10 - CAMINHÃO BASCULANTE		
	2 - ROLO PÉ CARNEIRO		11 - GRADE		
	3 - ROLO CHAPA		12 - EXTRUSOR		
	4 - ROLO PNEU		13 - CAMINHÃO BETONEIRA	<i>1</i>	
	5 - ESCAVADEIRA		14 - ACABADORA		
	6 - RETRO ESCAVADEIRA		15 - PIPA	<i>1</i>	
	7 - TRATOR		16 - PÁ CARREGADEIRA		
	8 - ESPARGIDOR				
	9 - VASSOURÃO				
PESSOAL	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
	1 - ENGENHEIRO	<i>1</i>	10 - RASTELEIRO		
	2 - ENCARREGADO	<i>1</i>			
	3 - PEDREIRO	<i>2</i>			
	4 - SERVENTE	<i>2</i>			
	5 - PATROLEIRO				
	6 - OPERADOR DE MÁQUINA				
	7 - TRATORISTA				
	8 - CAMINHONEIRO				
	9 - AJUDANTE	<i>2</i>			

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Orçamento de obra com contrato assinado
Orçamento de Mão de obra
Brasil - Eng. Alexandre Gomes Neto

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

[Assinatura]

ENGº RESPONSÁVEL / INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

VISTO E DATA FISCALIZAÇÃO

(*) OBS. PODEM SER APRESENTADAS NO VERSO DESTA FOLHA.

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Afonso

OBRA:

Pavimento de 20x20m

DATA:

15 / 11 / 20

RESP. TÉCNICO:

Eng. Augusto Góes Neto

ENCARREGADO:

André da Silva

TEMPO

BOM

CHUVA
FRACA

CHUVA
FORTE

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

PRAZO RESTANTE:

MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

HORÁRIO DE
TRABALHO:

07:00 - 17:00

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

OBS.*

1 - PATROL

2 - ROLO PÉ CARNEIRO

3 - ROLO CHAPA

4 - ROLO PNEU

5 - ESCAVADEIRA

6 - RETRO ESCAVADEIRA

7 - TRATOR

8 - ESPARGIDOR

9 - VASSOURÃO

10 - CAMINHÃO BASCULANTE

11 - GRADE

12 - EXTRUSOR

13 - CAMINHÃO BETONEIRA

14 - ACABADORA

15 - PIPA

16 - PÁ CARREGADEIRA

PESSOAL

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

OBS.*

1 - ENGENHEIRO

2 - ENCARREGADO

3 - PEDREIRO

4 - SERVENTE

5 - PATROLEIRO

6 - OPERADOR DE MÁQUINA

7 - TRATORISTA

8 - CAMINHONEIRO

9 - AJUDANTE

10 - RASTELEIRO

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Execução de corte e colagem com concreto armado

Execução de recapeamento

Local para estacionamento de veículos

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

ENGº RESPONSÁVEL / INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

VISTO E DATA FISCALIZAÇÃO

(*) OBS. PODEM SER APRESENTADAS NO VERSO DESTA FOLHA.

INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA



MEMORIAL FOTOGRÁFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.

Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022

Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024

Endereço da Obra: Rua Maria Deolinda Terra

Bairro: Santa Maria

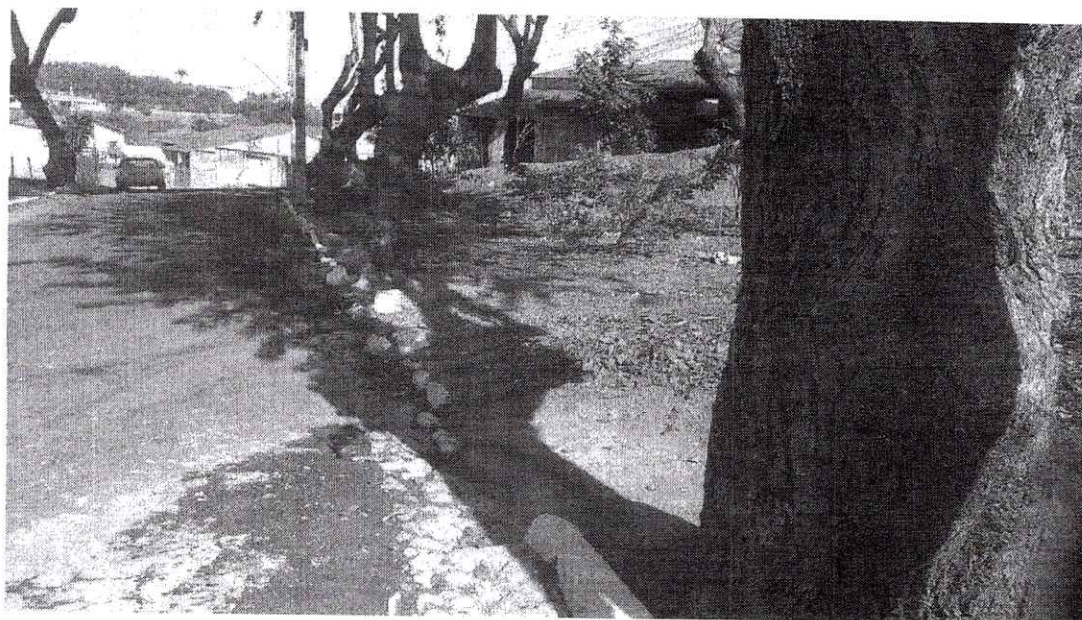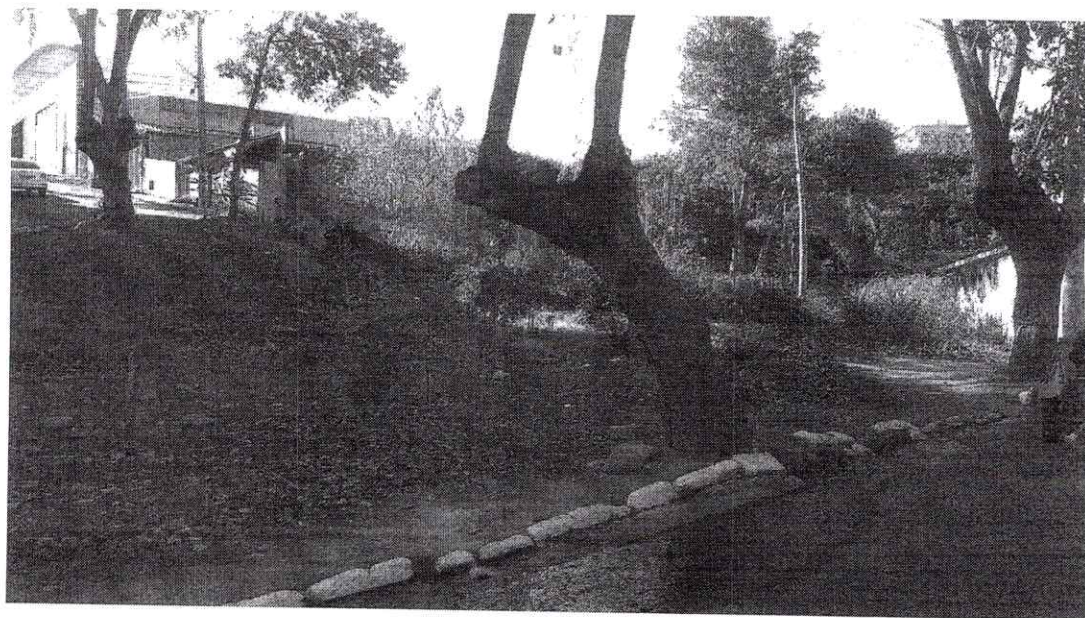

INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA


MEMORIAL FOTOGRAFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.

Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022

Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024

Endereço da Obra: Rua Maria Deolinda Terra

Bairro: Santa Maria

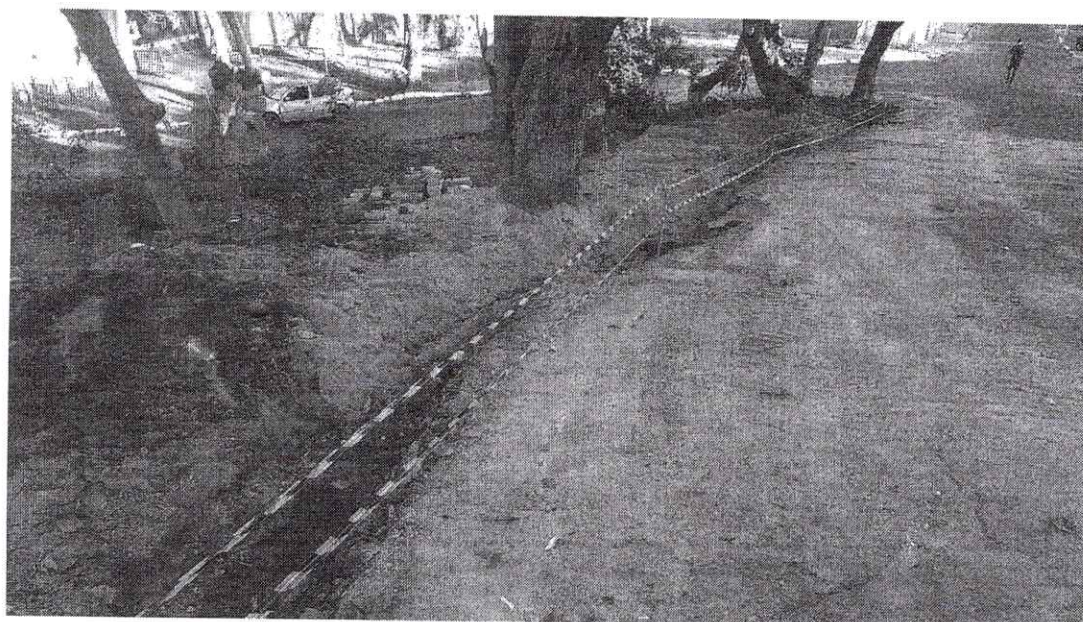

INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA


MEMORIAL FOTOGRAFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.

Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022

Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024

Endereço da Obra: Rua Maria Deolinda Terra

Bairro: Santa Maria

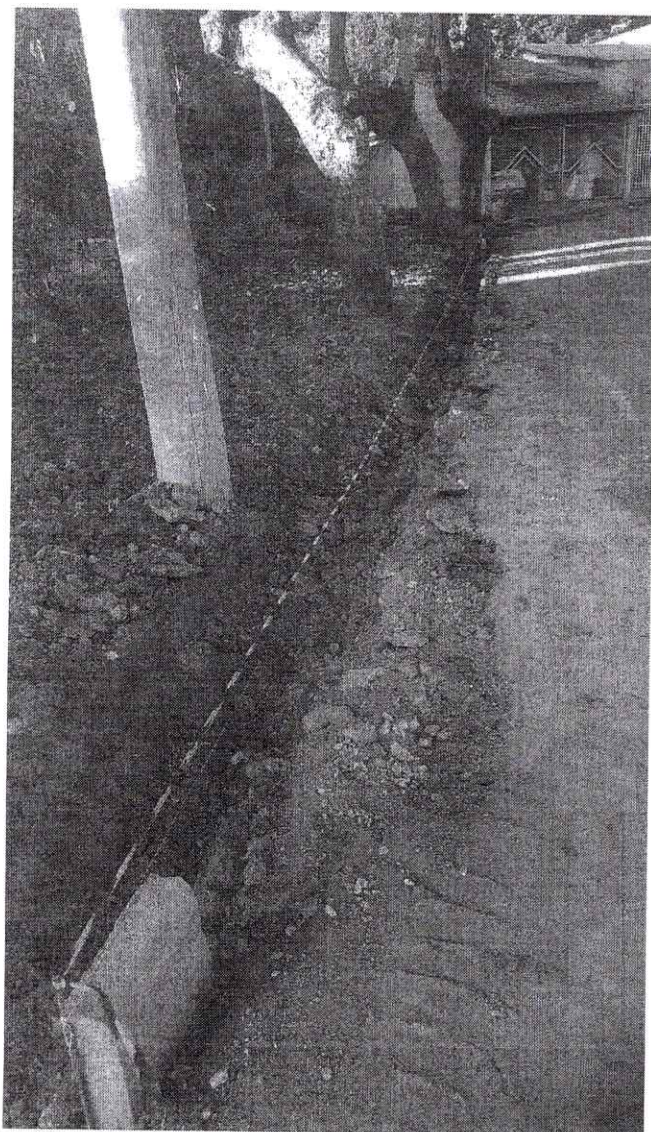

INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA


MEMORIAL FOTOGRÁFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.

Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022

Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024

Endereço da Obra: Rua Maria Deolinda Terra

Bairro: Santa Maria

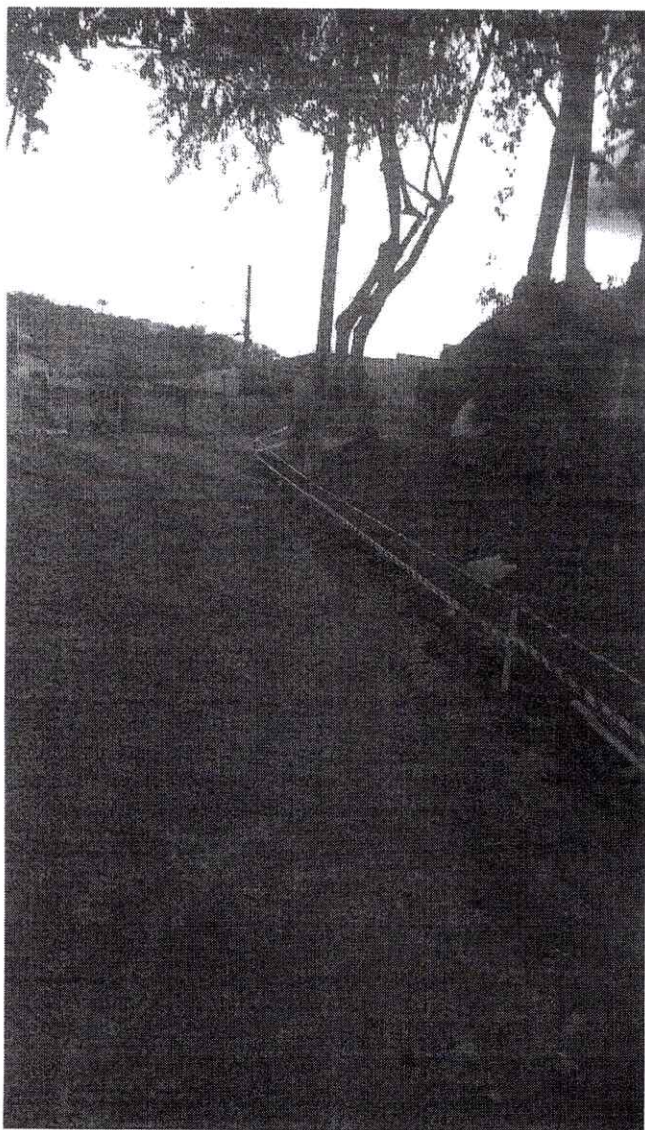

INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA



MEMORIAL FOTOGRÁFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.

Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022

Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024

Endereço da Obra: Rua Maria Deolinda Terra

Bairro: Santa Maria

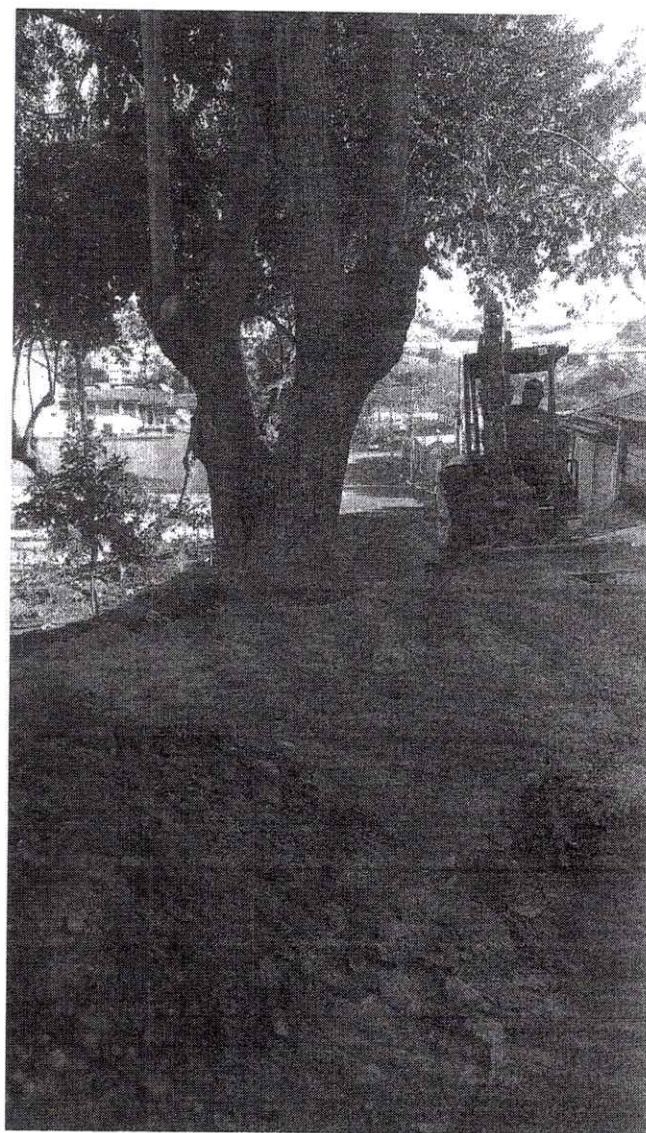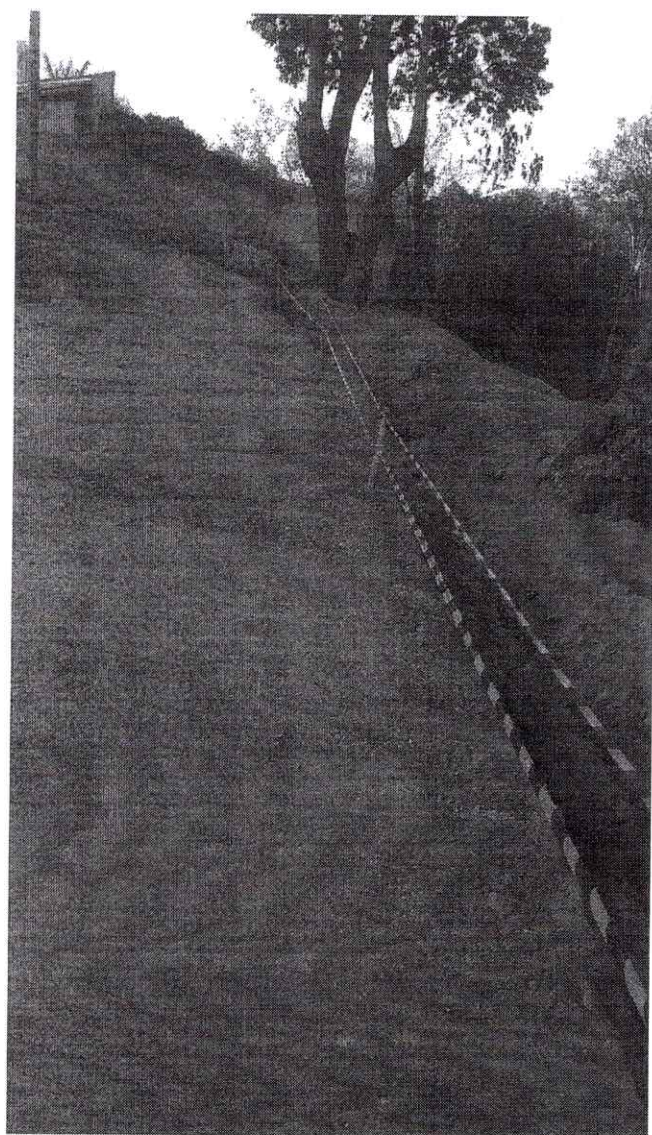

INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA


MEMORIAL FOTOGRÁFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.

Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022

Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024

Endereço da Obra: Rua Maria Deolinda Terra

Bairro: Santa Maria

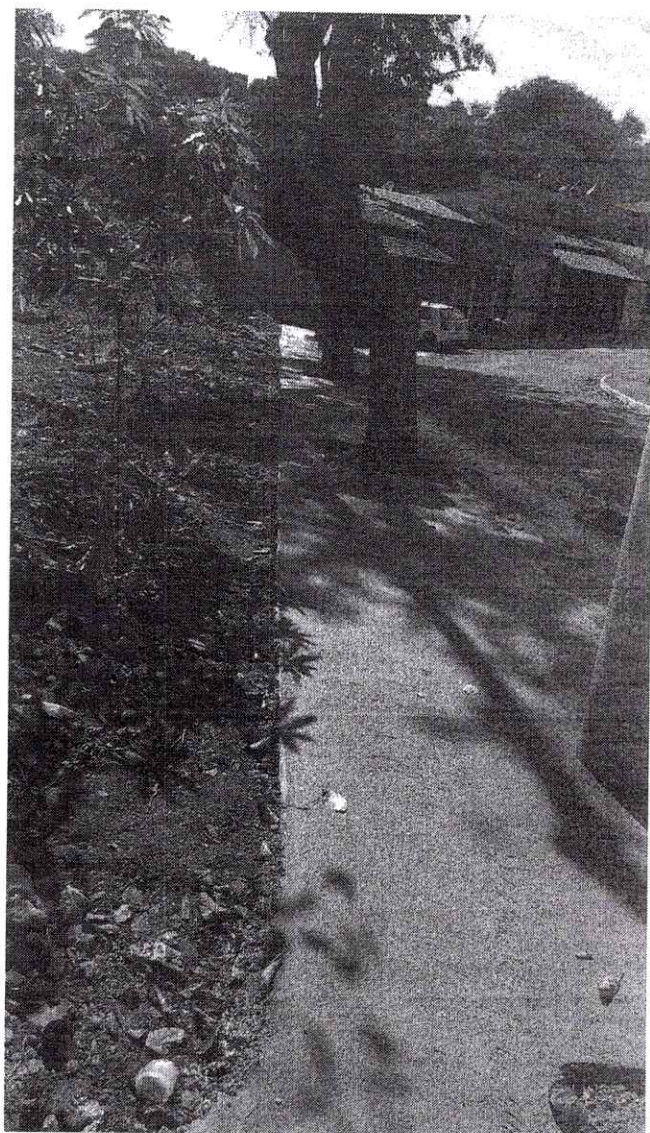

INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

MEMORIAL FOTOGRAFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.

Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022

Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024

Endereço da Obra: Rua Cassimiro Siqueira Viana

Bairro: Santa Maria



INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

MEMORIAL FOTOGRAFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.

Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022

Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024

Endereço da Obra: Rua Cassimiro Siqueira Viana

Bairro: Santa Maria



INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA


MEMORIAL FOTOGRAFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.

Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022

Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024

Endereço da Obra: Rua Cassimiro Siqueira Viana

Bairro: Santa Maria

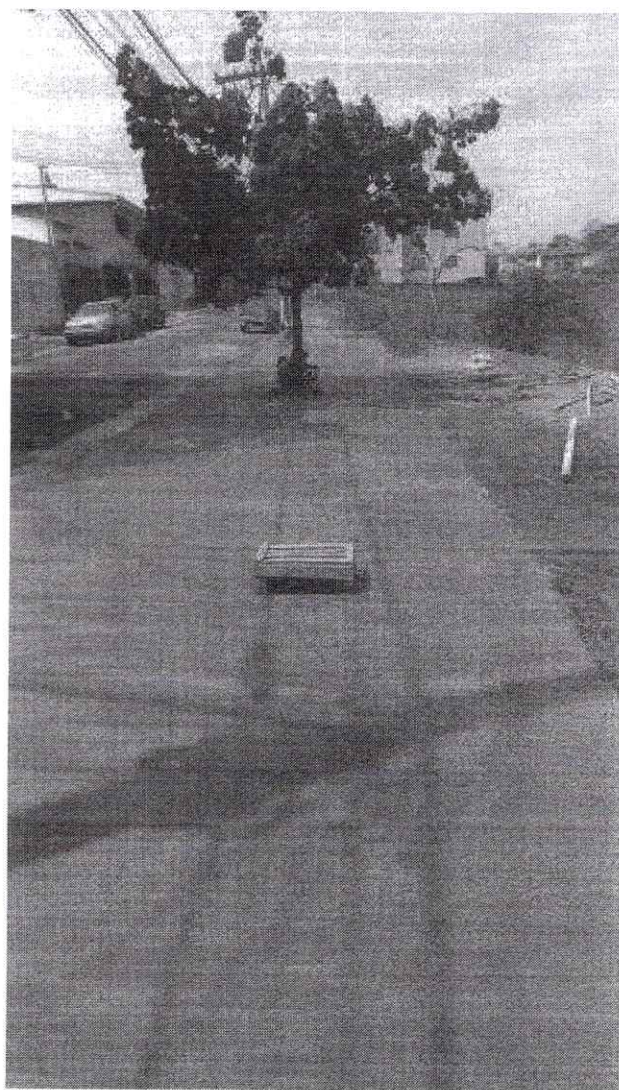

INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA



MEMORIAL FOTOGRAFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.

Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022

Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024

Endereço da Obra: Rua Cassimiro Siqueira Viana

Bairro: Santa Maria

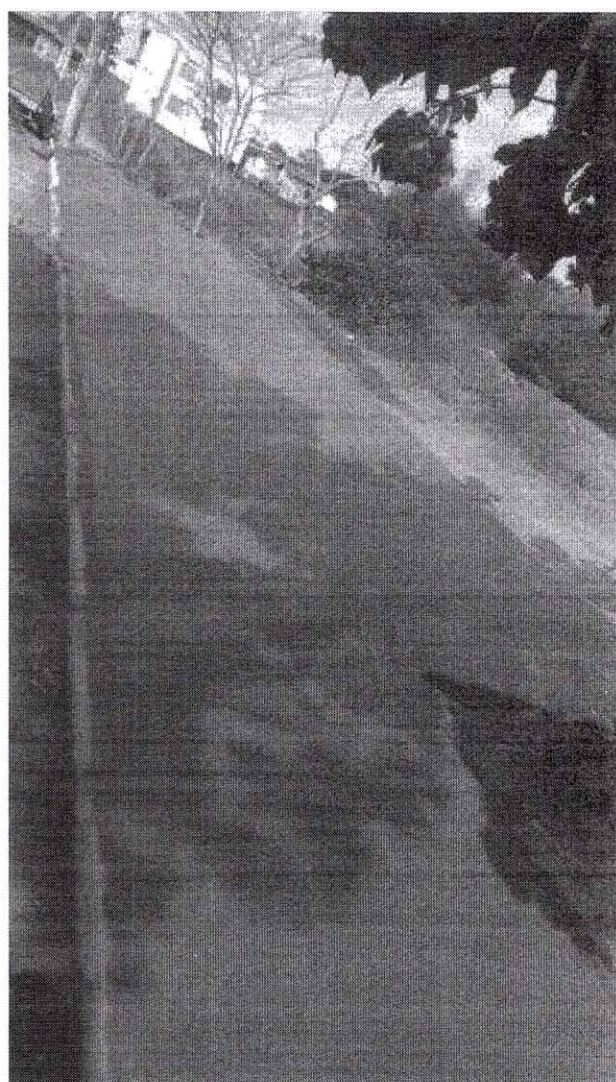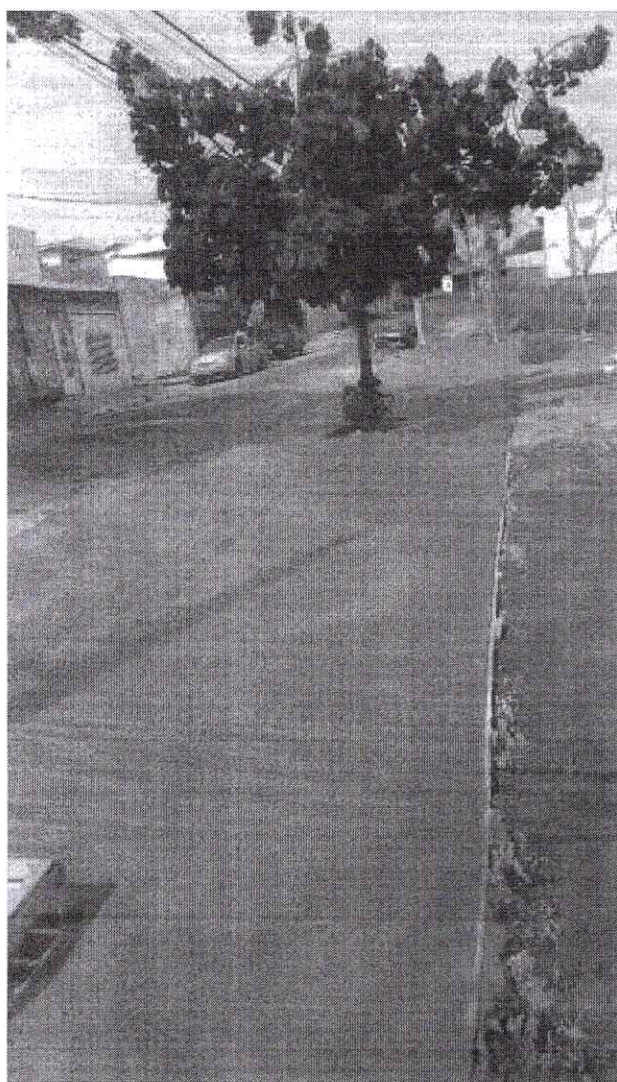

INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA


MEMORIAL FOTOGRÁFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.

Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022

Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024

Endereço da Obra: Rua Cassimiro Siqueira Viana

Bairro: Santa Maria

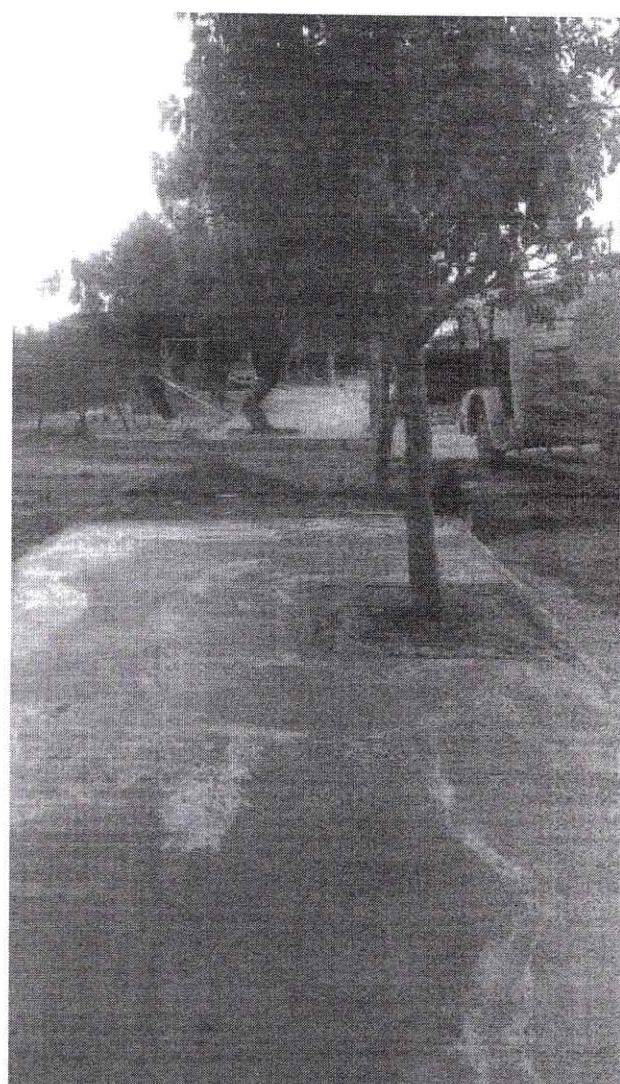



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

Estado de Minas Gerais

Alfenas, 06 de junho de 2024

OFÍCIO N° 90/2024

A Senhora: Iolanda da Silva dos Santos,

Venho por meio deste, declarar que destinei a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano o valor de R\$ 70.000,00 mil reais, para Rua Maria Deolinda Terra. E em acordo com a Vossa Senhoria ressalvo a autorização para que possa ser modificada e executada em data oportuna em obras relacionadas a área de lazer e também em áreas de preservação ambiental.

Justifico ainda que na Rua: Maria Deolinda Terra, já existe uma emenda do Vereador Paulo Agenor Madeira e a mesma já é o suficiente para fazer as adequações necessárias.

Atenciosamente,

Tani Rose Ribeiro
(Tani Rose)
Vereadora

CÓPIA

A Ilma Sra.:
Iolanda da Silva dos Santos
Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano
Alfenas - MG

**NOTA DE EMPENHO ORDINARIO****MUNICIPIO DE ALFENAS**
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01

Município: ALFENAS

Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, nº 347 - Centro

Código: EO 10535/2025

Tipo: ORDINARIO

Emissão: 30/10/2025

Processo: 62/2022 Pregão presencial Contrato: 83/2023 Solicitação: 5590

CREDOR: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 12.799.453/0001-09 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: AV LINCOLN WESTIN DA SILVEIRA 2131 SAL - **Cidade:** Alfenas **Telefone:**
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 611503-1 **UF:** MG
Agência: 0095-* - 0095 **Tipo da Conta:** Corrente

Dotação: 366
Órgão: 13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB
Unidade: 13.006 COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS
Funcional: 15.451.0018 ALFENAS DESENVOLVIDA
Projeto/Atividade: 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS
Natureza de despesa: 3.3.90.39.14.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Saldo da dotação:		Dados do empenho:	
Saldo inicial e alterações da dotação:	363.812,50	Valor do empenho:	69.993,49
Total empenhado anterior:	287.428,30	Retenções:	3.009,72
Valor do empenho:	69.993,49	Valor líquido:	66.983,77
Saldo atualizado da dotação:	6.390,71		

Discriminação das retenções:

INSS OS-209	769,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.399,87
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	839,92
Total de retenções:	3.009,72

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E BOCAS DE LOBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 30ª MEDIÇÃO CONFORME O PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 14/10/2025 A 17/10/2025, DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DA CHAPADA, CONFORME RECURSO DESTINADO ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA TANI ROSE RIBEIRO, INFORMAMOS QUE O VALOR DE R\$ 0,02 (DOIS CENTAVOS) CORRESPONDE A UM ARREDONDAMENTO GERADO PELO SISTEMA BETHA CLOUD DEVIDO À MANIPULAÇÃO DE CASAS DECIMAIS.

Ordenador da despesa	Responsável técnico
 IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLV. URBANO -	 GUILHERME HENRIQUE PIRES BONIFÁCIO CONTADOR - CRC 119.661/O-7

Liquidação	Nº:	Ordem de pagamento	Nº:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).		Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).	
WELLINGTON DA SILVA RICARDO LIQUIDANTE	Data: __/__/__	TANILDA DAS GRACAS ARAUJO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	Data: __/__/__

Dados do pagamento:

Data: __/__/__ Banco: Agência: Conta: Documento bancário:
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento:

CÓPIA

**NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

MUNICIPIO DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01

Município: Alfenas

Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, nº 347 - Centro

Código: 31013323

Emissão: 12/11/2025

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. SAO JOSE -

Cidade: Alfenas

UF: MG

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

CLASSIFICAÇÃO: INSS OS-209

Recursos: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

769,93

Valor da D.E.:

769,93

Saldo da dotação:

Valor da D.E.: 769,93

Valor Anulado: 0,00

Total: 769,93

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:

769,93

Retenções:

0,00

Líquido a pagar:

769,93

Discriminação das retenções:

Total de retenções:

0,00

Especificação:

REFERENTE AO INSS OS 209 RETIDO DA EMPRESA INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - ME REFERENTE À NF 607, EO 10535/2025.

Responsável técnico:

GUILHERME HENRIQUE PIRES BONIFÁCIO
CONTADOR - CRC 119.661/O-7

Ordem de pagamento:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/____

Ordenador da Despesa

Dados do pagamento:

Data: ____/____/____ **Banco:** ____ **Agência:** ____ **Conta:** ____ **Documento bancário:** ____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: ____ **Assinatura:** ____ **Documento:** ____

CÓPIA


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE ALFENAS
Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS

 Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG
 CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300
 E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5590/2025

 Processo Administrativo: 62/2022
 Contrato: 83/2023
 Nº da Licitação: 26/2022
 Modalidade: Pregão
 Data da Contratação: 02/05/2023
 Data da Solicitação: 30/10/2025
 Sequencial do Contrato: 253

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
Data da tramitação: 30/10/2025
Fornecedor: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - ME
Telefone(s): 3532912226
CPF/CNPJ: 12.799.453/0001-09
Endereço: LINCOLN WESTIN DA SILVEIRA, , Centro - 37130-001, ALFENAS - MG
E-mail: jagodoyneto@yahoo.com.br

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO
Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS
Prazo de Entrega: 7
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE
Observações: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E BOCAS DE LOBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 30ª MEDIÇÃO CONFORME O PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 14/10/2025 À 17/10/2025, DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DA CHAPADA, CONFORME RECURSO DESTINADO ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA TANI ROSE RIBEIRO, INFORMAMOS QUE O VALOR DE R\$ 0,02 (DOIS CENTAVOS) CORRESPONDE A UM ARREDONDAMENTO GERADO PELO SISTEMA BETHA CLOUD DEVIDO À MANIPULAÇÃO DE CASAS DECIMAIS.


Empenho: 10535/2025
Despesas: 366 - 13.006.15.451.0018.2021.3.3.90.39.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS
Desdobramento: 3.3.90.39.14.00.00.00
Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	58,976	M3	22011028	1.1 EXECUÇÃO DE CALCADA ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA - SETOP TER-ESC-050 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) 2.817,24 M3 R\$ 33,10 41,07		48,9868	2.889,05
2	737,200	M2	22011028	1.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE - SETOP TER-REG-005 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE 35215,00 M2 R\$ 7,99 9,91		12,0606	8.891,07
3	58,976	M3	22011028	1.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PI - SINAPI 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 2817,24 M3 R\$ 572,14 709,91		987,0688	58.213,37
						Total Geral:	69.993,49

CÓPIA

40722/25

Alfenas/MG, 30 de Outubro de 2025


IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
Assinatura e Carimbo do Responsável

CÓPIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

CNPJ/MF 18.243.220/0001-01

PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO 347 – Centro – 37.130-031 - ALFENAS(MG)
Telefone: (35)3698-1300 ou 3698-2110 – E-mail prefeitura@alfenas.mg.gov.br

Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

Correspondência Interna

CI N°78/2025

De: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
Para: Setor de compras.

Alfenas, 21 de outubro 2025.

Solicitamos o pagamento de serviços prestados.

Os serviços prestados, bem como os locais da realização dos mesmos encontram-se no Relatório anexo fornecidos pelo Prestador de Serviços e devidamente assinados pelo Engenheiro de Segurança e Secretária desta Pasta.

De acordo com o Processo 062/2022 e Pregão Presencial 026/2022

Empresa: **INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA ME**

Período: 14.10.2025 a 17.10.2025


Medição n.30

Valor Total: R\$: R\$ 69.993,47 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e três reais, quarenta e sete centavos)

- Obras e Instalações ³⁶⁶~~364~~ ¹⁵⁰⁰
- Complemento da Emenda Impositiva Anterior – Tani Rose Ribeiro
- Anexo Relatório de serviços prestados devidamente assinados

IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano



RECEBIDO EM
Em: 30/10/25 às ____-____
Procedência: _____

Carolina

Nome Legível



TRIAGEM
Em: 04/11/25 às ____-____
Procedência: _____

Melza

Nome Legível


INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

MEMORIAL FOTOGRÁFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.

Data: 20.10.2025 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022

Medição 30 – Período de execução: 14.10.2025 a 17.10.2025

Endereço da Obra: CAMPO DA CHAPADA

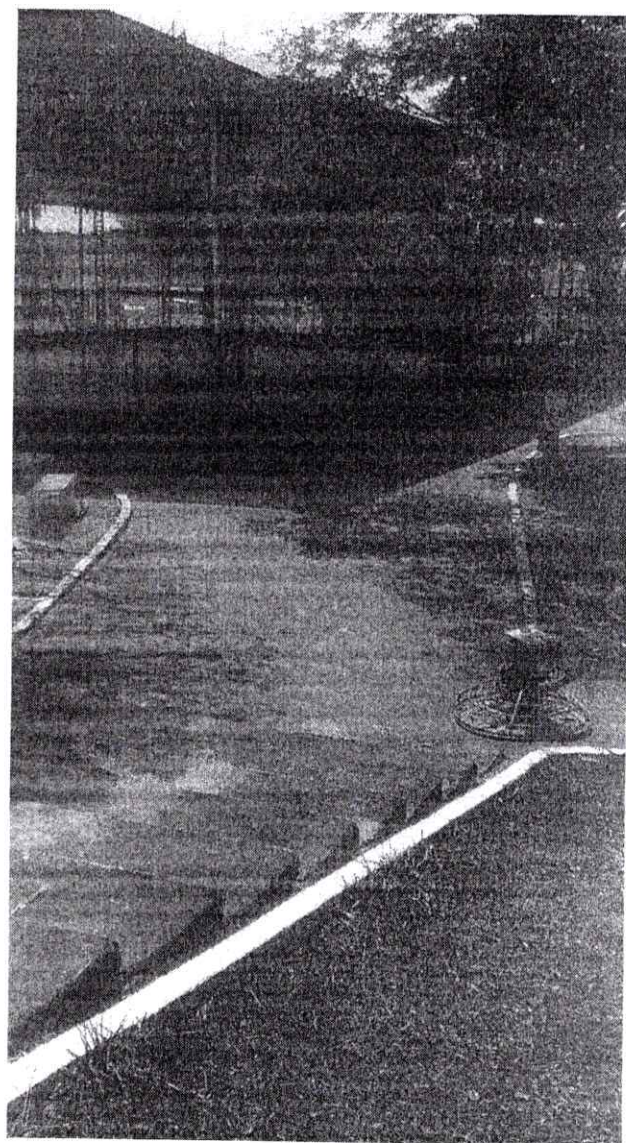

[Handwritten signature]

INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

MEMORIAL FOTOGRÁFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.

Data: 20.10.2025 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022

Medição 30 – Período de execução: 14.10.2025 a 17.10.2025

Endereço da Obra: CAMPO DA CHAPADA



CÓPIA

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEFENS



OBJETO : Execução de Serviços para futura e eventual construção e reconstrução de calçadas , meio-fio, sarjetas, rampas de acessibilidade e bocas de lobo com material , equipamentos e mão de obra

Proprietário: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 12.799.453/0001-09

CALÇADAS...- PREGÃO PP: 026/2022 PL: 062/2022 - REGISTRO DE PREÇOS-PM ALEFENS, MG

DATA: 20.10.2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 14.10.2025 A 17.10.2025

PLANILHA MEDIÇÃO (30ª MEDIÇÃO) EMENDA IMPOSITIVA
(TANI ROSE RIBEIRO - FICHA 364)

ITEM PLANILHADO	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT. PREVISTA	UNID	QUANTIDADES EXECUTADAS			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (24,08%)	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO	
						ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO					
EXECUÇÃO DE CALÇADA													
	1										R\$ 69.993,4712	R\$ 2.630.174,56	
1	1.1	SETOP TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	1479,980	M3	2899,39	58,976	2958,366	R\$ 39,48	R\$ 48,9868	R\$ 2.889,0446	R\$ 144.920,84	
2	1.2	SETOP TER-REG-005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	12500,000	M2	12196,06	737,2	12933,26	R\$ 9,72	R\$ 12,0606	R\$ 8.891,0566	R\$ 155.982,57	
3	1.3	SINAPI 94991	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	1479,980	M3	2300,81	58,976	2359,786	R\$ 795,51	R\$ 987,0688	R\$ 58.213,3700	R\$ 2.329.271,15	
	2			EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE									R\$ 28.223,14
4	2.1	SETOP DEM-CON-005	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	30,00	M3	18,4		18,4	R\$ 245,01	R\$ 304,0084	R\$ -	R\$ 5.593,75	
5	2.2	SINAPI 100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SÓLIDOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / UNIDADE: M3), AF_07/2020	30,00	M3	18,4		18,4	R\$ 8,81	R\$ 10,9314	R\$ -	R\$ 201,14	
6	2.3	SINAPI 97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	100,0	M3XKM	31,6		31,6	R\$ 2,76	R\$ 3,4246	R\$ -	R\$ 108,22	
7	2.4	SETOP TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	30,00	M3	81,3		81,3	R\$ 39,48	R\$ 48,9868	R\$ -	R\$ 3.982,63	
8	2.5	SETOP TER-REG-005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	300,00	M2	84		84	R\$ 14,12	R\$ 18,6000	R\$ -	R\$ 1.562,40	
9	2.6	SETOP URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, DESPENHADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEBÃOS	100,00	UNID	20		20	R\$ 636,77	R\$ 838,7500	R\$ -	R\$ 16.775,00	
	3			EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO FIO)									R\$ 854.279,26
10	3.1	SETOP TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	150,00	M3	177,547		177,547	R\$ 39,48	R\$ 48,9868	R\$ -	R\$ 8.697,46	
11	3.2	SETOP TER-REG-005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	1000,00	M2	1776,96		1776,96	R\$ 9,72	R\$ 12,0606	R\$ -	R\$ 21.431,16	

CÓPIA

12	3.3	SINAPI 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO - FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X3X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	5000,00	M	9341,9		9341,9	R\$	71,10	R\$	88,2209	R\$	-	R\$	824.150,64
13	4.1	SETOP TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRAMENTO MANUAL)	80,00	M/3	298,7325		298,7325	R\$	39,48	R\$	48,9868	R\$	-	R\$	14.633,94
14	4.2	SETOP TER-REG-005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	1000,00	M/2	2396,835		2396,835	R\$	9,72	R\$	12,0606	R\$	-	R\$	28.907,21
15	4.3	SINAPI 94289	EXECUÇÃO DE SARRETA DE CONCRETO USINADO, MOIADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	5000,00	M	5873,5		5873,5	R\$	60,21	R\$	74,7086	R\$	-	R\$	438.800,77
16	5.1	SUDECAP 19.13.01	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRÃO	50,00	UNID	65		65	R\$	565,03	R\$	701,0892	R\$	-	R\$	45.570,80
17	5.1	SUDECAP 19.13.01	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (FERRO FUNDIDO) - PADRÃO	50,00	UNID	60		60	R\$	314,96	R\$	390,8024	R\$	-	R\$	23.448,14
EXECUÇÃO DE SARRETA													R\$	-	R\$	482.341,93
GRELHA													R\$	-	R\$	69.018,94
VALOR MEDIÇÃO "30"													R\$	-	R\$	69.993,47
IMPORTA A SEGUINTE MEDIÇÃO: Sessenta e nove mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos.													R\$	-	R\$	69.993,47



SECRETARIA DE OBRAS

ENGº RESPONSÁVEL PREFEITURA:

ENGº RESPONSÁVEL:


JOSÉ AUGUSTO GODOY NETO
CREA: 30.471/D

CÓPIA

inovar PROJETO CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		FL. 0122			
CLIENTE:		<i>Prefeitura Municipal de Alfenas</i>		DATA: <i>14, 10, 25</i>			
OBRA:		<i>Luzes 062/222</i>					
RESP. TÉCNICO:		<i>Engº Augusto Epitácio Neto</i>					
ENCARREGADO:		<i>Rondineira Neto</i>		TEMPO	BOM	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
PRAZO DA OBRA:							
PRAZO DECORRIDO:		PRAZO RESTANTE:		MANHÃ	X		
HORÁRIO DE TRABALHO:		07:00-17:00		TARDE	X		
				NOITE			
EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*		
	1 - PATROL		10 - CAMINHÃO BASCULANTE				
	2 - ROLO PÉ CARNEIRO		11 - GRADE				
	3 - ROLO CHAPA		12 - EXTRUSOR				
	4 - ROLO PNEU		13 - CAMINHÃO BETONEIRA	3			
	5 - ESCAVADEIRA		14 - ACABADORA				
	6 - RETRO ESCAVADEIRA		15 - PIPA				
	7 - TRATOR		16 - PÁ CARREGADEIRA				
	8 - ESPARGIDOR						
	9 - VASSOURÃO	2					
PESSOAL	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*		
	1 - ENGENHEIRO	1	10 - RASTELEIRO				
	2 - ENCARREGADO	1					
	3 - PEDREIRO	2					
	4 - SERVENTE	2					
	5 - PATROLEIRO						
	6 - OPERADOR DE MÁQUINA						
	7 - TRATORISTA						
	8 - CAMINHONEIRO	2					
	9 - AJUDANTE	2					
SERVIÇOS EXECUTADOS:				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:			
<i>Execução de calçada com concreto armado</i>							
<i>Local: Campo da Chopada</i>							
							
ENGº RESPONSÁVEL / INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.				VISTO E DATA FISCALIZAÇÃO			


(*) OBS. PODEM SER APRESENTADAS NO VERSO DESTA FOLHA.

Cópia

		DIÁRIO DE OBRAS		FL. Nº 0123	
CLIENTE: <i>Defensor de Pessoas</i>		DATA: <i>16 / 10 / 25</i>			
OBRA: <i>Ruço 062/222</i>					
RESP. TÉCNICO: <i>Dr. August Epdy Neto</i>					
ENCARREGADO: <i>Samuel Pato</i>		TEMPO	BOM	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
PRAZO DA OBRA:					
PRAZO DECORRIDO:		PRAZO RESTANTE:		MANHÃ	☒
HORÁRIO DE TRABALHO:		<i>07:00 - 17:00</i>		TARDE	☒
				NOITE	☐
EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
	1 - PATROL		10 - CAMINHÃO BASCULANTE		
	2 - ROLO PÉ CARNEIRO		11 - GRADE		
	3 - ROLO CHAPA		12 - EXTRUSOR		
	4 - ROLO PNEU		13 - CAMINHÃO BETONEIRA	3	
	5 - ESCAVADEIRA		14 - ACABADORA		
	6 - RETRO ESCAVADEIRA		15 - PIPA		
	7 - TRATOR		16 - PÁ CARREGADEIRA		
	8 - ESPARGIDOR				
	9 - VASSOURÃO	2			
PESSOAL	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
	1 - ENGENHEIRO	1	10 - RASTELEIRO		
	2 - ENCARREGADO	1			
	3 - PEDREIRO	2			
	4 - SERVENTE	2			
	5 - PATROLEIRO				
	6 - OPERADOR DE MÁQUINA				
	7 - TRATORISTA				
	8 - CAMINHONEIRO	2			
	9 - AJUDANTE	2			
SERVIÇOS EXECUTADOS: <i>Tracção de calçada com concreto armado</i> <i>base: cimento de chapa</i>			ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:		
					
ENGº RESPONSÁVEL / INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.			VISTO E DATA FISCALIZAÇÃO		

(*) OBS. PODEM SER APRESENTADAS NO VERSO DESTA FOLHA.

CÓPIA

inovar PROJETO CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		FL. 0124			
CLIENTE:		<i>Prefeitura Municipal de Alfenas</i>		DATA: <i>17/10/25</i>			
OBRA:		<i>Luzo 062/222</i>					
RESP. TÉCNICO:		<i>Eng. Augusto Gaby Neto</i>					
ENCARREGADO:		<i>Sombra pelo</i>		TEMPO	BOM	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
PRAZO DA OBRA:				MANHÃ	X		
PRAZO DECORRIDO:		PRAZO RESTANTE:		TARDE	X		
HORÁRIO DE TRABALHO:		<i>07:00 - 17:00</i>		NOITE			
EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*		
	1 - PATROL		10 - CAMINHÃO BASCULANTE				
	2 - ROLO PÉ CARNEIRO		11 - GRADE				
	3 - ROLO CHAPA		12 - EXTRUSOR				
	4 - ROLO PNEU		13 - CAMINHÃO BETONEIRA	3			
	5 - ESCAVADEIRA		14 - ACABADORA				
	6 - RETRO ESCAVADEIRA		15 - PIPA				
	7 - TRATOR		16 - PÁ CARREGADEIRA				
	8 - ESPARGIDOR						
	9 - VASSOURÃO	2					
PESSOAL	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*		
	1 - ENGENHEIRO	1	10 - RASTELEIRO				
	2 - ENCARREGADO	1					
	3 - PEDREIRO	2					
	4 - SERVENTE	2					
	5 - PATROLEIRO						
	6 - OPERADOR DE MÁQUINA						
	7 - TRATORISTA						
	8 - CAMINHONEIRO	2					
	9 - AJUDANTE	2					
SERVIÇOS EXECUTADOS:				ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:			
<i>Execução de calçada com concreto armado</i>							
<i>local: Campo da Chapada</i>							
							
ENGº RESPONSÁVEL / INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.				VISTO E DATA FISCALIZAÇÃO			

(*) OBS. PODEM SER APRESENTADAS NO VERSO DESTA FOLHA.

CÓPIA



MUNICIPIO DE ALFENAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
607

Data e Hora da Emissão	14/11/2025 09:10:38	Competência	Novembro/2025	Código de Verificação	TJJZJUKCO
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Alfenas

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA				
Nome Fantasia	INOVAR PROJETO E CONSTRUÇÃO				
CPF/CNPJ	12.799.453/0001-09	Inscrição Municipal	15663	Município	Alfenas UF MG
Endereço	AV LINCOLN WESTIN DA SILVEIRA, 2131, Centro				
Cep	37132-194	Telefone	(35) 3291-2226	Email	financeiro@construtorahiper.com.br
Complemento	SALA 02	Insc. Estadual	0017560700080		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS				
Nome Fantasia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS				
CPF/CNPJ	18.243.220/0001-01	Inscrição Municipal		Município	Alfenas UF MG
Endereço	84 FAUSTO MONTEIRO, 347, CENTRO				
Cep	37130-031	Telefone		Email	compras@alfenas.mg.gov.br
Complemento		Insc. Estadual	null		

Descrição dos Serviços

Item	Descrição CNAE	Valor Unitário	Qty	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
07.02	4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	69.993,4900	1,0000	69.993,4900	27.997,40 x 5,00	1.399,87

Descrição do

30º MEDICAO PR: 62/2022 PP: 26/2022 CONTRATO 83/2023 AF: 5590/2025 :

58,976 M3 ESCAVACAO MANUAL DE TERRA X R\$ 48, 9868 TOTAL = R\$ 2.889,05

737,200 M2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE X R\$ 12, 0606 TOTAL= R\$ 8.891,07

58,976 M3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO X R\$ 987,0688 = R\$ 58.213,37

VALOR TOTAL DA 30º MEDICAO= R\$ 69.993,49 (PERIODO: 14/10/2025 A 17/10/2025)

CÁLCULO ISS PMA:

MATERIAL (60%) R\$: 41.996,09

MAO DE OBRA (40%) R\$: 27.997,40

CÁLCULO INSS RECEITA DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 RECEITA FEDERAL

MAO DE OBRA (10%): R\$ 6.999,35 x 11% R\$: 769,93 (INSS)

IR SOB (1, 2%) SOB A NOTA R\$ 839,92

CONTA PARA

DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0095

OPERACAO: 003

CONTA: 611.503-1

PIX: 12799453000109 .

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 769,93	IR:	R\$ 839,92	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	------------	-----	------------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		64.883,97		

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	69.993,49	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	41.996,09
(-) Retenções Federais	1.609,85	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional	Alíquota		
(-) ISS Retido / Substituído	1.399,87	Não	5,00	ISS	
(=) Valor Líquido R\$	66.983,77	Incentivo a Cultura			
		Não			

CÓPIA



MUNICIPIO DE ALFENAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
607

Data e Hora da Emissão	14/11/2025 09:10:38	Competência	Novembro/2025	Código de Verificação	TJJZJUKCO
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Alfenas

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA				
Nome Fantasia	INOVAR PROJETO E CONSTRUÇÃO				
CPF/CNPJ	12.799.453/0001-09	Inscrição Municipal	15663	Município	Alfenas UF MG
Endereço	AV LINCOLN WESTIN DA SILVEIRA, 2131, Centro				
Cep	37132-194	Telefone	(35) 3291-2226	Email	financeiro@construtorahiper.com.br
Complemento	SALA 02	Insc. Estadual	0017560700080		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS				
Nome Fantasia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS				
CPF/CNPJ	18.243.220/0001-01	Inscrição Municipal		Município	Alfenas UF MG
Endereço	84 FAUSTO MONTEIRO, 347, CENTRO				
Cep	37130-031	Telefone		Email	compras@alfenas.mg.gov.br
Complemento		Insc. Estadual	null		

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Alfenas

Nota alterada conforme processo administrativo: 607.

Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 3.765,65 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 786,73 (2,81%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade


Declaro que os materiais / serviços constantes no presente documento foram entregues em condições satisfatórias para o Município, sendo recebidos provisoriamente, nos termos da alínea A, inciso I e II da Alinea A do inciso II do art. 73 da Lei nº 8.666/93

Servidor (a)

Cargo

Recebemos em

CÓPIA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.620,34
Número da Guia: 012511102310687-5 Data Emissão: 11/11/2025 09:08:20 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 12.799.453/0001-09		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		BRUNA SILVA ALVES DE ABREU	66	133.364.736-08	101	19/11/2025	Mensal	2.247,00	179,76	0,00	0,00	0,00	179,76
10/2025		ELIANE DA SILVA DINIZ	75	097.954.786-56	101	19/11/2025	Mensal	1.025,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
		Total do Tomador						3.272,00	261,76	0,00	0,00	0,00	261,76
		Total do Estabelecimento						3.272,00	261,76	0,00	0,00	0,00	261,76
		Total FGTS						20.254,61	1.620,34	0,00	0,00	0,00	1.620,34

CÓPIA




Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.620,34
Número da Guia: 0125111102310687-5 Data Emissão: 11/11/2025 09:08:20 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.023.35643/78		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		LUCAS VINICIUS CAZECA ALVES	36	706.896.776-00	101	19/11/2025	Mensal	2.215,86	177,26	0,00	0,00	0,00	177,26
10/2025		MILTON JOSE DA SILVA	73	878.401.036-34	101	19/11/2025	Mensal	1.878,80	150,30	0,00	0,00	0,00	150,30
Total do Tomador							Sem Tomador	4.094,66	327,56	0,00	0,00	0,00	327,56
Total do Estabelecimento							90.023.35643/78	4.094,66	327,56	0,00	0,00	0,00	327,56
							Total FGTS	20.254,61	1.620,34	0,00	0,00	0,00	1.620,34

CÓPIA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.620,34
Número da Guia: 0125111102310687-5 Data Emissão: 11/11/2025 09:08:20 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E
Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.023.85095/75										Tomador: Sem Tomador		
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Multa	Total
10/2025		IANDARA IZA MARIA DA SILVA	27	121.913.556-92	101	19/11/2025	Mensal	2.337,78	187,02	0,00	0,00	187,02
10/2025		NEILSON DE SOUZA PEREIRA	60	055.053.956-51	101	19/11/2025	Mensal	2.748,80	219,90	0,00	0,00	219,90
10/2025		SILAS AUGUSTO DO CARMO GONCALVES	26	154.329.236-45	101	19/11/2025	Mensal	3.052,96	244,23	0,00	0,00	244,23
Total do Tomador				Sem Tomador				8.139,54	651,15	0,00	0,00	651,15
Total do Estabelecimento				90.023.85095/75				8.139,54	651,15	0,00	0,00	651,15
Total FGTS								20.254,61	1.620,34	0,00	0,00	1.620,34

CÓPIA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.620,34
Número da Guia: 0125111102310687-5 Data Emissão: 11/11/2025 09:08:20 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.025.00951/72			Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apropriação	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz	Multa	Total
10/2025	LUCAS COSTA GONCALVES	71	071.689.239-19	101	19/11/2025	Mensal	2.094,15	167,53	0,00	0,00	0,00	167,53
10/2025	WAGNER LUIZ DOS REIS	74	030.549.135-94	101	19/11/2025	Mensal	2.654,26	212,34	0,00	0,00	0,00	212,34
Total do Tomador							Sem Tomador	4.748,41	379,87	0,00	0,00	379,87
Total do Estabelecimento							90.025.00951/72	4.748,41	379,87	0,00	0,00	379,87
							Total FGTS	20.254,61	1.620,34	0,00	0,00	1.620,34

CÓPIA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.620,34
Número da Guia: 0125111102310667-5 Data Emissão: 11/11/2025 09:08:20 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E
Relação de Categorias

Estabelecimento: 12.799.453/0001-09

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	2	3.272,00	261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,76
Total do Estabelecimento			12.799.453/0001-09	3.272,00	261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	261,76

Estabelecimento: 90.023.35643/78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	2	4.094,66	327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,56
Total do Estabelecimento			90.023.35643/78	4.094,66	327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	327,56

Estabelecimento: 90.023.85095/75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	3	8.139,54	651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,15
Total do Estabelecimento			90.023.85095/75	8.139,54	651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	651,15

Estabelecimento: 90.025.00951/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	2	4.748,41	379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,87
Total do Estabelecimento			90.025.00951/72	4.748,41	379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	379,87

Total FGTS

20.254,61 1.620,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620,34

Cópia



Qtd. Trabalhadores FGTS:	9	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	1.620,34

1.620,34

Descrição das categorias:

- COP



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.620,34
Número da Guia: 012511102310687-5 Data Emissão: 11/11/2025 09:08:20 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	12.799.453/0001-09	2	3.272,00	261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,76
10/2025	90.023.35643/78	2	4.094,66	327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,56
10/2025	90.023.85095/75	3	8.139,54	651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,15
10/2025	90.025.00961/72	2	4.748,41	379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,87
Total FGTS			20.254,61	1.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,34

CÓPIA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.620,34
Número da Guia: 012511102310687-5 Data Emissão: 11/11/2025 09:08:20 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 12.799.453/0001-09												
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	11 - FGTS mensal	2	3.272,00	261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,76		
Total do Estabelecimento			12.799.453/0001-09	3.272,00	261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	261,76		
Estabelecimento: 90.023.35643/78												
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	11 - FGTS mensal	2	4.094,66	327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,56		
Total do Estabelecimento			90.023.35643/78	4.094,66	327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	327,56		
Estabelecimento: 90.023.85095/75												
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	11 - FGTS mensal	3	8.139,54	651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,15		
Total do Estabelecimento			90.023.85095/75	8.139,54	651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	651,15		
Estabelecimento: 90.025.00951/72												
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	11 - FGTS mensal	2	4.748,41	379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,87		
Total do Estabelecimento			90.025.00951/72	4.748,41	379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	379,87		
Total FGTS				20.264,61	1.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,34		

CÓPIA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.620,34
Número da Guia: 0125111102310687-5 Data Emissão: 11/11/2025 09:08:20 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	9	20.254,61	1.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,34		
Total FGTS		20.254,61	1.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,34		

CÓPIA
