



Prefeitura Municipal de Alfenas

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico**

Ofício n.º 81/2025/CG/PMA

Alfenas, 18 de maio de 2026.

Senhor Presidente,

Segue anexa a resposta ao requerimento nº 40/2026, de autoria dos Vereadores Gilmar, Ednilson e Maria idalina.

Atenciosamente,

**Antônio Carlos Esteves Pereira
Secretário Executivo**

**À Sua Excelência, o Senhor
Vereador Matheus Paccini Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Alfenas (MG)**



PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2025 / 2028

Secretaria Municipal de
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Em atenção ao Requerimento nº 58/2026 apresentado pela comunicação interna do Gabinete, viemos por meio deste apresentar as informações solicitadas, conforme segue:

Resp. Req. 40/2026

1- Foi realizada a anulação da licitação (Concorrência Pública nº 002/2021 – Processo nº 205/2021) e do correspondente Contrato Administrativo nº 115/2022, conforme reiterado pelo Ministério Público?

Resposta da Secretaria: Sim

Entretanto, esclarece-se que tais atos ocorreram em gestão anterior desta secretaria, não dispondo esta Administração, até o presente momento, da integralidade dos documentos comprobatórios.

Ressalta-se que os fatos, da integralidade, tais como empenhos, liquidações e pagamentos realizados no período de outra gestão dessa secretaria. Dos registros e documentos necessários para aferição detalhada das movimentações financeiras. Dessa forma, informa-se que essas informações serão encontradas nas secretarias mun.de supr. e contratos de suprimentos e secretaria da fazenda.

2- Houve, de fato, a suspensão de todo e qualquer pagamento à empresa Minas Concessionária S/A após a recomendação ministerial? Em caso afirmativo, encaminhar documentação comprobatória contendo datas, valores, empenhos e liquidações realizadas;

Em atenção ao questionamento, informa-se que não foi possível, até o presente momento, confirmar de forma conclusiva se houve a suspensão integral de pagamentos à empresa Minas referem-se à gestão anterior, não dispondo esta Administração, até o momento encaminhada Concessionária S/A após eventual recomendação ministerial.

Ressalta-se que os fatos, da integralidade, tais como empenhos, liquidações e pagamentos realizados no período de outra gestão dessa secretaria. Dos registros e documentos necessários para aferição detalhada das movimentações financeiras. Dessa forma, informa-se que essas informações serão encontradas nas secretarias mun.de supr. e contratos de suprimentos e Secretaria da fazenda.

3- Quem está executando atualmente os serviços de manutenção de estradas rurais no Município? Informar qual instrumento jurídico fundamenta a execução (contrato, dispensa, emergência, execução direta, etc.), encaminhando cópia integral do respectivo processo;

REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CONTRATO Nº 081/2025
PROCESSO 136/2025
DISPENSA Nº 034/2025

4- Houve qualquer utilização, direta ou indireta, de contratos firmados com a empresa A3 Construtora e Loteadora Ltda. para execução dos serviços após a suspensão do contrato com a Minas Concessionária S/A? Em caso afirmativo, encaminhar documentos comprobatórios;

Em atenção ao questionamento, informa-se que esta Administração não dispõe, até o presente momento, de informações ou registros que permitam confirmar eventual utilização, direta ou indireta, de contratos firmados com a empresa A3 Construtora e Loteadora Ltda. para execução de serviços após a suspensão do contrato com a empresa Minas Concessionária S/A.

Ressalta-se que os fatos, da integralidade, tais como empenhos, liquidações e pagamentos realizados no período de outra gestão dessa secretaria. Dos registros e documentos necessários para aferição detalhada das movimentações financeiras. Dessa forma, informa-se que essas informações serão encontradas nas secretarias mun.de supr. e contratos de suprimentos e secretaria da fazenda.

5- Foi realizada auditoria especializada para apuração de eventuais irregularidades, sobrepreço ou danos ao erário, conforme recomendado pelo Ministério Público? Em caso negativo, justificar os motivos e informar prazo para sua realização;

Em atenção ao questionamento, informa-se que não há, até o presente momento, confirmação acerca da realização de auditoria especializada destinada à apuração de eventuais irregularidades, sobre preço ou danos ao erário, conforme mencionado.

Ressalta-se que os fatos, da integralidade, tais como empenhos, liquidações e pagamentos realizados no período de outra gestão dessa secretaria. Dos registros e documentos necessários para aferição detalhada das movimentações financeiras. Dessa forma, informa-se que essas informações serão encontradas nas secretarias mun.de supr. e contratos de suprimentos e secretaria da fazenda.

6- Foi instaurado procedimento no Controle Interno do Município para apuração das irregularidades relacionadas à licitação e ao contrato? Em caso afirmativo, encaminhar cópia do ato inaugural e informações sobre o andamento;

Em atenção ao questionamento, informa-se que não há, até o presente momento, confirmação acerca da instauração de procedimento no âmbito do Controle Interno



do Município para apuração de eventuais irregularidades relacionadas à licitação e ao contrato mencionados.

Ressalta-se que os fatos, da integralidade, tais como empenhos, liquidações e pagamentos realizados no período de outra gestão dessa secretaria. Dos registros e documentos necessários para aferição detalhada das movimentações financeiras. Dessa forma, informa-se que essas informações serão encontradas nas secretarias mun.de supr. e contratos de suprimentos e secretaria da fazenda.

7- Qual a atual situação do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade (PAAR) instaurado pelo Município? Informar fase atual, diligências realizadas e justificativa para eventual paralisação;

Informamos por se tratar de fatos ocorridos da gestão anterior dessa secretaria, não possuímos dados algum para informar até o presente o momento.

8- Encaminhar planilha detalhada contendo todos os pagamentos realizados após a suspensão do contrato, relacionados à execução de serviços de manutenção de estradas rurais, conforme solicitado pelo Ministério Público.

Informamos por se tratar de fatos ocorridos da gestão anterior dessa secretaria, não possuímos dados algum para informar até o presente o momento.

Mas ressaltamos que as medições da empresa que está atuando, atualmente nas manutenção das estradas serão encaminhadas.

* Requerimento nº 41/2026, de autoria do Vereador Thales Silva Gomes.

Assunto: enviar informações detalhadas acerca dos gastos com imprensa, publicidade institucional e serviços de comunicação social realizados pelo Município, nos últimos 24 meses, discriminado por exercício.

I. Apresentar a relação completa de todos os contratos, convênios ou instrumentos firmados com empresas de comunicação, agências de publicidade, rádios, jornais, portais e demais veículos, contendo:

- a) Razão social e CNPJ;
- b) Objeto do contrato;
- c) Valor total contratado;
- d) Valor efetivamente pago;
- e) Vigência contratual.

Essa secretaria não possui gastos, contratos, convênios ou quaisquer despesas relacionadas à imprensa, publicidade institucional ou serviços de comunicação social no período solicitado.

Alfenas, 14 de Maio de 2026
Atenciosamente,





RODOLFO BORGES -
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
CNPJ 18.243.220/0001-01
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS
Rua João Luiz Alves, n.º 181, centro – CEP 37.130-143 – Alfenas-MG
Site: www.alfenas.mg.gov.br



CONTRATO Nº 081/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS MG E A EMPRESA REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

A Prefeitura Municipal de Alfenas, Estado de Minas Gerais, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa na Rua João Luiz Alves, n.º 181, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.243.220/0001-01, neste ato representada pelo seu Secretário Municipal de Desenvolvimento Sr. DÉCIO PAULINO DA COSTA, de ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 53.778.325/0001-66, com sede na TV. Dinah Aparecida Fronteira Theodoro, n.º 40, PQ Gabriel, Hortolândia-SP, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. **RICARDO ELTRE SILVA GERALDO**, portador da Carteira de Identidade n.º ~~484526479~~ SSP/SP e do CPF/ME n.º ~~435.589.628/50~~ doravante denominada de **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato nos termos de **DISPENSA EMERGENCIAL**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - Este contrato tem por objeto **CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS**, conforme O.S. (Ordem de Serviço) e Especificações Técnicas no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 – O regime de execução da obra é o de empreitada por preço global, nos termos **DISPENSA EMERGENCIAL**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – Para a execução total da obra fica contratado o preço global de R\$ 4.966.850,00 (quatro milhões, novecentos e sessenta e seis reais e oitocentos e cinquenta reais)

3.2 – O contrato durante toda sua vigência e execução deverá observar o equilíbrio financeiro nos parâmetros da proposta, conjugado na composição de preços dos valores básicos de cada item.

3.3 – Os pagamentos serão efetuados de acordo com o Cronograma Físico e Financeiro, depois da realização das medições que serão elaboradas conforme a execução das O.Ss fornecidas pela Administração e ratificadas pelo gestor e Fiscalização.

3.3.1 – As medições da obra executada poderão ou não serem procedidas por engenheiro civil designado como fiscal pela **CONTRATANTE**, a critério da Administração.

Secretaria Municipal de Suprimentos e Contratos
Rua João Luiz Alves, n.º 181, centro – CEP 37.130-143 – Alfenas(MG)
Fone Geral: (35)3698-1365 – Compras P.M.A: (35) 3698-2110 - Compras F.M.S: (35) 3698-1364/2156
Contratos: (35) 3698 1359/65 – Financeiro P.M.A: (35) 3698- 1774- Financeiro F.M.S: (35) 3698-1372
Licitações: (35)3698-1360 - e-mail:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br
Horário de Atendimento: 12h às 18h



3.3.2 – A medição final, bem como os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra será elaborada por Comissão de Vistoria ou pelo servidor designado pela Administração Municipal como Fiscal do Contrato para tal finalidade quando concluída toda a obra.

3.4 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes.

3.5 – Os preços do contrato poderão ser reajustados, porém, será observada estritamente a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do mesmo.

3.6 – A CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste instrumento poderá sustar o pagamento de qualquer fatura no todo ou em parte, nos seguintes casos:

- a) execução defeituosa da obra;
- b) existência de qualquer débito exigível pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DA OBRA

4.1 – O presente contrato terá vigência de 6 (seis meses), passando a vigorar a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE e nos termos da lei.

4.1 – A CONTRATADA observará o prazo de dias corridos, contados da data do recebimento da "ORDEM DE SERVIÇOS" para execução da obra, promovendo, então, sua entrega em perfeitas condições de imediato uso.

4.1.1 – As etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto estão demonstradas no Termo de Referência.

4.2 – Só se admitirá a prorrogação de prazos quando houver impedimentos que paralise ou restrinjam o normal andamento da obra decorrentes de fatos alheios à responsabilidade da CONTRATADA, atestados e reconhecidos pela CONTRATANTE.

4.3 – Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais serão encaminhados por escrito um dia após o evento enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados por escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos os casos com justificação circunstanciada.

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA

5.1 – As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária: 64/2025

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

- a) Cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a execução do projeto básico e do memorial descritivo estejam prontos e a obra seja entregue inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de uso;
- b) Observar, na execução da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as



- posturas, inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas específicas;
- b) Providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos serviços, as aprovações respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de placas exigidas pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE;
 - c) Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra necessários à execução da obra.
 - d) Fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e materiais novos e de primeira qualidade.
 - e) Executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços executados.
 - f) Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos de quitação.
 - g) Assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes de serviços públicos, aos fatos de que resultem na destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA".
 - h) Arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas referentes à obra, inclusive licença em repartições.
 - i) Fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações da mesma;
 - j) Providenciar o registro da obra junto ao CREA/MG e entregar à CONTRATANTE a respectiva ART.
 - k) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra, objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente contrato.
 - l) Apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsável da CONTRATANTE, especificando claramente o custo específico com a mão-de-obra.
 - m) Receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às medições da obra já executada.
 - n) A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado.

7.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:

- a) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da CONTRATADA.
- b) Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei.
- c) Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostos na forma da lei e do presente contrato.
- d) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais deste instrumento.
- e) Fiscalizar a execução da obra por intermédio do seu engenheiro



FL.	

responsável, utilizando seu próprio Diário de Obra.

r) Exercer a fiscalização da obra por intermédio do seu Controlador Interno, designado como **Fiscal do Contrato**, cujos apontamentos deverão ser encaminhados ao seu engenheiro responsável.

s) Cumprir e fazer cumprir os termos deste presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico e financeiro durante a execução do contrato.

t) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do recebimento das notas fiscais e respectivas medições de cada O.S., já devidamente atestadas por Engenheiro responsável pela fiscalização.

u) Aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial da obra ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas deste contrato.

v) Efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução da obra, após a sua conclusão e entrega final.

w) Efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de cada parcela.

x) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

8.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são:

- a) Advertência verbal ou escrita.
- b) Multas.
- c)

8.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas.

8.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:

a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra.

b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato nas faltas consideradas leves, que não comprometam o andamento da obra.

c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos previstos em lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa.

d) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de Alfenas – MG, por prazo não superior a dois anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.



FL.	

e) Perda da garantia contratual, quando for o caso.

8.4 – De qualquer sanção imposta a CONTRATADA poderá oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado, no prazo máximo de cinco dias, contados da intimação do ato.

8.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente.

8.6 – A multa definida na alínea "a" do item 8.3, será descontada de imediato dos pagamentos das parcelas devidas e a multa prevista na alínea "b" do mesmo item será descontada por ocasião do último pagamento.

8.7 – A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea "b" acima referida, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO

9.1 – A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

a) A CONTRATADA não iniciar os trabalhos dentro de vinte dias contados da data do recebimento da "ORDEM DE SERVIÇO" ou interrompê-los por mais de vinte dias consecutivos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE.

b) A CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente contrato, no todo ou em parte.

c) A CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos no Cronograma Físico e Financeiro aprovado pela CONTRATANTE.

d) A CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou imperfeições das obras, dos serviços ou das instalações, ou com respeito a quaisquer dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra utilizados.

e) As multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

f) A CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações previstas neste contrato ou dele decorrente;

9.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista.

9.3 – A rescisão deste contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequências:

a) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração.

b) Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma da lei.

c) Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
CNPJ 18.243.220/0001-01
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS
Rua João Luiz Alves, n.º 181, centro – CEP 37.130-143 – Alfenas-MG
Site: www.alfenas.mg.gov.br

FL.	

d) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

9.4 – A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO

~~10.1 – O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao Termo de Referência.~~

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

11.1 – Aplica-se a Lei nº 14.133/2021 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em especial aos seus casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

12.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

13.1 – A fiscalização da execução da obra, além do **Fiscal do Contrato**, será exercida por engenheiro civil credenciado, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento da obra que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, ao seu exclusivo juízo.

13.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados.

13.3 – Todas as ORDENS DE SERVIÇOS, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais.

13.4 – A CONTRATADA obriga-se a retirar da obra e não readmitir os empregados, contratados ou prepostos que venham a criar embaraços à fiscalização, bem como a remover quaisquer materiais ou equipamentos que não estejam de acordo com as especificações aprovadas para a execução da obra.

13.5 – Da(s) decisão(ões) da fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 – Concluída a obra, se estiver em perfeitas condições, atestada pela

Secretaria Municipal de Suprimentos e Contratos
Rua João Luiz Alves, n.º 181, centro – CEP 37.130-143 – Alfenas(MG)
Fone Geral: (35)3698-1365 – Compras P.M.A: (35) 3698-2110 - Compras F.M.S: (35) 3698-1364/2156
Contratos: (35) 3698 1359/65 – Financeiro P.M.A: (35) 3698- 1774 - Financeiro F.M.S: (35) 3698-1372
Licitações: (35)3698-1360 - e-mail:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br
Horário de Atendimento: 12h às 18h



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
CNPJ 18.243.220/0001-01
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS
Rua João Luiz Alves, n.º 181, centro – CEP 37.130-143 – Alfenas-MG
Site: www.alfenas.mg.gov.br

FL.	

CONTRATANTE, será recebida por uma Comissão de Vistoria ou pelo servidor Indicado pela Administração, especialmente designado como Fiscal do Contrato, que lavrará o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO", dentro de cinco dias da comunicação feita pela CONTRATADA.

14.1.1 – O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO somente será lavrado se todos os serviços da obra estiverem concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrário, será lavrado TERMO DE NÃO RECEBIMENTO, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento da obra.

14.2 – Decorridos quinze dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual.

14.3 – O TERMO DE ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS será emitido após a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social e do CRS do FGTS - Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente à obra contratada.

14.3.1 – O prazo máximo para apresentação das Certidões será de quinze dias da data da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, decorrido o qual a CONTRATANTE emitirá o TERMO DE ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. Em caso de não apresentação, será imposta a multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do contrato.

14.4 – Após a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, do cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no contrato por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, e após o atendimento ao disposto nesta cláusula, lavrar-se-á o TERMO DE ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS no prazo de cinco dias do atendimento de todas as condições estabelecidas neste item.

14.5 – A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do recebimento da obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o Código Civil Brasileiro.

14.6 – Os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, DEFINITIVO e de ENCERRAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS não eximirão a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 – A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de projetos ou especificações se houve motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência.

15.2 – A CONTRATADA somente poderá subempreitar parte do objeto contratado com prévia concordância da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsável perante a CONTRATANTE pelas obras, serviços ou instalações executadas pela subempreiteira e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a ela imputáveis.

15.3 – As prorrogações de prazo de execução de etapas da obra serão processadas nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

Secretaria Municipal de Suprimentos e Contratos
Rua João Luiz Alves, n.º 181, centro – CEP 37.130-143 – Alfenas(MG)
Fone Geral: (35)3698-1365 – Compras P.M.A: (35) 3698-2110 - Compras F.M.S: (35) 3698-1364/2156
Contratos: (35) 3698 1359/85 – Financeiro P.M.A: (35) 3698- 1774 - Financeiro F.M.S: (35) 3698-1372
Licitações: (35)3698-1360 - e-mail:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br
Horário de Atendimento: 12h às 18h



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
CNPJ 18.243.220/0001-01
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS
Rua João Luiz Alves, n.º 181, centro – CEP 37.130-143 – Alfenas-MG
Site: www.alfenas.mg.gov.br



15.4 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei acima referida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Alfenas – MG, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

16.2 – E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em três vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Alfenas – MG, 23 de Julho de 2025.


DÉCIO PAULINO DA COSTA
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Rural

Documento assinado digitalmente
gov.br RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
Data: 28/07/2025 14:13:18-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>
RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
Sócio Diretor (proprietário) CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
RG n°
CPF n°

Nome:
RG n°
CPF n°



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
CNPJ 18.243.220/0001-01
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS
Rua João Luiz Alves, n.º 181, centro – CEP 37.130-143 – Alfenas-MG
Site: www.alfenas.mg.gov.br

FL.	

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATADA:

REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA,

CONTRATANTE: ~~PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS-MG~~

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS

DO VALOR: R\$ 4.966.850, 00


DO PRAZO: ~~O prazo do presente contrato é de 6~~ meses, sendo: 5 meses em 2025 e 1 mes em 2026, podendo ser prorrogado

DOS RECURSOS: FICHA 64/2025



REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

1ª MEDIÇÃO



PROPONENTE: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
ENDEREÇO: TV. Dinah Aparecida Fronteira Theodoro, nº 40, PQ Gabriel, Hortolândia-SP
CEP: 13186-616 CIDADE: HORTOLANDIA - SP ESTADO: SÃO PAULO
TELEFONE: 19 - 98730-7976 FAX: E-MAIL: REPLANLOCAÇÕES@OUTLOOK.COM
CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Ref.: Contrato nº 081/2025

Ref.: Dispensa Emergencial

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS									
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTARIA									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNIT. C/BDI	TOTAL C/BDI	QTDE EXE PERIODO	VALOR PERIODO	SALDO DE CONTRATO	
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1	RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	m³	45000,00	R\$ 50,60	R\$ 2.277.000,00	2700,00	R\$ 136.620,00	R\$ 2.140.380,00	
2	RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS E CORTE	m³	5000,00	R\$ 64,40	R\$ 322.000,00	1600,00	R\$ 103.040,00	R\$ 218.960,00	
3	LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE CANALETAS, BUEIROS, ESCADAS D'ÁGUA, CAIXAS E ALAS) COM ÊNFASE NA DRENAGEM E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES)	m²	40000,00	R\$ 18,40	R\$ 736.000,00	300,00	R\$ 5.520,00	R\$ 730.480,00	
4	ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE CONCRETO	uni.	50,00	R\$ 4.255,00	R\$ 212.750,00	0,00	R\$ -	R\$ 212.750,00	
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	uni.	100,00	R\$ 299,00	R\$ 29.900,00	0,00	R\$ -	R\$ 29.900,00	
6	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	2000,00	R\$ 46,00	R\$ 92.000,00	150,00	R\$ 2.300,00	R\$ 89.700,00	
7	DESOBSTRUÇÃO DE VIAS	m³	300,00	R\$ 345,00	R\$ 103.500,00	100,00	R\$ 34.500,00	R\$ 69.000,00	
8	TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	m³	1000,00	R\$ 80,50	R\$ 80.500,00	150,00	R\$ 12.075,00	R\$ 68.425,00	

9	LIMPEZA E REPAROS SIMPLES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	m	200,00	R\$ 494,50	R\$ 98.900,00	70,00	R\$ 34.615,00	R\$ 64.285,00
10	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA ARTICULADA	m ²	40000,00	R\$ 1,15	R\$ 46.000,00	15000,00	R\$ 17.250,00	R\$ 28.750,00
11	IMPLEMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE BOLSÕES D'ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS	m ³	15000,00	R\$ 59,80	R\$ 897.000,00	1200,00	R\$ 71.760,00	R\$ 825.240,00
12	PODA	m ³	1200,00	R\$ 57,50	R\$ 69.000,00	300,00	R\$ 17.250,00	R\$ 51.750,00
13	REGULARIZAÇÃO DE BASE	m ²	1000,00	R\$ 2,30	R\$ 2.300,00	1000,00	R\$ 2.300,00	R\$ -
SUBTOTAL ITEM 6:					R\$ 4.966.850,00		R\$ 437.230,00	R\$ 4.529.620,00
					CONTRATADO		MED. PERÍODO	SALDO CONTRATO
					R\$ 4.966.850,00		R\$ 437.230,00	R\$ 4.529.620,00
SUBTOTAL					R\$ 4.966.850,00		R\$ 437.230,00	R\$ 4.529.620,00
TOTAL GERAL:					R\$ 4.966.850,00		R\$ 437.230,00	R\$ 4.529.620,00

Alfenas-MG, 03 de setembro de 2025.

PROPONENTE: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

PAG.01/01

01/09/2025

PROponente: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

ENDEREÇO: TV. Dinah Aparecida Fronteira Theodoro, nº 40, PQ Gabriel, Hortolândia-SP
 CEP: 13186-616 CIDADE: HORTOLÂNDIA - SP ESTADO: SÃO PAULO
 TELEFONE: 19 - 98730-7976 FAX: E-MAIL: REPLANLOCAÇÕES@OUTLOOK.COM

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Ref.: Contrato nº 081/2025

Ref.: Dispensa Emergencial

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO	MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO
1	Serviços Preliminares					
1	RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	M3	45.000,00	2.700,00	-	42.300,00
			H	Comprimento	Largura	M3
				0,15 X	3.000,00 X	6,00 =
					Total	= 2.700,00
2	RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS E CORTE	M3	5.000,00	1.600,00	-	3.400,00
			H	Comprimento	Largura	Quant. M3
				0,20 X	8.000,00 X	1,00 =
					Total	= 1.600,00
3	LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE CANALETAS, BUEIROS,	M2	40.000,00	-	-	40.000,00
			H	Comprimento	Largura	Quant.
				- X	50,00 X	6,00 =
					Total	= 300,00
4	ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE CONCRETO	UNI	50,00	-	-	50,00
			H	Comprimento	Largura	Quant.
				- X	- X	- =
					Total	= -
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	UNI	100,00	-	-	100,00
			H	Comprimento	Largura	Quant.
				- X	- X	- =
					Total	= -
6	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2.000,00	50,00	-	1.950,00
				Comprimento	Largura	Quant.
				- X	50,00 X	1,00 =
					Total	= 50,00
7	DESOBSTRUÇÃO DE VIAS	M3	300,00	-	-	300,00
			H	Comprimento	Largura	Volume (m³)
				0,30 X	50,00 X	2,00 =
					Total	= 100,00
8	TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	M3	1.000,00	-	-	1.000,00
			H	Comprimento	Largura	m³xkm
				0,20 X	100,00 X	1,50 =
					Total	= 150,00
9	LIMPEZA E REPAROS SIMPLES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	M	200,00	-	-	200,00
				Comprimento	Largura	Quant.
				- X	70,00 X	1,00 =
					Total	= 70,00
10	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA ARTICULADA	M2	40.000,00	-	-	40.000,00
			H	Comprimento	Largura	Quant.
				- X	7.500,00 X	2,00 =
					Total	= 15.000,00
11	IMPLEMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE BOLSÕES D'ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS	M3	15.000,00	-	-	15.000,00
			H	Comprimento	Largura	Quant.
				2,00 X	200,00 X	3,00 =
					Total	= 1.200,00
12	PODA	M3	1.200,00	-	-	1.200,00
			H	Comprimento	Largura	Quant.
				1,00 X	100,00 X	3,00 =
					Total	= 300,00
13	REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	1.000,00	-	-	1.000,00
				Comprimento	Largura	Quant.
				- X	1.000,00 X	1,00 =
					Total	= 1.000,00
					Quantidade	Total (UN)
						=
			VALOR	MEDIÇÃO	Total	= 437.230,00

Alfenas-MG, 03 de setembro de 2025.

PROponente: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

PAG.01/04 01/09/2025

CONTRATO	OBJETO	GESTOR DO CONTRATO	RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA
081/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.	DECIO PAULINO DA COSTA	RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PRAZO DIAS	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL	DATAS LINHA DE BASE REPLANEJADA	DATAS CRONOGRAMA CORRENTE
180	INÍCIO TÉRMINO 23/07/2025 23/01/2026	INÍCIO TÉRMINO -----	INÍCIO TÉRMINO 23/07/2025 30/12/2025
			PERÍODO DE ANÁLISE 23/07/2025 01/09/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - REGULARIZAÇÃO DE BASE




LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - REGULARIZAÇÃO DE BASE




LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - REGULARIZAÇÃO DE BASE




LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - REGULARIZAÇÃO DE BASE

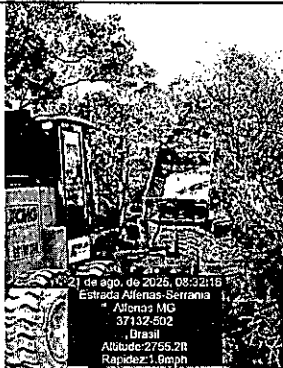


LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - RECOMPOSIÇÃO DE CASCALHO



LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - RECOMPOSIÇÃO DE CASCALHO

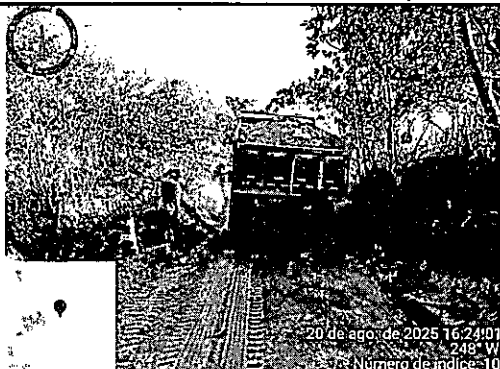

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - REGULARIZAÇÃO DE BASE

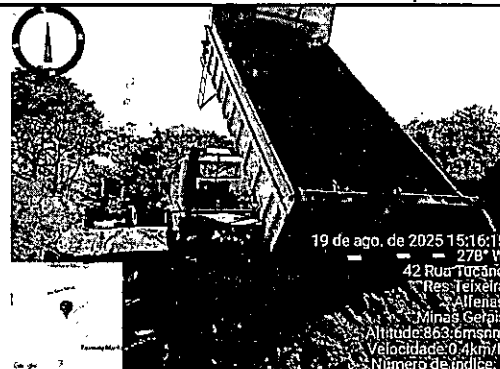

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - REGULARIZAÇÃO DE BASE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

PAG.02/04


01/09/2025

CONTRATO	OBJETO	GESTOR DO CONTRATO	RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA
081/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.	DECIO PAULINO DA COSTA	RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PRAZO DIAS	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL		PERÍODO DE ANÁLISE
180	INÍCIO	TERMINO	
	23/07/2025	23/01/2026	23/07/2025
	DATAS LINHA DE BASE REPLANEJADA		
	INÍCIO	TERMINO	
			01/09/2025
	DATAS CRONOGRAMA CORRENTE		
	INÍCIO	TERMINO	
	23/07/2025	30/12/2025	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME

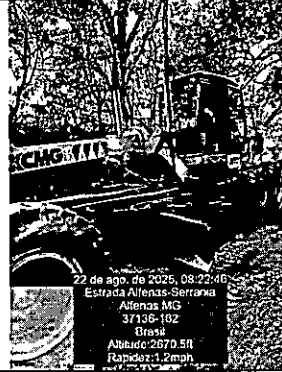


LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME



LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME

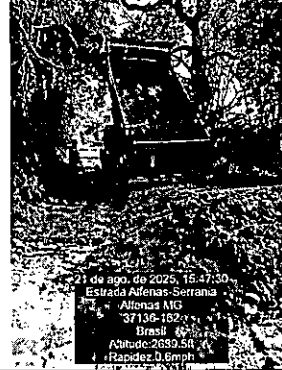


LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME

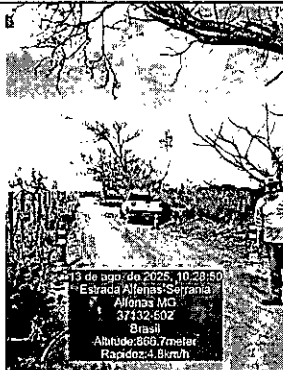

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME



LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME

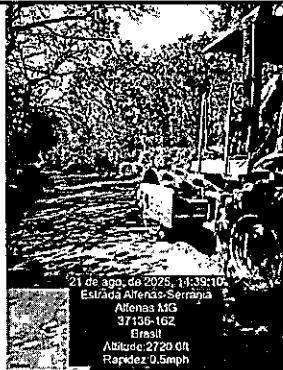

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME



LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

PAG.03/04 01/09/2025

CONTRATO 081/2025	OBJETO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.	GESTOR DO CONTRATO DECIO PAULINO DA COSTA	RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PRAZO DIAS 180	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 23/01/2026	DATAS LINHA DE BASE REPLANEJADA INÍCIO: _____ TÉRMINO: _____	DATAS CRONOGRAMA CORRENTE INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 30/12/2025
		PERÍODO DE ANÁLISE 23/07/2025 01/09/2025	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




22 de ago. de 2025, 08:22:35
Estrada Allenas-Serrania
Alenas MG
37136-162
Brasil
Altitude: 2869.91m
Rapidez: 0.1km/h

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME




12 de ago. de 2025, 15:44:06
Estrada Allenas-Serrania
Alenas MG
37132-502
Brasil
Altitude: 867.3meter
Rapidez: 3.0km/h

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - ROÇADA

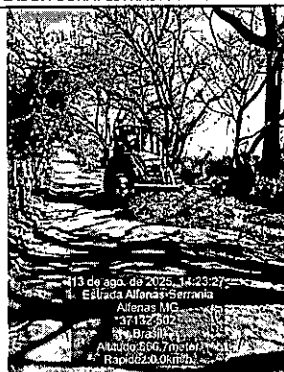

13 de ago. de 2025, 14:23:27
Estrada Allenas-Serrania
Alenas MG
37132-502
Brasil
Altitude: 867.7meter
Rapidez: 0.0km/h

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - LIMPEZA MECANIZADA

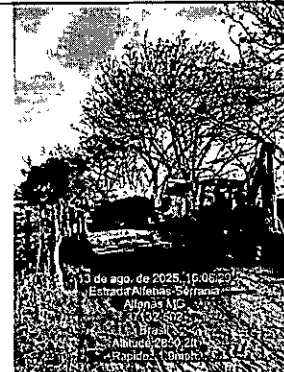


13 de ago. de 2025, 15:00:27
Estrada Allenas-Serrania
Alenas MG

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - LIMPEZA MECANIZADA




14 de ago. de 2025, 09:22:05
Estrada Allenas-Serrania
Alenas MG
37132-502
Brasil
Altitude: 867.7meter
Rapidez: 0.1km/h

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - LIMPEZA MECANIZADA

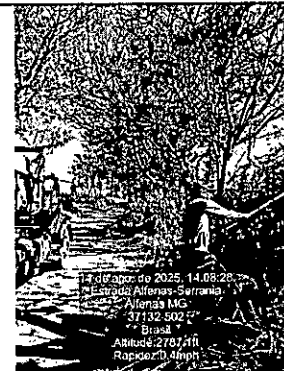

14 de ago. de 2025, 14:08:28
Estrada Allenas-Serrania
Alenas MG
37132-502
Brasil
Altitude: 878.71m
Rapidez: 0.4km/h

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - LIMPEZA MECANIZADA

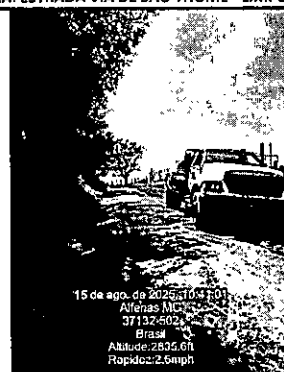

15 de ago. de 2025, 10:43:01
Alenas MG
37132-502
Brasil
Altitude: 2835.61m
Rapidez: 2.6km/h

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME



15 de ago. de 2025, 09:16:06
Alenas MG
37132-502
Brasil
Rapidez: 3.9km/h

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - LIMPEZA E COMPACTAÇÃO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS


PAG.04/04 01/09/2025

CONTRATO	OBJETO	GESTOR DO CONTRATO	RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA
081/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.	DECIO PAULINO DA COSTA	RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PRAZO DIAS	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL	DATAS LINHA DE BASE REPLANEJADA	DATAS CRONOGRAMA CORRENTE
180	INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 23/01/2026	INÍCIO: _____ TÉRMINO: _____	INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 30/12/2025
			PERÍODO DE ANÁLISE: 23/07/2025 01/09/2025


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - Limpeza de Bolções

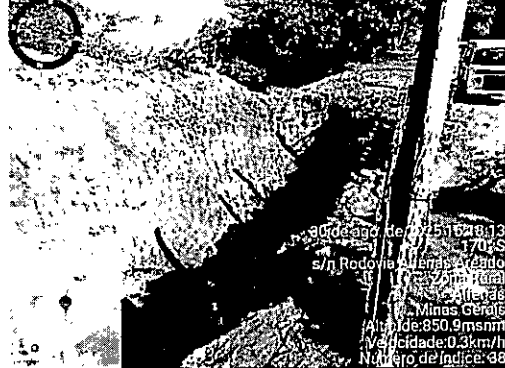


LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - Limpeza de Bolções

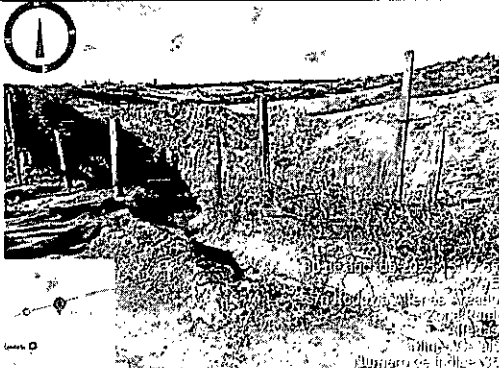


LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - Limpeza de Bolções




LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - Limpeza de Bolções

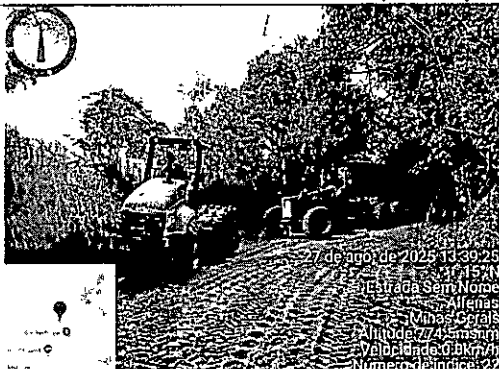

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - CONSTRUÇÃO CAMADA DE CASCALHO

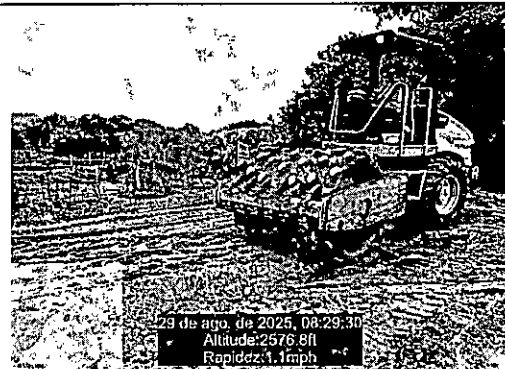

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - CONSTRUÇÃO CAMADA DE CASCALHO

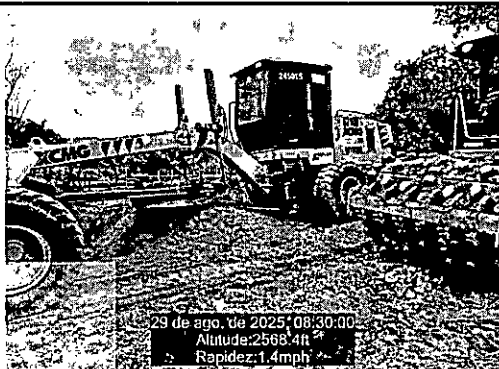

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - CONSTRUÇÃO CAMADA DE CASCALHO



LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - CONSTRUÇÃO CAMADA DE CASCALHO



REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

2ª MEDIÇÃO



PROPONENTE: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
ENDEREÇO: TV. Dinah Aparecida Fronteira Theodoro, nº 40, PQ Gabriel, Hortolândia-SP
CEP: 13186-616 CIDADE: HORTOLÂNDIA - SP ESTADO: SÃO PAULO
TELEFONE: 19 - 98730-7976 FAX: E-MAIL: REPLANLOCAÇÕES@OUTLOOK.COM
CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
Ref.: Contrato nº 081/2025
Ref.: Dispensa Emergencial

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS												
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTARIA												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. C/BDI	VALOR DE CONTRATO	QTDE. EXE. PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO	SALDO QTDE.	SALDO DE CONTRATO	PORC.
1	RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	m³	45.000,00	R\$ 50,60	R\$ 2.277.000,00	1.991,70	R\$ 100.780,02	4.010,40	R\$ 202.926,24	40.989,60	R\$ 2.074.073,76	9%
2	RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS E CORTE	m³	5.000,00	R\$ 64,40	R\$ 322.000,00	596,40	R\$ 38.408,16	2.096,40	R\$ 135.008,16	2.903,60	R\$ 186.991,84	42%
3	LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE CANALETAS, BUEIROS, ESCADAS D'ÁGUA, CAIXAS E ALAS) COM ÊNFASE NA DRENAGEM E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES)	m²	40.000,00	R\$ 18,40	R\$ 736.000,00		R\$ -	-	R\$ -	40.000,00	R\$ 736.000,00	0%
4	ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE CONCRETO	unf.	50,00	R\$ 4.255,00	R\$ 212.750,00		R\$ -	-	R\$ -	50,00	R\$ 212.750,00	0%
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	unf.	100,00	R\$ 299,00	R\$ 29.900,00		R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 29.900,00	0%
6	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250.	m	2.000,00	R\$ 46,00	R\$ 92.000,00		R\$ -	-	R\$ -	2.000,00	R\$ 92.000,00	0%
7	DESOBSTRUÇÃO DE VIAS	m³	300,00	R\$ 345,00	R\$ 103.500,00	200,00	R\$ 69.000,00	300,00	R\$ 103.500,00	-	R\$ -	100%
8	TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	m²	1.000,00	R\$ 80,50	R\$ 80.500,00		R\$ -	150,00	R\$ 12.075,00	850,00	R\$ 68.425,00	15%
9	LIMPEZA E REPAROS SIMPLES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	m	200,00	R\$ 494,50	R\$ 98.900,00		R\$ -	-	R\$ -	200,00	R\$ 98.900,00	0%
10	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA ARTICULADA	m²	40.000,00	R\$ 1,15	R\$ 46.000,00		R\$ -	12.000,00	R\$ 13.800,00	28.000,00	R\$ 32.200,00	30%
11	IMPLEMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE BOLSÕES D'ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS	m³	15.000,00	R\$ 59,80	R\$ 897.000,00	168,35	R\$ 10.067,45	965,80	R\$ 57.754,96	14.034,20	R\$ 839.245,04	6%
12	PODA	m³	1.200,00	R\$ 57,50	R\$ 69.000,00	472,50	R\$ 27.168,75	562,50	R\$ 32.343,75	637,50	R\$ 36.656,25	47%
13	REGULARIZAÇÃO DE BASE	m³	1.000,00	R\$ 2,30	R\$ 2.300,00		R\$ -	1.000,00	R\$ 2.300,00	-	R\$ -	100%
SUBTOTAL ITEM 6:					R\$ 4.966.850,00		R\$ 245.424,38				R\$ 4.407.141,89	
					CONTRATADO		MED. PERÍODO		ACUMULADO		SALD CONTRATO	
					R\$ 4.966.850,00		R\$ 245.424,38				R\$ 4.407.141,89	
SUBTOTAL					R\$ 4.966.850,00		R\$ 245.424,38		R\$ 559.708,11		R\$ 4.407.141,89	
TOTAL GERAL:					R\$ 4.966.850,00		R\$ 245.424,38		R\$ 559.708,11		R\$ 4.407.141,89	11%

Alfenas-MG, 17 de setembro de 2025.

ANDREA ARAUJO CARVALHO DIAS
FISCAL DE CONTRATO

PROPONENTE: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF: 53.778.325/0001-68

DECIO PAULINO DA COSTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

PAG.01/01

01/09/2025

PROponente: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
 ENDEREÇO: TV. Dinah Aparecida Fronteira Theodoro, nº 40, PQ Gabriel, Hortolândia-SP
 CEP: 13186-616 CIDADE: HORTOLÂNDIA - SP ESTADO: SÃO PAULO
 TELEFONE: 19 - 98730-7976 FAX: E-MAIL: REPLANLOCAÇÕES@OUTLOOK.COM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Ref.: Contrato nº 081/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO	MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO
1	Serviços Preliminares					
1	RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	M3	45.000,00			
	Comprimento	H	Largura	M3		
	18,00	0,15	6,00	16,20		
				H	Comprimento	Largura
				0,15	X	630,00
						X
						7,00
						=
						1.975,50
						Total
						=
						1.991,70
2	RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS E CORTE	M3	5.000,00			
				H	Comprimento	Largura
				0,30	X	284,00
						X
						7,00
						=
						596,40
						Total
						=
						596,40
3	LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE CANALETAS, BUEIROS,	M2	40.000,00			
				H	Comprimento	Largura
					X	X
						Total
						=
4	ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE CONCRETO	UNI	50,00			
				H	Comprimento	Largura
					X	X
						Total
						=
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	UNI	100,00			
				H	Comprimento	Largura
					X	X
						Total
						=
6	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA POLIÇA; DIAMETRO 11 CM; ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M.	M	2.000,00			
					Comprimento	Largura
					X	X
						Total
						=
7	DESOBSTRUÇÃO DE VIAS	M3	300,00			
				H	Comprimento	Largura
				0,33	X	600,00
						X
						1,00
						=
						200,00
						Total
						=
						200,00
8	TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	M3	1.000,00			
				H	Comprimento	Largura
				0,20	X	X
						1,50
						=
9	LIMPEZA E REPAROS SIMPLES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	M	200,00			
					Comprimento	Largura
					X	X
						1,00
						=
10	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA ARTICULADA	M2	40.000,00			
				H	Comprimento	Largura
					X	X
						1,50
						=
11	IMPLEMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE BOLSÕES D'ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS	M3	15.000,00			
				H	Comprimento	Largura
				3,55	X	67,60
						X
						1,50
						=
						168,35
						Total
						=
						168,35
12	PODA	M3	1.200,00			
				H	Comprimento	Largura
				1,50	X	830,00
						X
						0,50
						=
						472,50
						Total
						=
						472,50
13	REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	1.000,00			
					Comprimento	Largura
					X	X
						7,00
						=
						Total
						=
						Quantidade
						Total (UN)
						=
						VALOR
						MEDIÇÃO
						Total
						=
						245.424,38

Alfenas-MG, 17 de setembro de 2025.

PROponente: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
 CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

ANDREA ARAUJO CARVALHO DIAS
 FISCAL DE CONTRATO



DECIO PAULINO DA COSTA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

PAG.04/07 15/09/2025


CONTRATO:	OBJETO:	GESTOR DO CONTRATO:	RESPONSÁVEL DA OBRA - CUIR/ARTADM:
081/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.	DECIO PAULINO DA COSTA	RICARDO EL TRE SILVA GERALDO
PRAZO DIAS:	DATA: LINHA DE BASE: URBANA:	DATA: LINHA DE BASE: RETILANEJADA:	DATA: LINHA DE BASE: PROGRAMA CORRETIVA:
180	INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 23/01/2026	INÍCIO: _____ TÉRMINO: _____	INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 30/12/2025
	PERÍODO DE ANÁLISE:		
	01/09/2025		15/09/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

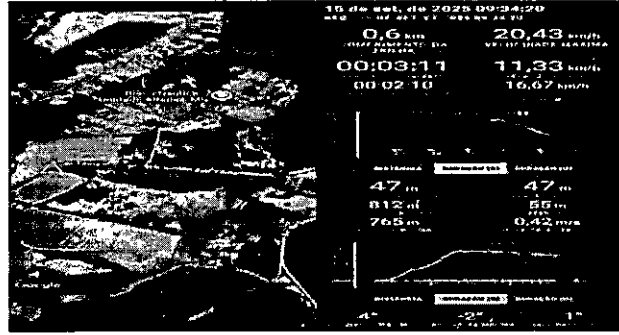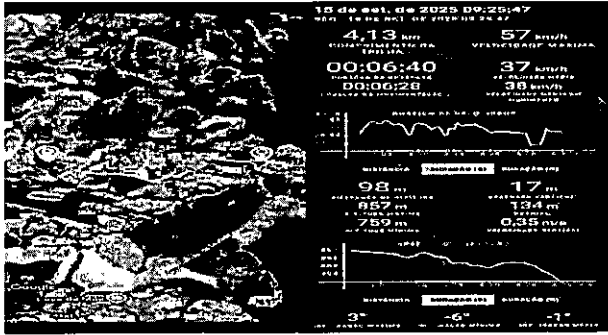


LOCAL OBRA: ROD. OTTONI FERREIRA BARBOSA - ALFENAS A FAMA

LOCAL OBRA: ROD. OTTONI FERREIRA BARBOSA - ALFENAS A FAMA

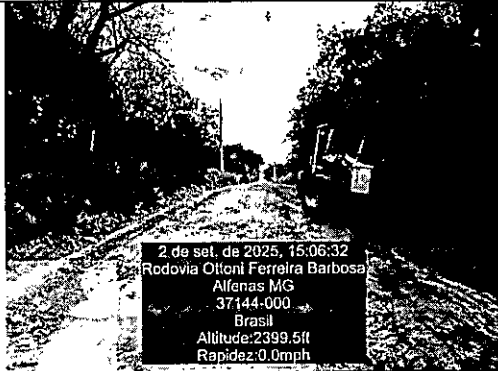

02/09/2025 - LOCAL: ROD. OTTONI FERREIRA BARBOSA - ALFENAS A FAMA - Regularização de Base

02/09/2025 - LOCAL: ROD. OTTONI FERREIRA BARBOSA - ALFENAS A FAMA - Regularização de Base

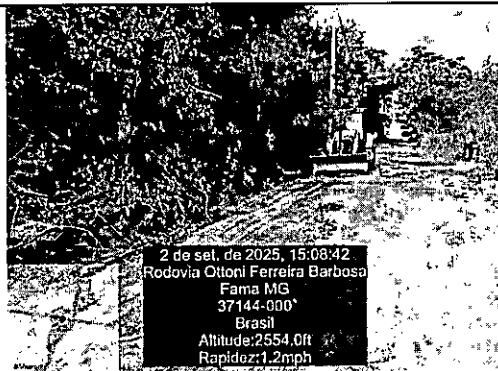

02/09/2025 - LOCAL: ROD. OTTONI FERREIRA BARBOSA - ALFENAS A FAMA - Regularização de Base

02/09/2025 - LOCAL: ROD. OTTONI FERREIRA BARBOSA - ALFENAS A FAMA - Regularização de Base



03/09/2025 - LOCAL: ROD. OTTONI FERREIRA BARBOSA - ALFENAS A FAMA - Regularização de Base








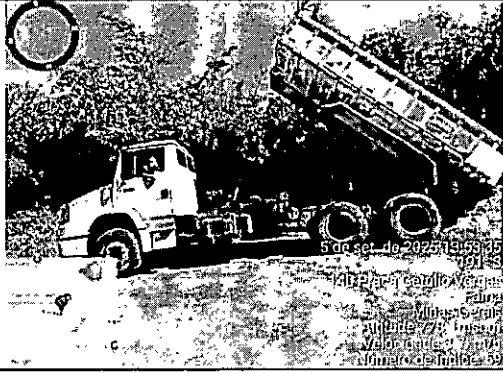
03/09/2025 - LOCAL: ROD. OTTONI FERREIRA BARBOSA - ALFENAS A FAMA - Desobstrução de Vias

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

PAG. 05/07 15/09/2025

CONTRATO	OBJETO	GESTOR DO CONTRATO	RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA
081/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.	DECIO PAULINO DA COSTA	RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PRazo DIAS	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL	DATAS LINHA DE BASE REPLANEJADA	DATAS CRONOGRAMA CORRENTE
180	INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 23/01/2026	INÍCIO: _____ TÉRMINO: _____	INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 30/12/2025
			PERÍODO DE ANÁLISE
			01/09/2025 15/09/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

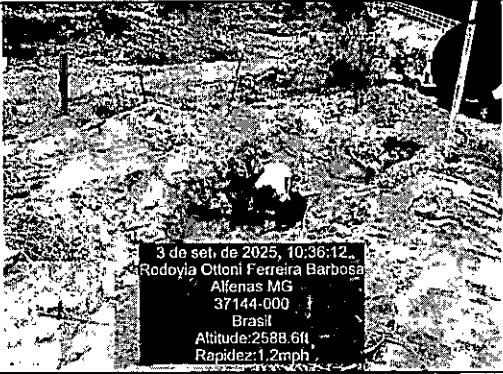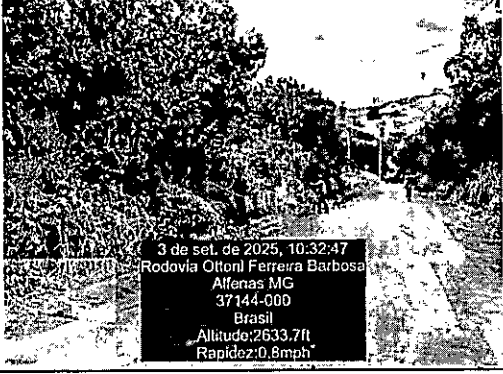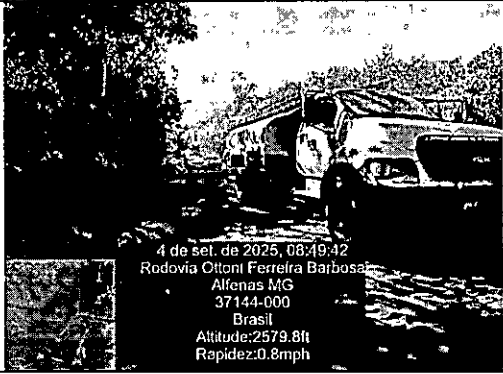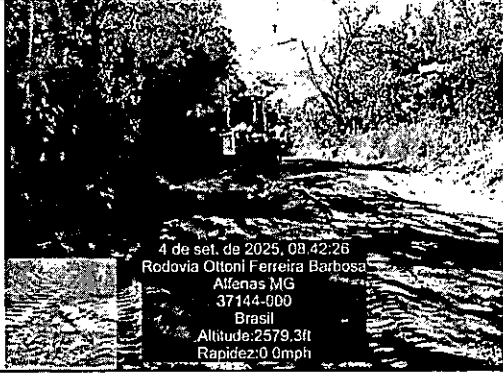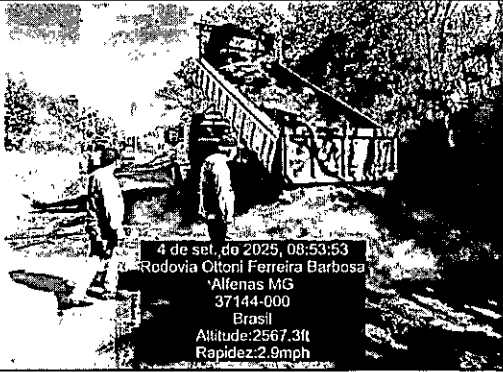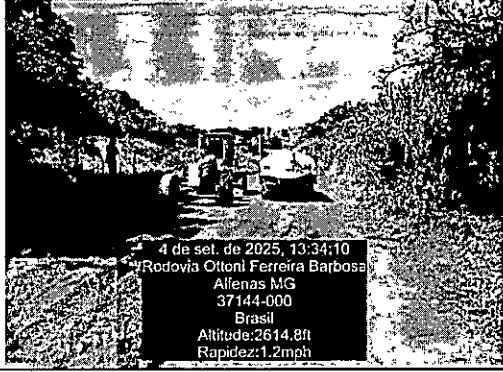
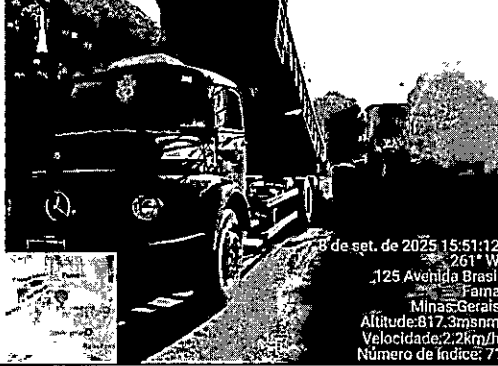

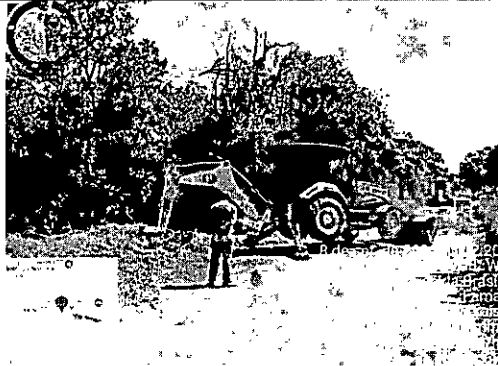
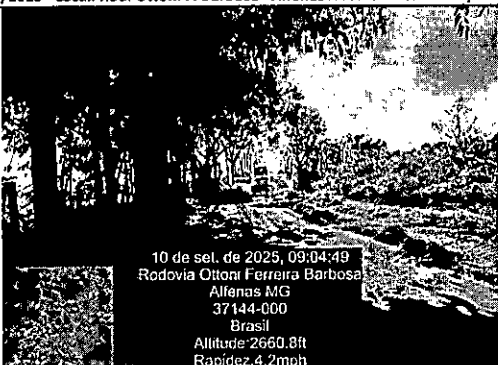
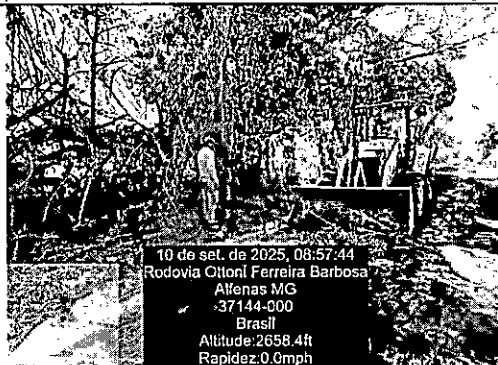
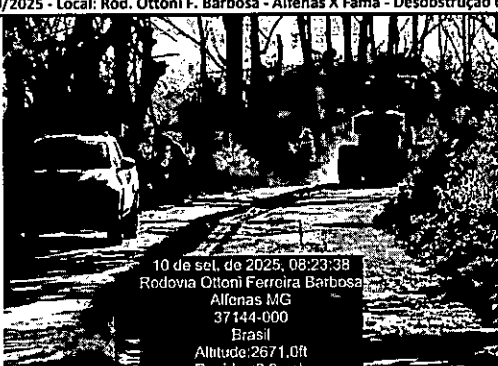

 <p style="text-align: center;">3 de set. de 2025, 10:36:12 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2588.6ft Rapidez: 1.2mph</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">03/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Desobstrução de vias</p>	 <p style="text-align: center;">3 de set. de 2025, 10:32:47 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2633.7ft Rapidez: 0.8mph</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">03/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Poda</p>
 <p style="text-align: center;">4 de set. de 2025, 08:49:42 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2579.8ft Rapidez: 0.8mph</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">04/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Desobstrução de vias</p>	 <p style="text-align: center;">4 de set. de 2025, 08:42:26 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2579.3ft Rapidez: 0.0mph</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">04/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Desobstrução de vias</p>
 <p style="text-align: center;">4 de set. de 2025, 08:53:53 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2567.3ft Rapidez: 2.9mph</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">04/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Recomposição de aterro</p>	 <p style="text-align: center;">4 de set. de 2025, 13:34:10 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2614.8ft Rapidez: 1.2mph</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">04/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Recomposição de aterro</p>
 <p style="text-align: center;">4 de set. de 2025, 07:29:56 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2572.0ft Velocidade: 1.3km/h Número de índice: 51</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">04/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Recomposição de aterro</p>	 <p style="text-align: center;">4 de set. de 2025, 15:59:55 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2572.0ft Velocidade: 1.3km/h Número de índice: 52</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">04/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Recomposição de cascalho</p>

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

PAG.06/07 15/09/2025

CONTRATO	OBJETO	GESTOR DO CONTRATO	RESPONSÁVEL DA OBRA / CONTRATADA
081/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.	DECIO PAULINO DA COSTA	RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PRAZO DIAS	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL	DATAS LINHA DE BASE REPLANADA	DATAS CROQUIGRAMA CORRENTE
180	INICIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 23/01/2026	INICIO: _____ TÉRMINO: _____	INICIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 30/12/2025
			PERÍODO DE ANÁLISE
			01/09/2025 15/09/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


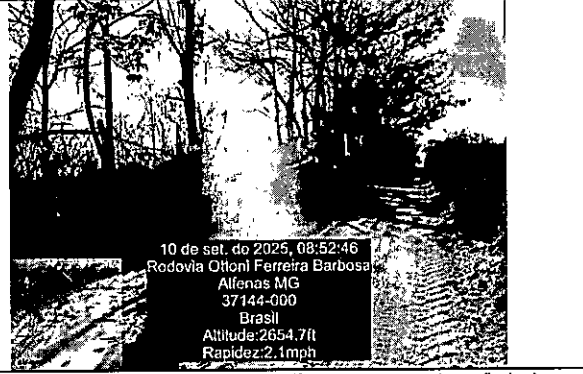
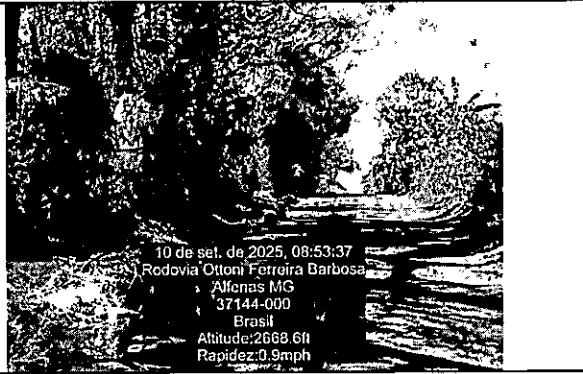





 <p style="font-size: small; text-align: center;">10 de set. de 2025 11:30:17 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2649.7ft Rapidez: 0.9km/h Número de Índice: 71</p>	 <p style="font-size: small; text-align: center;">8 de set. de 2025 15:51:12 -261° W -125 Avenida Brasil Fama Minas Gerais Altitude: 817.3msnm Velocidade: 2.2km/h Número de Índice: 71</p>
08/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Recomposição de aterro	08/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Recomposição de aterro
 <p style="font-size: small; text-align: center;">10 de set. de 2025, 09:06:32 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2649.7ft Rapidez: 3.3mph</p>	 <p style="font-size: small; text-align: center;">8 de set. de 2025 11:20:55 -261° W -125 Avenida Brasil Fama Minas Gerais Altitude: 817.3msnm Velocidade: 2.2km/h Número de Índice: 71</p>
10/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Desobstrução de vias	08/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Desobstrução de vias
 <p style="font-size: small; text-align: center;">10 de set. de 2025, 09:04:49 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2660.8ft Rapidez: 4.2mph</p>	 <p style="font-size: small; text-align: center;">10 de set. de 2025, 08:57:44 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2658.4ft Rapidez: 0.0mph</p>
08/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Desobstrução de vias	08/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Desobstrução de vias
 <p style="font-size: small; text-align: center;">10 de set. de 2025, 08:23:38 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2671.0ft Rapidez: 2.9mph</p>	 <p style="font-size: small; text-align: center;">10 de set. de 2025, 08:12:06 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2458.0ft Rapidez: 3.4mph</p>
10/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Recomposição de aterro	10/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Recomposição de aterro

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

PAG. 01/07 15/09/2025

CONTRATO	OBJETO	SECTOR DO CONTRATO	RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA
081/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS.	DECIO PAULINO DA COSTA	RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
FAZENDA	DATAS LINHA DE BASE - ORIGINAL	DATAS LINHA DE BASE - REPLANETAJA	DATAS CRONOGRAMA CORRENTE
180	INÍCIO: 23/07/2025 TERMINO: 23/01/2026	INÍCIO: _____ TERMINO: _____	INÍCIO: 23/07/2025 TERMINO: 30/12/2025
		PERÍODO DE ANÁLISE: 01/09/2025 a 15/09/2025	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

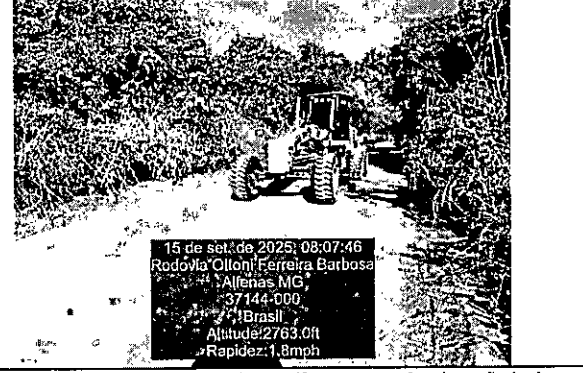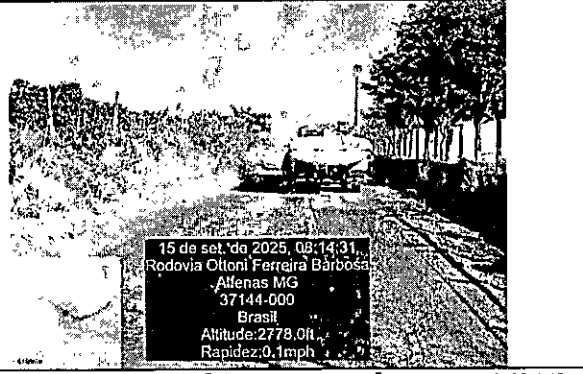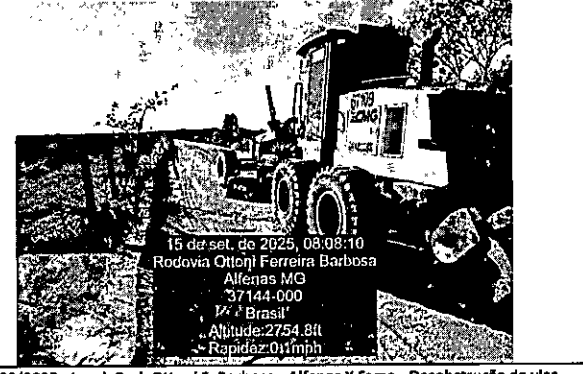 <p>10 de set. de 2025 14:43:05 295° NW 22 Estrada Vênas A Nova Fama Alfenas Minas Gerais Altitude: 838,9msnm Velocidade: 0,8km/h Número de índice: 88</p>	 <p>10 de set. de 2025, 08:52:46 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2654,7ft Rapidez: 2,1mph</p>
10/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Desobstrução de vias	10/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Desobstrução de vias
 <p>10 de set. de 2025, 08:53:37 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2668,6ft Rapidez: 0,9mph</p>	 <p>10 de set. de 2025 09:26:42 63° E Avenida Maria do Carmo Paraguáçu Minas Gerais Altitude: 329,8msnm Velocidade: 2,0km/h Número de índice: 104</p>
10/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Poda	12/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Desobstrução de vias
 <p>12 de set. de 2025 09:59:26 318° NW Estrada Fama Alfenas Minas Gerais Altitude: 793,6msnm Velocidade: 0,3km/h Número de índice: 105</p>	 <p>15 de set. de 2025, 08:07:46 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2763,0ft Rapidez: 1,8mph</p>
12/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Desobstrução de vias	15/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Desobstrução de vias
 <p>15 de set. de 2025, 08:14:31 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2778,0ft Rapidez: 0,1mph</p>	 <p>15 de set. de 2025, 08:08:10 Rodovia Ottoni Ferreira Barbosa Alfenas MG 37144-000 Brasil Altitude: 2754,8ft Rapidez: 0,1mph</p>
LOCAL DA OBRA: ESTRADA VIA DE SÃO THOME - CONSTRUÇÃO CAMADA DE CASCALHO	15/09/2025 - Local: Rod. Ottoni F. Barbosa - Alfenas X Fama - Desobstrução de vias



REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

3ª MEDIÇÃO



PROponente: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
 ENDEREÇO: TV. Dinah Aparecida Fronteira Theodoro, nº 40, PQ Gabriel, Hortolândia-SP
 CEP: 13186-616 CIDADE: HORTOLÂNDIA - SP ESTADO: SÃO PAULO
 TELEFONE: 19 - 98730-7976 FAX: E-MAIL: REPLANLOCAÇÕES@OUTLOOK.COM
 CNP/MF: 53.778.325/0001-66

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
 Ref.: Contrato nº 081/2025
 Ref.: Dispensa Emergencial

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DAS BRUCAS (ALFENAS-MG)
 ORDEM DE SERVIÇO Nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS												
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTARIA												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. C/ BDI	VALOR DE CONTRATO	QTDE. EXE PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO	SALDO QTDE.	SALDO DE CONTRATO	PORC.
1	RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	m²	45.000,00	R\$ 50,60	R\$ 2.277.000,00	2.097,00	R\$ 106.108,20	6.107,40	R\$ 309.034,44	38.892,60	R\$ 1.967.965,56	14%
2	RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS E CORTE	m²	5.000,00	R\$ 64,40	R\$ 322.000,00	336,00	R\$ 21.638,40	2.432,40	R\$ 156.646,56	2.567,60	R\$ 165.353,44	49%
3	LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE CANALETAS, BUEIROS, ESCADAS D'ÁGUA, CAIXAS E ALAS) COM ÊNFASE NA DRENAGEM E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES)	m²	19.993,75	R\$ 18,40	R\$ 367.885,00		R\$ -	-	R\$ -	19.993,75	R\$ 367.885,00	0%
4	ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE CONCRETO	unl.	10,00	R\$ 4.255,00	R\$ 42.550,00		R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 42.550,00	0%
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	unl.	10,00	R\$ 299,00	R\$ 2.990,00		R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 2.990,00	0%
6	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250.	m	2.000,00	R\$ 46,00	R\$ 92.000,00		R\$ -	-	R\$ -	2.000,00	R\$ 92.000,00	0%
7	DESOBSTRUÇÃO DE VIAS	m³	1.895,00	R\$ 345,00	R\$ 653.775,00		R\$ -	300,00	R\$ 103.500,00	1.595,00	R\$ 550.275,00	16%
8	TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	m³	1.000,00	R\$ 80,50	R\$ 80.500,00		R\$ -	150,00	R\$ 12.075,00	850,00	R\$ 68.425,00	15%
9	LIMPEZA E REPAROS SIMPLES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	m	200,00	R\$ 494,50	R\$ 98.900,00		R\$ -	-	R\$ -	200,00	R\$ 98.900,00	0%
10	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA ARTICULADA	m²	40.000,00	R\$ 1,15	R\$ 46.000,00		R\$ -	12.000,00	R\$ 13.800,00	28.000,00	R\$ 32.200,00	30%
11	IMPLEMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE BOLSÕES D'ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS	m²	3.750,00	R\$ 59,80	R\$ 224.250,00	931,92	R\$ 55.729,10	1.897,72	R\$ 113.483,94	1.852,28	R\$ 110.766,06	51%
12	PODA	m³	1.200,00	R\$ 57,50	R\$ 69.000,00		R\$ -	562,50	R\$ 32.343,75	637,50	R\$ 36.656,25	47%
13	REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	300.000,00	R\$ 2,30	R\$ 690.000,00	13.980,00	R\$ 32.154,00	14.980,00	R\$ 34.454,00	285.020,00	R\$ 655.546,00	5%
SUBTOTAL ITEM 6:					R\$ 4.966.850,00		R\$ 215.629,70				R\$ 4.191.512,31	
					CONTRATADO:		MED. PERÍODO		ACUMULADO		SALD CONTRATO	
					R\$ 4.966.850,00		R\$ 215.629,70				R\$ 4.191.512,31	
SUBTOTAL					R\$ 4.966.850,00		R\$ 215.629,70		R\$ 775.337,69		R\$ 4.191.512,31	
TOTAL GERAL:					R\$ 4.966.850,00		R\$ 215.629,70		R\$ 775.337,69		R\$ 4.191.512,31	16%
VALOR DA MEDIÇÃO NO PERÍODO: R\$ 215.629,70 (Duzentos e quinze mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta centavos)												

ANDREA ARAUJO CARVALHO DIAS
FISCAL DE CONTRATO

PROPONENTE: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

DECIO PAULINO DA COSTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

27/10/2025

PROponente: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: TV. Dinah Aparecida Fronteira Theodoro, nº 40, PQ Gabriel, Hortolândia-SP

CEP: 13186-616

Cidade: HORTOLÂNDIA - SP

Estado: SÃO PAULO

Telefone: 19 - 98730-7976 FAX:

E-MAIL: REPLANLOCAÇÕES@OUTLOOK.COM

A Prefeitura Municipal de Alfenas

Ref.: Contrato nº 081/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	CONTRATADO	MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO
1	Serviços Preliminares					
1	RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	M3	45.000,00			
			PAG. 04/07 0,15	Comprimento	Largura 6,00	M3 2.097,00
				X	=	
					Total	= 2.097,00
2	RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS E CORTE	M3	5.000,00			
			H	Comprimento	Largura	Quant. M3
			0,20	X	280,00	X
					6,00	=
					Total	= 336,00
						336,00
3	LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE, CANALETAS, BUEIROS	M2	19.993,75			
			H	Comprimento	Largura	Quant.
			-	X	-	X
					Total	= -
						-
4	ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE CONCRETO	UNI	10,00			
			H	Comprimento	Largura	Quant.
			-	X	-	X
					Total	= -
						-
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	UNI	10,00			
			H	Comprimento	Largura	Quant.
			-	X	-	X
					Total	= -
						-
6	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M	M	2.000,00			
				Comprimento	Largura	Quant.
			-	X	-	X
					Total	= -
						-
7	DESOBSTRUÇÃO DE VIAS	M3	1.895,00			
			H	Comprimento	Largura	Quant.
			0,33	X	-	X
					1,00	=
					Total	= -
						-
8	TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	M3	1.000,00			
			H	Comprimento	Largura	Quant.
			0,20	X	-	X
					1,50	=
					Total	= -
						-
9	LIMPEZA E REPAROS SIMPLES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	M	200,00			
				Comprimento	Largura	Quant.
			-	X	-	X
					1,00	=
					Total	= -
						-
					1,50	=
					Total	= -
						-
11	IMPLEMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE BOLSÕES D'ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS	M3	3.750,00			
			H	Comprimento	Largura	Quant.
			190,72			
			102,00			
			TOTAL M3 BOLSÕES			
			166,44			
			146,69			
			776,60			
			EMPOLAMENTO	X	20%	X
					Total	= 931,92
						931,92
12	PODA	M3	1.200,00			
			H	Comprimento	Largura	Quant.
				X	-	X
					Total	= -
						-
13	REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	2.300.000,00			
				Comprimento	Largura	Quant.
				2.330,00	X	6,00
					Total	= 13.980,00
						13.980,00
					Quantidade	Total (UN)
			VALOR	MEDIÇÃO	Total	215.629,70

Alfenas-MG, 27 de outubro de 2025.


PROponente: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF: 63.778.325/0001-66ANDREA ARAUJO CARVALHO DIAS
FISCAL DE CONTRATODECIO PAULINO DA COSTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

27/10/2025

QUANTIDADE	OBJETO	GENTIA DO CONTRATO		FE-POSSIVEL DA FIRMA CONTRATADA				
081/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.	DECIO PAULINO DA COSTA		RICARDO ELTRE SILVA GERALDO				
PRAZO DIAS	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL		DATAS LINHA DE BASE REPLANEJADA		PERIODO DE ANALISE			
180	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO		
	23/07/2025	23/01/2026			23/07/2025	30/12/2025	15/09/2025	23/10/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

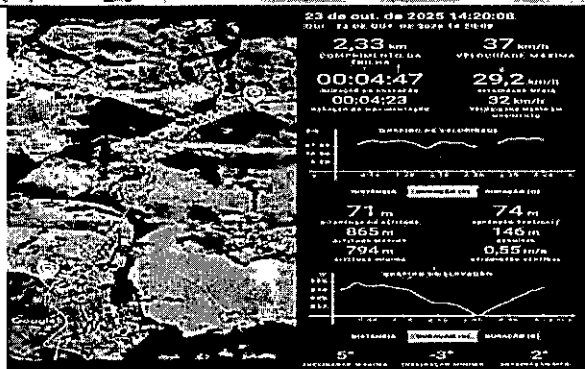


LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS




LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

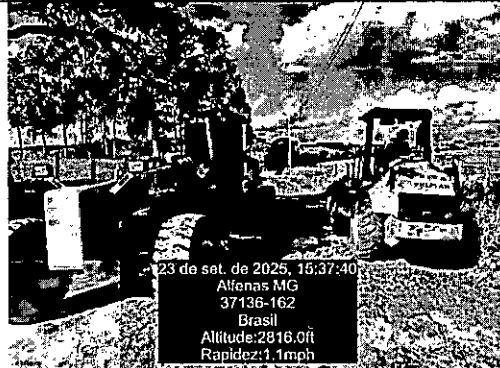

LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

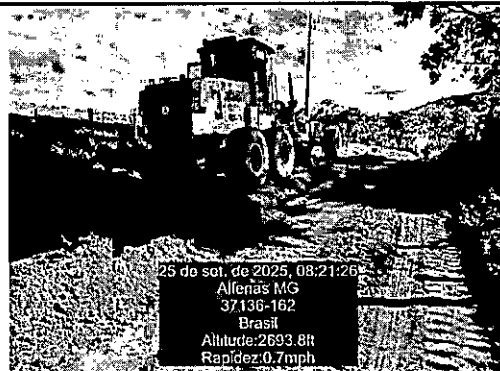

LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS





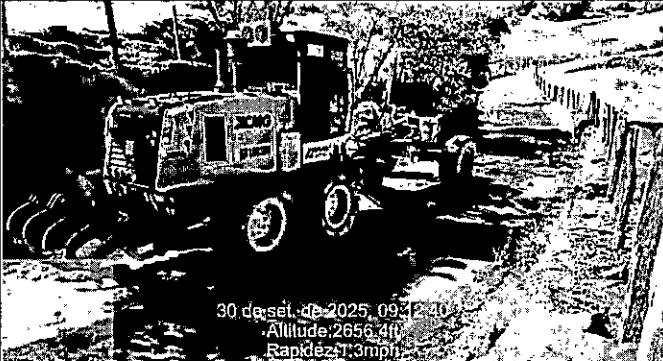
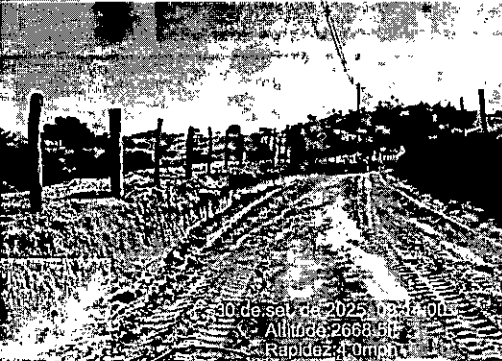


LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

27/10/2025

QUANTIFICO	OBJETO	GESTOR DO CONTRATO	RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA
081/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS.	DECIO PAULINO DA COSTA	RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PRAZO DAS	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL	DATAS LINHA DE BASE REPLANEJADA	DATAS CROQUIS/DORAMA CORRENTE
180	INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 23/01/2026	INÍCIO: _____ TÉRMINO: _____	PERÍODO DE ANÁLISE: 15/09/2025 a 23/10/2025

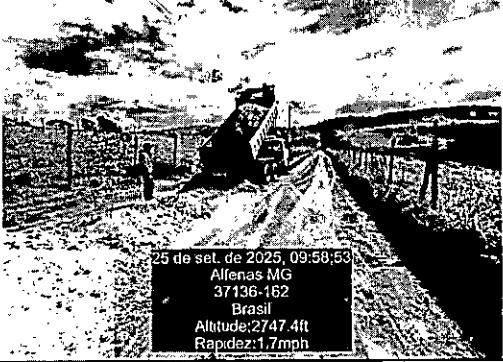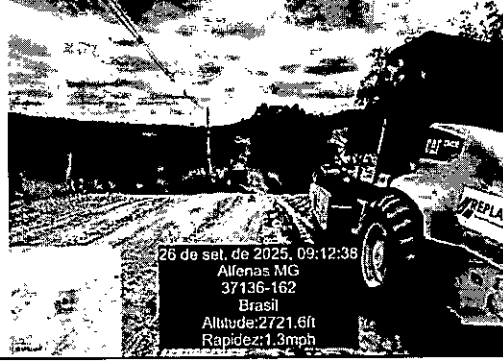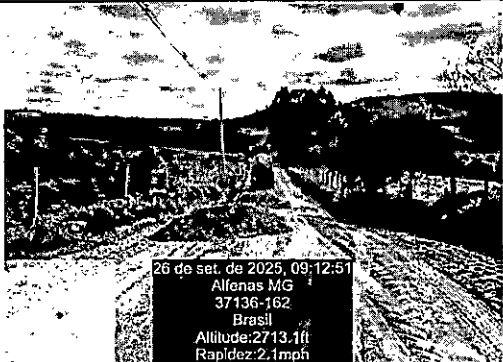RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


 <p>25 de set. de 2025, 09:58:53 Allenas MG 37136-162 Brasil Altitude: 2747,4ft Rapidez: 1,7mph</p> <p>LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS</p>	 <p>26 de set. de 2025, 09:12:38 Allenas MG 37136-162 Brasil Altitude: 2721,6ft Rapidez: 1,3mph</p> <p>LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS</p>
 <p>26 de set. de 2025, 09:12:51 Allenas MG 37136-162 Brasil Altitude: 2743,1ft Rapidez: 2,1mph</p> <p>LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS</p>	 <p>26 de set. de 2025, 09:37:03 Allenas MG 37136-162 Brasil Altitude: 2700,3ft Rapidez: 1,3mph</p> <p>LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS</p>
 <p>30 de set. de 2025, 09:42:40 Altitude: 2656,3ft Rapidez: 1,3mph</p> <p>LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS</p>	 <p>30 de set. de 2025, 09:44:00 Altitude: 2668,5ft Rapidez: 1,0mph</p> <p>LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS</p>
 <p>30 de set. de 2025, 13:59:00 Altitude: 2751,6ft Rapidez: 0,0mph</p> <p>LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS</p>	 <p>30 de set. de 2025, 13:58:36 Altitude: 2752,6ft Rapidez: 0,0mph</p> <p>LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS</p>

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS


27/10/2025

DATA: 08/1/2025	OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS.	GESTOR DO CONTRATO: DECIO PAULINO DA COSTA	RESPONSÁVEL TÉCNICO: RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PRAZO DIAS: 180	DATA: (LINHA DE BASE ORIGINAL) INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 23/01/2026	DATA: (LINHA DE BASE REPLANEJADA) INÍCIO: _____ TÉRMINO: _____	DATA: (PROGRAMA CRISPENTE) INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 30/12/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

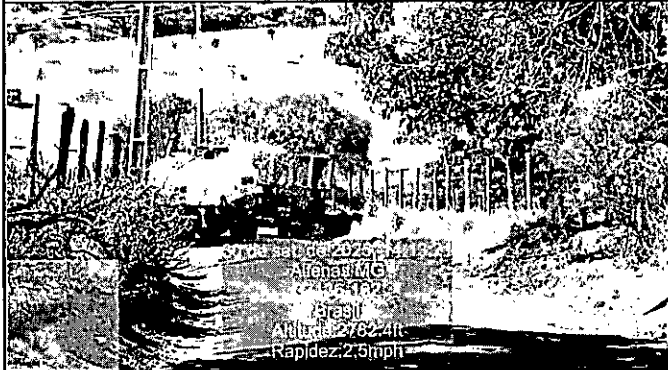


LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

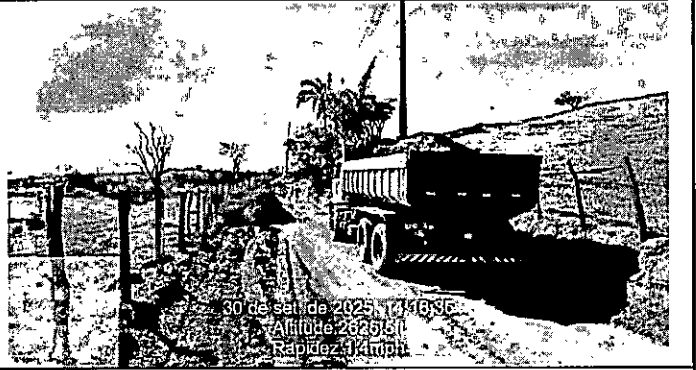

LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS



LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

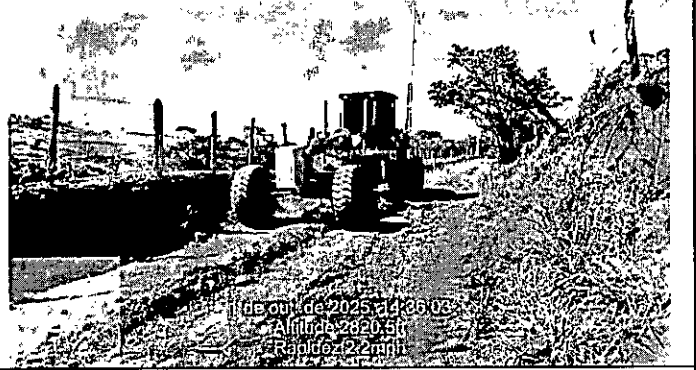


LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS




LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS



LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

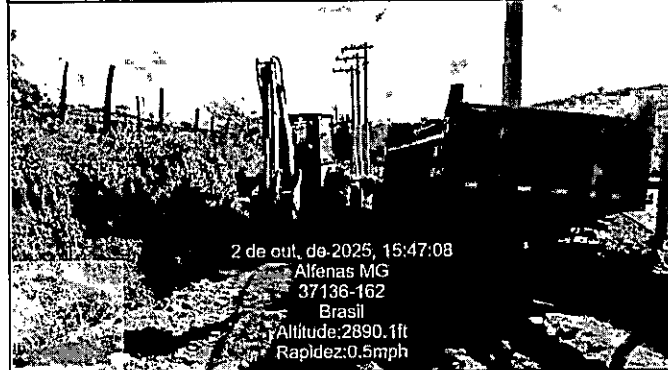

LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

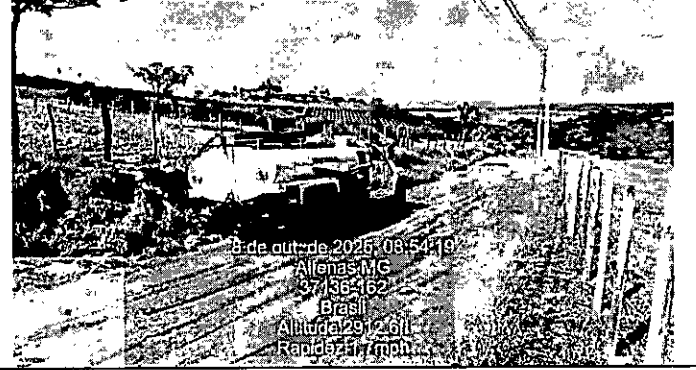


LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS


27/10/2025

CONTRATO	OBJETO	GESTOR DO CONTRATO	RESPONSÁVEL DA OBRA / CONTRATAÇÃO
081/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS.	DECIO PAULINO DA COSTA	RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PRELIMINAR	DATAS - LINHA DE BASE ORIGINAL		PERÍODO DE ANÁLISE
180	INÍCIO 23/07/2025	TÉRMINO 23/01/2026	15/09/2025 23/10/2025
	DATAS - LINHA DE BASE REPLANEJADA		
	INÍCIO	TÉRMINO	
	DATAS - CRONOGRAMA CORRENTE		
	INÍCIO	TÉRMINO	
	23/07/2025	30/12/2025	


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

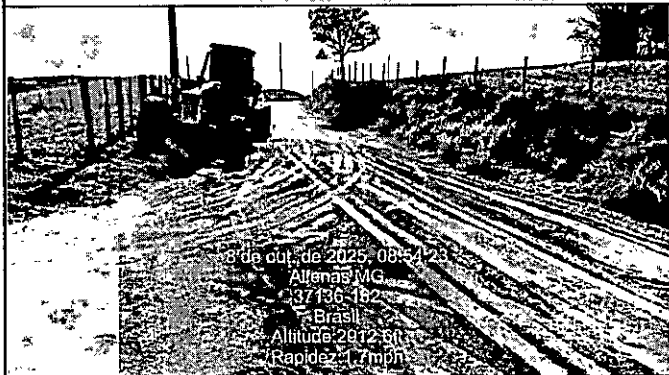

LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

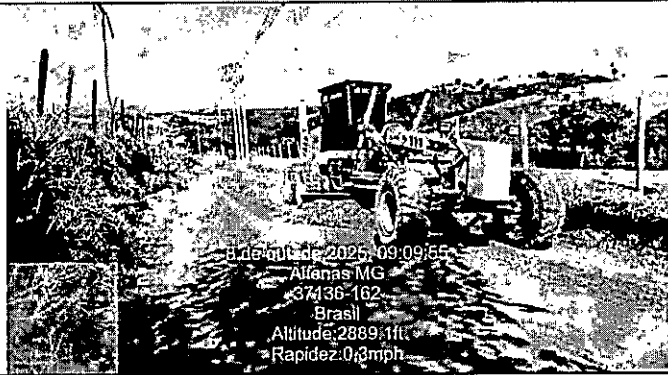


LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

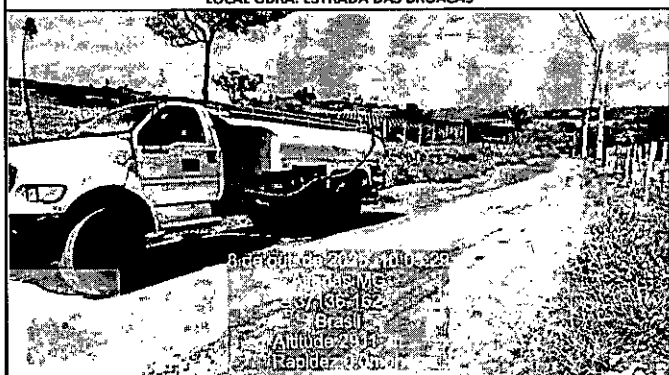


LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS




LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

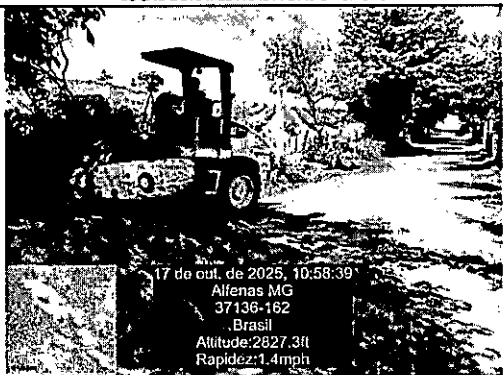


LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

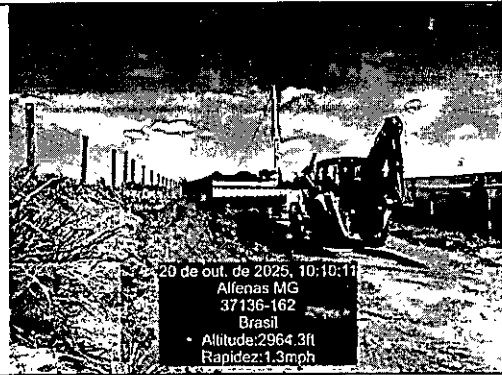

LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

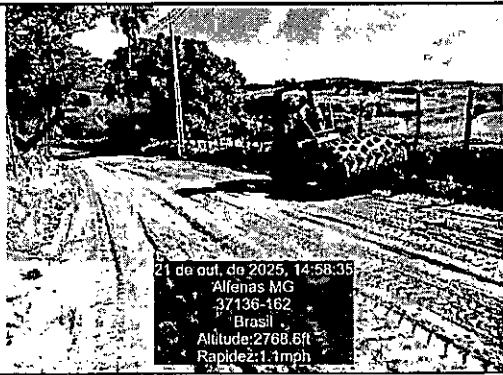

LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

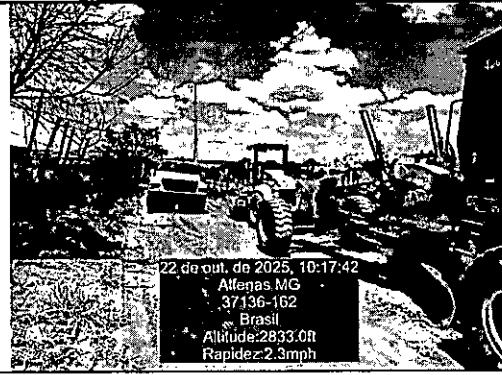

LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS



REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

4ª MEDIÇÃO



PROponente: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
 Endereço: TV. Dinah Aparecida Fronteira Theodoro, nº 40, PQ Gabriel, Hortolândia-SP
 CEP: 13186-616 CIDADE: HORTOLÂNDIA - SP ESTADO: SÃO PAULO
 TELEFONE: 19 - 98730-7976 FAX: E-MAIL: REPLANLOCAÇÕES@OUTLOOK.COM
 CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
 Ref.: Contrato nº 081/2025
 Ref.: Dispensa Emergencial

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.

LOCAL DA OBRA: BAIRRO ANGLINHAS ROD. DOMINGO RIBEIRO RESENDE E ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)
 ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE	CUSTO UNIT. C/ BDI	VALOR DE CONTRATO	QTDE. EXE. PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO	SALDO QTDE.	SALDO DE CONTRATO	PORC.
1	RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	m³	45.000,00	R\$ 50,60	R\$ 2.277.000,00	2.818,80	R\$ 142.631,28	8.926,20	R\$ 451.665,72	36.073,80	R\$ 1.825.334,28	20%
2	RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS E CORTE	m³	5.000,00	R\$ 64,40	R\$ 322.000,00	24,00	R\$ 1.545,60	2.456,40	R\$ 158.192,16	2.543,60	R\$ 163.807,84	49%
3	LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE CANALETAS, BUEIROS, ESCADAS D'ÁGUA, CAIXAS E ALAS) COM ÊNFASE NA DRENAGEM E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES)	m²	19.993,75	R\$ 18,40	R\$ 367.885,00		R\$ -	-	R\$ -	19.993,75	R\$ 367.885,00	0%
4	ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE CONCRETO	uni.	10,00	R\$ 4.255,00	R\$ 42.550,00		R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 42.550,00	0%
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	uni.	10,00	R\$ 299,00	R\$ 2.990,00		R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 2.990,00	0%
6	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250.	m	2.000,00	R\$ 46,00	R\$ 92.000,00		R\$ -	-	R\$ -	2.000,00	R\$ 92.000,00	0%
7	DESOBSTRUÇÃO DE VIAS	m³	1.895,00	R\$ 345,00	R\$ 653.775,00		R\$ -	300,00	R\$ 103.500,00	1.595,00	R\$ 550.275,00	16%
8	TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	m³	1.000,00	R\$ 80,50	R\$ 80.500,00	52,50	R\$ 4.226,25	202,50	R\$ 16.301,25	797,50	R\$ 64.198,75	20%
9	LIMPEZA E REPAROS SIMPLES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	m	200,00	R\$ 494,50	R\$ 98.900,00		R\$ -	-	R\$ -	200,00	R\$ 98.900,00	0%
10	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA ARTICULADA	m²	40.000,00	R\$ 1,15	R\$ 46.000,00	1.266,00	R\$ 1.455,90	13.266,00	R\$ 15.255,90	26.734,00	R\$ 30.744,10	33%
11	IMPLEMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE BOLSÕES D'ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS	m³	3.750,00	R\$ 59,80	R\$ 224.250,00	779,30	R\$ 46.602,14	2.677,02	R\$ 160.085,80	1.072,98	R\$ 64.164,20	71%
12	PODA	m³	1.200,00	R\$ 57,50	R\$ 69.000,00	637,50	R\$ 36.656,25	1.200,00	R\$ 69.000,00	-	R\$ -	100%
13	REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	300.000,00	R\$ 2,30	R\$ 690.000,00	38.892,00	R\$ 89.451,60	67.852,00	R\$ 156.059,60	232.148,00	R\$ 533.940,40	23%
SUBTOTAL ITEM 6:					R\$ 4.966.850,00		R\$ 322.569,02				R\$ 3.836.789,57	
					CONTRATADO		MED. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO CONTRATO	
					R\$ 4.966.850,00		R\$ 322.569,02				R\$ 3.836.789,57	
SUBTOTAL					R\$ 4.966.850,00		R\$ 322.569,02		R\$ 1.130.060,43		R\$ 3.836.789,57	
					R\$ 4.966.850,00		R\$ 322.569,02		R\$ 1.130.060,43		R\$ 3.836.789,57	23%

VALOR DA MEDIÇÃO NO PERÍODO: R\$ 325.974,17 (Trezentos e vinte cinco mil novecentos e setenta quatro reais e dezessete centavos)

Alfenas-MG, 08 de dezembro de 2025.

PROPONENTE: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/ME: 53.778.325/0001-66

RODOLFO BORGES
FISCAL DE CONTRATO
MATRICULA - 52331

IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - Desenvolvimento Urbano
MATRICULA - 52203

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

08/12/2025

PROPONENTE: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

ENDEREÇO: TV. Dinah Aparecida Fronteira Theodoro, nº 40, PQ Gabriel, Hortolândia-SP

CEP: 13186-816

CIDADE: HORTOLÂNDIA - SP

ESTADO: SÃO PAULO

TELEFONE: 19 - 98730-7976 FAX:

E-MAIL: REPLANLOCAÇÕES@OUTLOOK.COM

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Ref.: Contrato nº 081/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO	MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO			
1	Serviços Preliminares								
1	RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO	M3	45.000,00						
TI	Comprimento M	H	Largura	M3	Comprimento M	Largura	H	M3	
TRECHO I	750,00	0,15	6,00	675,00	3.132,00	6,00	0,15	2.818,80	
TRECHO II	1.660,00	0,15	6,00	1.494,00					
TRECHO III	722,00	0,15	6,00	649,80					
								2.818,80	
								2.818,80	
2	RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS E CORTE	M3	5.000,00						
TRECHO I		H	0,20 X	Comprimento	Largura	Quant. M3			
				20,00 X	6,00	24,00			
					Total	24,00			
3	LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE CANALETAS, BUEIROS, ESCADAS	M2	19.893,75						
		H	X	Comprimento	Largura	Quant.			
					Total				
4	ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE CONCRETO	UNI	10,00						
		H	X	Comprimento	Largura	Quant.			
					Total				
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	UNI	10,00						
		H	X	Comprimento	Largura	Quant.			
					Total				
6	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROÇA; DIÂMETRO 11 CM. ESPAÇAMENTO DE 2,5 M. ALTURA LIVRE DE 1,7 M. CRAVADOS 0,5 M.	M	637,50						
				Comprimento	Largura	Quant.			
				28.960,00 X					
					Total				
7	DESOBSTRUÇÃO DE VIAS	M3	1.895,00						
		H	0,33 X	Comprimento	Largura	Quant.			
					1,00				
					Total				
8	TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	M3	1.000,00						
TRECHO I		H	1,00 X	Comprimento	Largura	Quant.			
				35,00 X	1,50	52,50			
					Total	52,50			
9	LIMPEZA E REPAROS SIMPLES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	M	200,00						
			X	Comprimento	Largura	Quant.			
					1,00				
					Total				
10	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA ARTICULADA	M2	1.266,00						
TRECHO I	422,00	3,00	0,00						
TRECHO II	987,00	3,00	0,00						
				FISCAL DE CONTRATO	X	1.266,00			
				MATRICULA - 62331					
					Total	1.266,00			
11	IMPLEMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE BOLSÕES D'ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS	M3	3.750,00						
BOLSÃO I	ANGOLINHA	22,50	TOTAL M3 BOLSOES	H	Comprimento	Largura	Quant.		
BOLSÃO II	ANGOLINHA	60,00		EMPOLAMENTO X	20%	X	779,30		
BOLSÃO III	170,75	696,80				Total	779,30		
12	PODA	M3	1.200,00						
TRECHO I	ANGOLINHA	39,00	1,00	0,50	19,50	H	Comprimento	Largura	Quant.
TRECHO II	1.236,00	1,00	0,50	618,00	X	X			
				IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS		Total		637,50	
						Total		637,50	
13	REGULARIZAÇÃO DE BASE								
TI	Comprimento	H	Largura	Quant.	MATRICULA - 52203	Comprimento	Largura	Quant.	
TRECHO I	760,00	0,00	6,00	4.500,00					
TRECHO II	1.660,00	0,00	6,00	9.960,00		2.330,00 X	6,00	38.892,00	
TRECHO III	722,00	0,00	6,00	4.332,00					
TRECHO IV	3.350,00	0,00	6,00	20.100,00					
						Total		38.892,00	
						Quantidade		Total (UN)	
					VALOR	MEDIÇÃO	Total	322.569,02	

Alfenas-MG, 08 de dezembro de 2025.

PROPONENTE: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA


CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

RODOLFO BORGES
FISCAL DE CONTRATO
MATRICULA - 52331IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - Desenvolvimento Urbano
MATRICULA - 52203


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

08/12/2025


08/1/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.	DECIO PAULINO DA COSTA	RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
180	INICIO: 23/07/2025 TERMINO: 23/01/2026	INICIO: 23/07/2025 TERMINO: 30/12/2025	INICIO: 23/10/2025 TERMINO: 08/12/2025

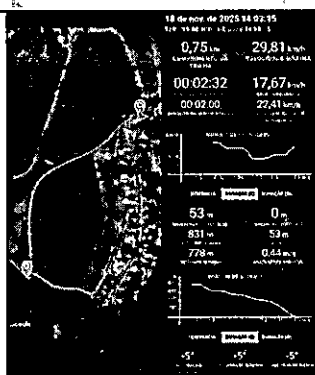


LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

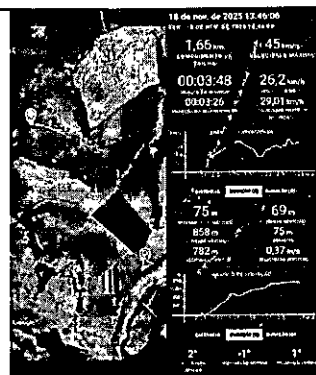


LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

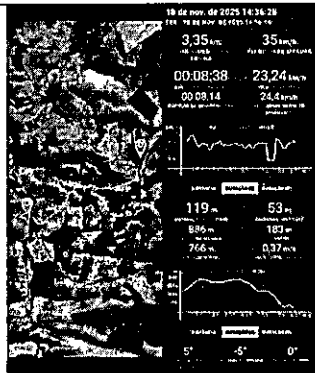


LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E PODA

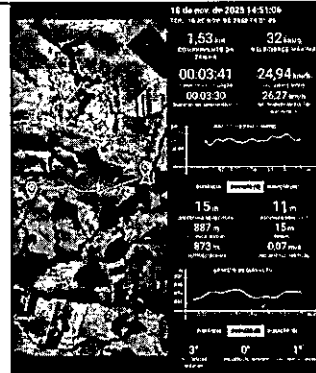


LOCAL OBRA: ANGOLINHA PODA

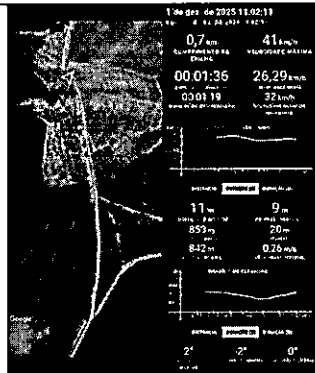

LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

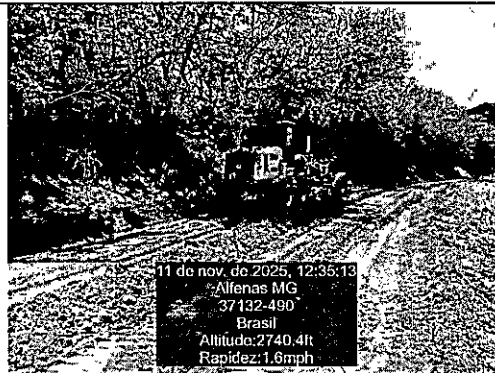

LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

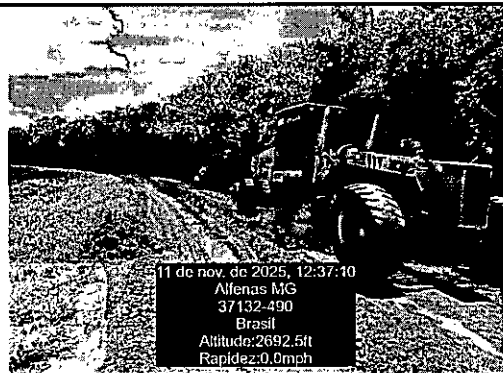

LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO



LOCAL OBRA: ANGOLINHA LIMPEZA DE BOLSÕES

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS


08/12/2025

CONTRATO	OBJETO	GESTOR DO CONTRATO	RESPONSÁVEL DA OBRA CONTRATADA
081/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS.	DECIO PAULINO DA COSTA	RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PREZ. OBRAS	DATAS-LINHA DE BASE ORIGINAL	DATAS-LINHA DE BASE REPLANEJADA	DATAS-CRONOGRAMA CORRENTE
180	INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 23/01/2026	INÍCIO: _____ TÉRMINO: _____	INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 30/12/2025
PERÍODO DE ANÁLISE: 23/10/2025 a 08/12/2025			

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

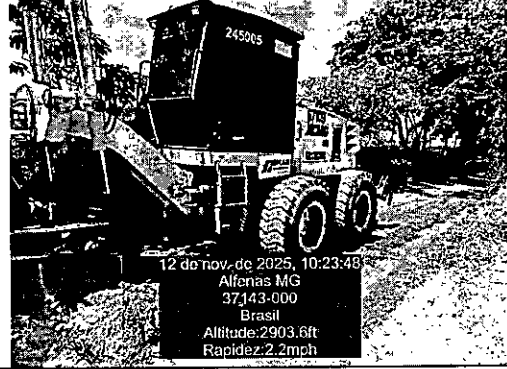


LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO



LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

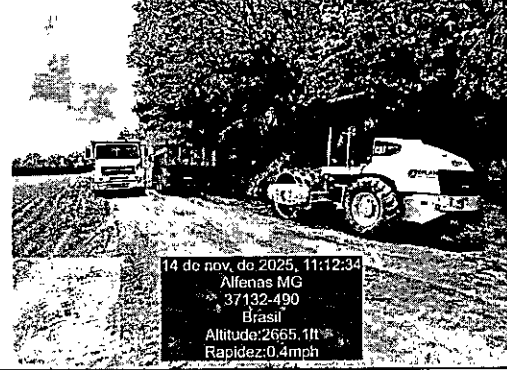


LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

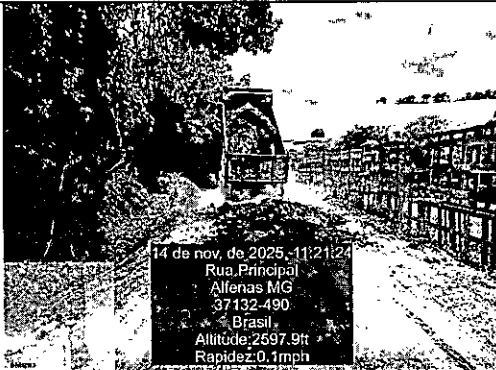


LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO



LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

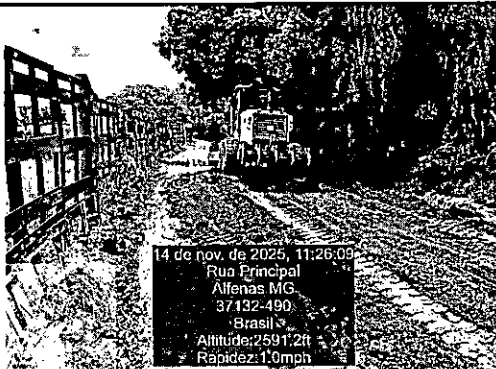

LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

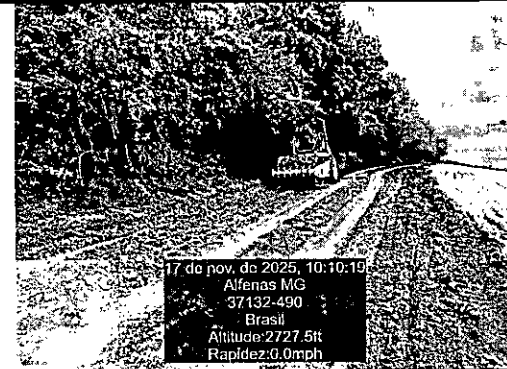


LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS


08/12/2025

<p>CONTRATO 081/2025</p>	<p>OBJETO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS.</p>	<p>GESTOR DO CONTRATO DECIO PAULINO DA COSTA</p>	<p>RESPONSÁVEL DA EXECUÇÃO RICARDO ELTRE SILVA GERALDO</p>
<p>PRAZO DIAS 180</p>	<p>DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 23/01/2026</p>	<p>DATAS LINHA DE BASE REPLANADA INÍCIO: _____ TÉRMINO: _____</p>	<p>DATAS ORÇONOGRAMA CORRENTE INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 30/12/2025</p> <p>PERÍODO DE ANÁLISE 23/10/2025 08/12/2025</p>


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

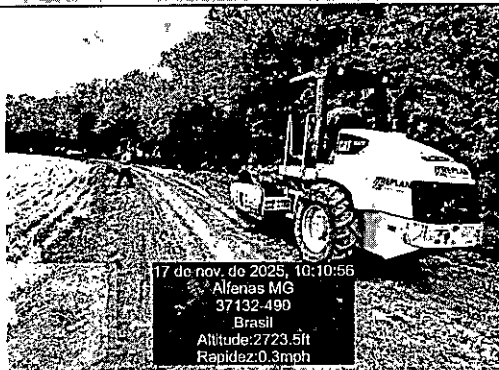


LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

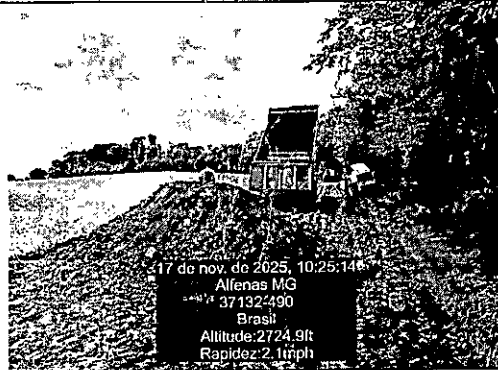

LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

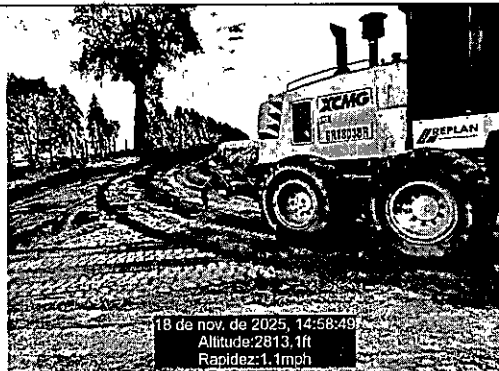


LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

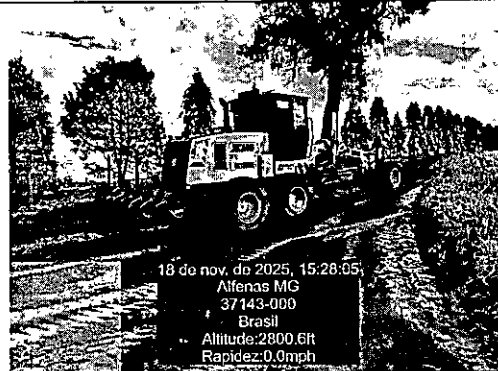


LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO



LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

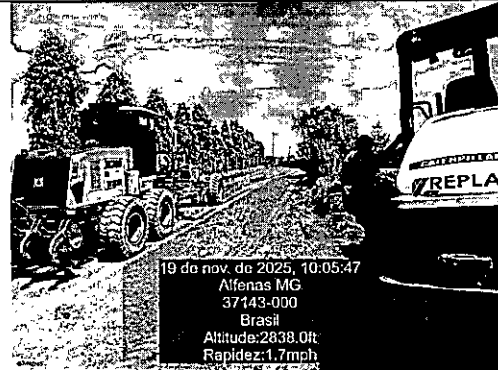

LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

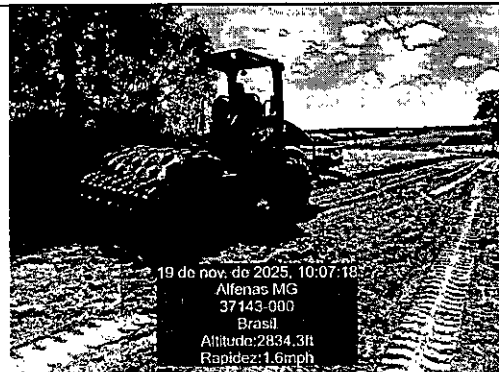

LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO




LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS


08/12/2025

CONTINUIDADE	08/1/2025	OBJETO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS.		GESTOR DO CONTRATO DECIO PAULINO DA COSTA		RESPONSÁVEL DA OBRA/CONTABILIDADE RICARDO ELTRE SILVA GERALDO	
PREZADOS	DATA/SERIE DE BASE ORIGINAL INÍCIO 23/07/2025		DATA/SERIE DE BASE - REPARAÇÃO INÍCIO		DATA/SERIE DE BASE - CORRETIVE INÍCIO 23/07/2025		PLACADO DE ANÁLISE 23/10/2025
	TERMINO 23/01/2026		TERMINO		TERMINO 30/12/2025		08/12/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

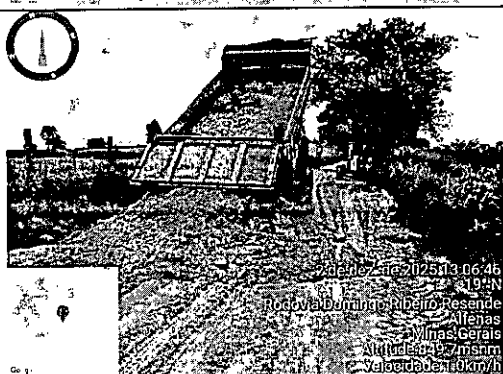


LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO




LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO



LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS

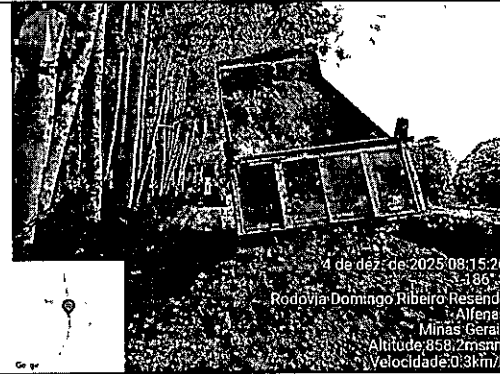

LOCAL OBRA: ESTRADA DAS BRUACAS



LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO



LOCAL OBRA: ANGOLINHA LIMPEZA DE BOLSÕES



LOCAL OBRA: ANGOLINHA LIMPEZA DE BOLSÕES





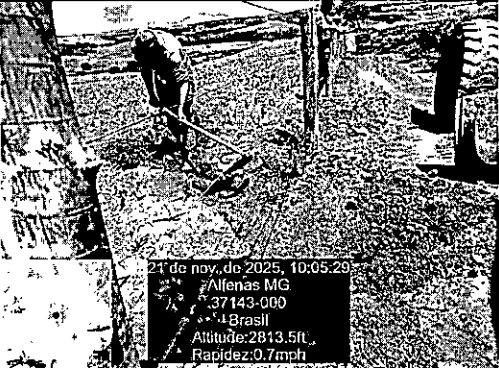
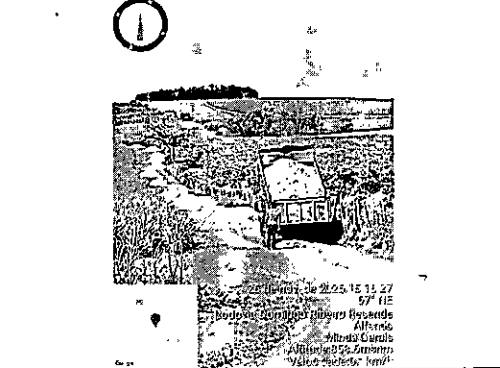
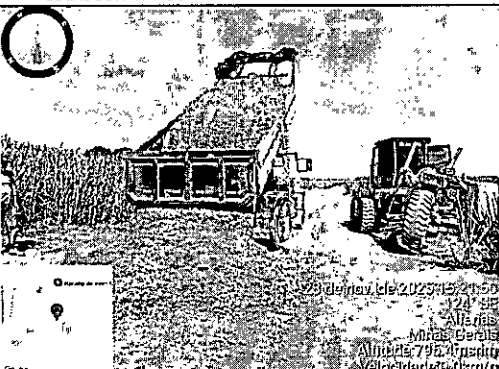
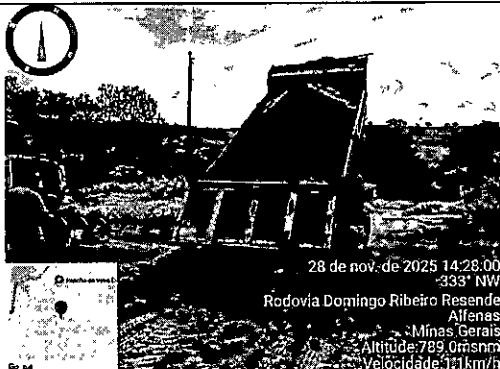
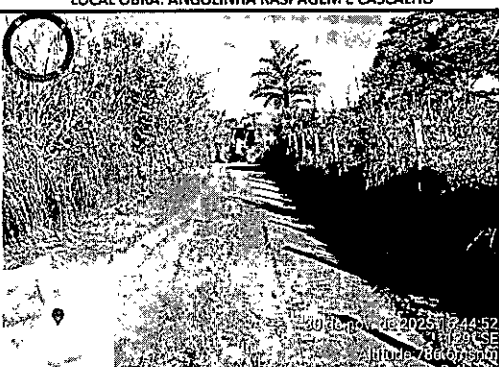

LOCAL OBRA: ANGOLINHA LIMPEZA DE BOLSÕES

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

08/12/2025

CONTRATO	OBJETO	GESTOR DO CONTRATO	RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA
081/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS.	DECIO PAULINO DA COSTA	RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PRAZO/DIAS	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL		PERÍODO DE ANÁLISE
180	INÍCIO 23/07/2025	TÉRMINO 23/01/2026	23/10/2025 08/12/2025
	DATAS LINHA DE BASE REPLANADA		DATAS CRONOGRAMA CORRENTE
	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO 23/07/2025
			TÉRMINO 30/12/2025

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

 <p>19 de nov. de 2025, 10:27:14 Altitude: 2928.4ft Rapidez: 1.5mph</p> <p>LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO</p>	 <p>19 de nov. de 2025, 10:38:00 Altitude: 2946.4ft Rapidez: 0.0mph</p> <p>LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO</p>
 <p>21 de nov. de 2025, 10:05:29 Altitude: 2813.5ft Rapidez: 0.7mph</p> <p>LOCAL OBRA: ANGOLINHA ABERTURA RETIRADA DE AGUA</p>	 <p>22 de nov. de 2025, 11:27:57 Altitude: 2925.0ft Rapidez: 0.0mph</p> <p>LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO</p>
 <p>23 de nov. de 2025, 13:16:50 Altitude: 2925.0ft Rapidez: 0.0mph</p> <p>LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO</p>	 <p>28 de nov. de 2025, 14:28:00 Altitude: 333' NW Rodovia Domingo Ribeiro Resende Altitude: 789.0msnm Velocidade: 1.1km/h</p> <p>LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO</p>
 <p>30 de nov. de 2025, 17:44:52 Altitude: 786.0msnm Velocidade: 2.4km/h</p> <p>LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO</p>	 <p>1 de dez. de 2025, 15:52:51 Altitude: 851.7msnm Velocidade: 1.1km/h</p> <p>LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO</p>



REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

5ª MEDIÇÃO



ENDEREÇO: TV. Dinah Aparecida Fronteira Theodoro, nº 40, PQ Gabriel, Hortolândia-SP
 CEP: 13186-616 CIDADE: HORTOLANDIA - SP ESTADO: SÃO PAULO
 TELEFONE: 19 - 98730-7976 FAX: E-MAIL: REPLANLOCAÇÕES@OUTLOOK.COM
 CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Ref.: Contrato nº 081/2025

Ref.: Dispensa Emergencial

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.

LOCAL DA OBRA: BAIRRO SANTO ME ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS												
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTARIA												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. C/BDI	VALOR DE CONTRATO	QTDE. EXE. PERIODO	VALOR PERIODO	ACUMULADO	ACUMULADO	SALDO QTDE.	SALDO DE CONTRATO	PORC.
1	RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	m³	45.000,00	R\$ 50,60	R\$ 2.277.000,00	346,50	R\$ 17.532,90	9.272,70	R\$ 469.198,62	35.727,30	R\$ 1.807.801,38	21%
2	RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS E CORTE	m³	5.000,00	R\$ 64,40	R\$ 322.000,00		R\$ -	2.456,40	R\$ 158.192,16	2.543,60	R\$ 163.807,84	49%
3	LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE CANALETAS, BUEIROS, ESCADAS D'ÁGUA, CAIXAS E ALAS) COM ÊNFASE NA DRENAGEM E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES)	m²	19.993,75	R\$ 18,40	R\$ 367.885,00	-	R\$ -	-	R\$ -	19.993,75	R\$ 367.885,00	0%
4	ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE CONCRETO	uni.	10,00	R\$ 4.255,00	R\$ 42.550,00	-	R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 42.550,00	0%
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	uni.	10,00	R\$ 299,00	R\$ 2.990,00	-	R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 2.990,00	0%
6	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250.	m	2.000,00	R\$ 46,00	R\$ 92.000,00	-	R\$ -	-	R\$ -	2.000,00	R\$ 92.000,00	0%
7	DESOBSTRUÇÃO DE VIAS	m³	1.895,00	R\$ 345,00	R\$ 653.775,00		R\$ -	300,00	R\$ 103.500,00	1.595,00	R\$ 550.275,00	16%
8	TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	m³	1.000,00	R\$ 80,50	R\$ 80.500,00	-	R\$ -	202,50	R\$ 16.301,25	797,50	R\$ 64.198,75	20%
9	LIMPEZA E REPAROS SIMPLES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	m	200,00	R\$ 494,50	R\$ 98.900,00	-	R\$ -	-	R\$ -	200,00	R\$ 98.900,00	0%
10	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA ARTICULADA	m²	40.000,00	R\$ 1,15	R\$ 46.000,00	-	R\$ -	13.266,00	R\$ 15.255,90	26.734,00	R\$ 30.744,10	33%
11	IMPLEMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE BOLSÕES D'ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS	m³	3.750,00	R\$ 59,80	R\$ 224.250,00	239,46	R\$ 14.319,71	2.916,48	R\$ 174.405,50	833,52	R\$ 49.844,50	78%
12	PODA	m³	1.200,00	R\$ 57,50	R\$ 69.000,00	-	R\$ -	1.200,00	R\$ 69.000,00	-	R\$ -	100%
13	REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	300.000,00	R\$ 2,30	R\$ 690.000,00	2.310,00	R\$ 5.313,00	70.162,00	R\$ 161.372,60	229.838,00	R\$ 528.627,40	23%
					SUBTOTAL ITEM 6:	R\$ 4.966.850,00		R\$ 37.165,61			R\$ 3.799.623,97	
					CONTRATADO		MED. PERIODO		ACUMULADO		SALD CONTRATO	
					R\$ 4.966.850,00		R\$ 37.165,61				R\$ 3.799.623,97	
					SUBTOTAL	R\$ 4.966.850,00	R\$ 37.165,61		R\$ 1.167.226,03		R\$ 3.799.623,97	
					R\$ 4.966.850,00		R\$ 37.165,61		R\$ 1.167.226,03		R\$ 3.799.623,97	24%
VALOR DA MEDIÇÃO NO PERIODO: R\$ 37.165,61 (Trinta sete mil cento e sessenta cinco reais e sessenta um centavos)												

[Handwritten signature]

PROPONENTE: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66



ESTEFANI ALVES DOS SANTOS

FISCAL DE CONTRATO - ENG. CIVIL - CREA-MG. 235594/D

MATRICULA - 48143/1



RODOLFO BORGES


SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

MATRICULA - 52331

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

08/12/2025

CONTRATO	OBJETO	GESTOR DO CONTRATO	RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA
081/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS.	RODOLFO BORGES	RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PRAZO DIAS	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL	DATAS LINHA DE BASE REPLANEJADA	DATAS CRONOGRAMA CORRENTE
5ª MEDIÇÃO	INÍCIO: 23/07/2025 TERMINO: 29/01/2026	INÍCIO: _____ TERMINO: _____	INÍCIO: 23/07/2025 TERMINO: 28/07/2026
			PERÍODO DE ANÁLISE
			08/12/2025 23/12/2025

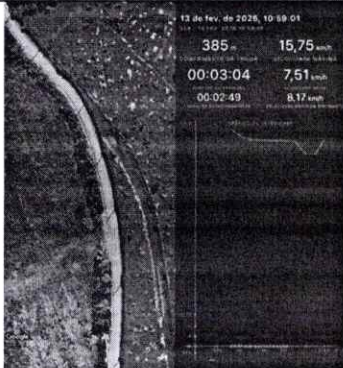

LOCAL DA OBRA: BAIRRO SANTO ME ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)




LOCAL DA OBRA: BAIRRO SANTO ME ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)




LOCAL DA OBRA: BAIRRO SANTO ME ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)



LOCAL DA OBRA: BAIRRO SANTO ME ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)

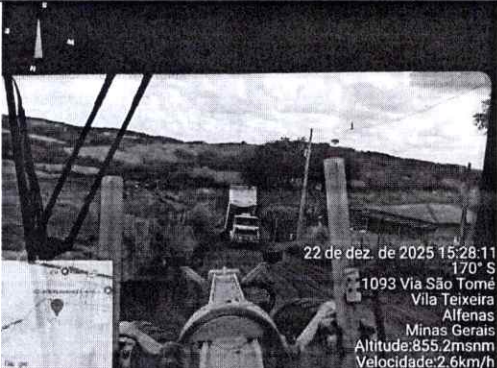


LOCAL DA OBRA: BAIRRO SANTO ME ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)

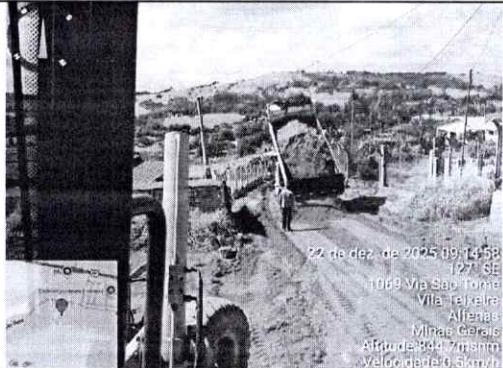

LOCAL DA OBRA: BAIRRO SANTO ME ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)



LOCAL DA OBRA: BAIRRO SANTO ME ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)

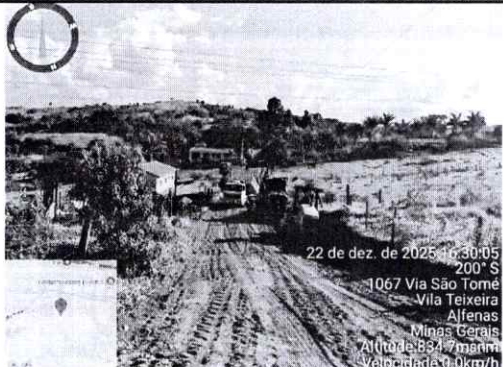

LOCAL DA OBRA: BAIRRO SANTO ME ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

08/12/2025

CONTRATO	OBJETO	GESTOR DO CONTRATO	RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA
081/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS.	RODOLFO BORGES	RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PRAZO DIAS	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL		PERÍODO DE ANÁLISE
5ª MEDIÇÃO	INÍCIO: 23/07/2025 TERMINO: 28/07/2026	INÍCIO: ----- TERMINO: -----	08/12/2025 23/12/2025
	DATAS LINHA DE BASE REPLANEJADA		DATAS CRONOGRAMA CORRENTE
	INÍCIO: ----- TERMINO: -----	INÍCIO: ----- TERMINO: -----	23/07/2025 30/12/2025




LOCAL DA OBRA: BAIRRO SANTO ME ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)

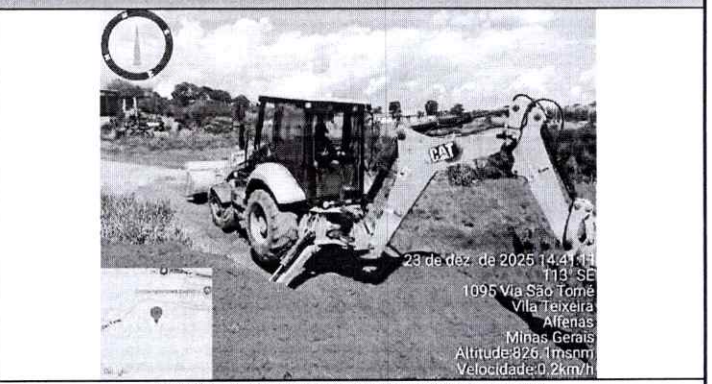


LOCAL DA OBRA: BAIRRO SANTO ME ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)




LOCAL DA OBRA: BAIRRO SANTO ME ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)



LOCAL DA OBRA: BAIRRO SANTO ME ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)



LOCAL DA OBRA: BAIRRO SANTO ME ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)



LOCAL DA OBRA: BAIRRO SANTO ME ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)



LOCAL DA OBRA: BAIRRO SANTO ME ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)




LOCAL DA OBRA: BAIRRO SANTO ME ESTRADAS DE ACESSO (ALFENAS-MG)

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

1

Alenas-MG, 18 de fevereiro de 2026.


PRÓPONENTE: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

ESTEFANI A. DOS SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MG 235594/D



STEFANI ALVES DOS SANTOS
FISCAL DE CONTRATO - ENGº CIVIL - CREA - MG 235594-D
MATRICULA - 48143/1


RODOLFO BORGES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
MATRICULA - 523730


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

18/12/2026


CONTRATO	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.		GESTOR DO CONTRATO	RODOLFO BORGES		RESPONSÁVEL DA OBRA-CONTRATADA	RICARDO ELTRE SILVA GERALDO	
HRZ 11545	DATAS LÍMITE DE BANC. CHEQUEAL		DATAS LÍMITE DE BANC. PRECATORIA		DATAS CR. TRIBUTÁRIA CORRENTE		PERÍODO DE ANÁLISE	
180	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	18/01/2026	02/02/2026
	23/07/2025	23/01/2026			23/07/2025	28/07/2026		

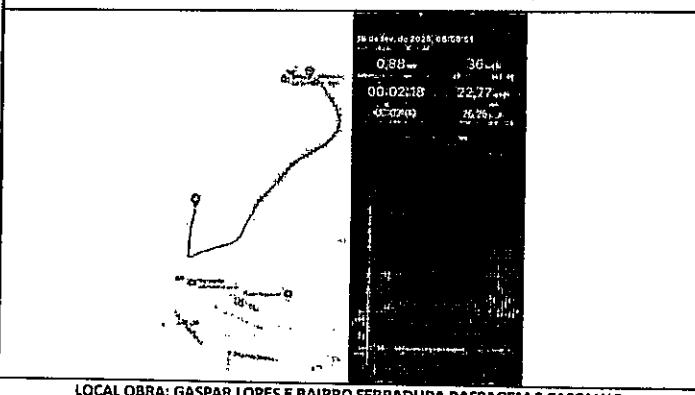

LOCAL OBRA: GASPAR LOPES E BAIRRO FERRADURA RASPAGEM E CASCALHO

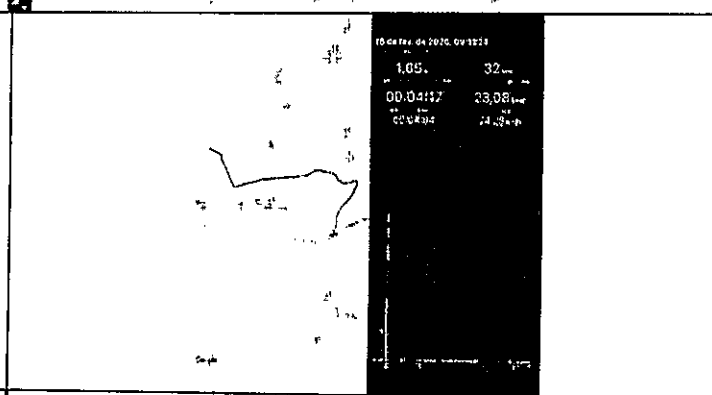

LOCAL OBRA: GASPAR LOPES E BAIRRO FERRADURA RASPAGEM E CASCALHO

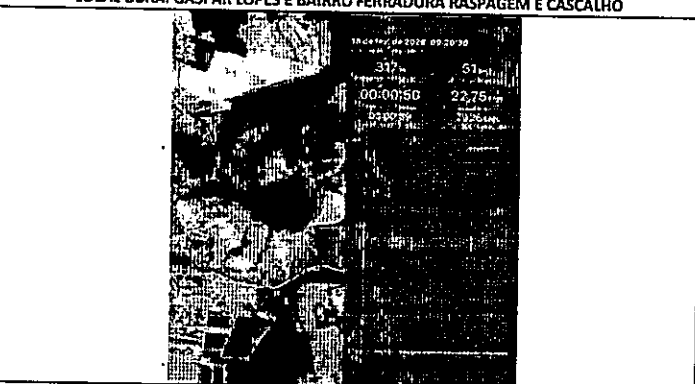

LOCAL OBRA: GASPAR LOPES E BAIRRO FERRADURA RASPAGEM E CASCALHO




LOCAL OBRA: GASPAR LOPES E BAIRRO FERRADURA RASPAGEM E CASCALHO




LOCAL OBRA: GASPAR LOPES E BAIRRO FERRADURA RASPAGEM E CASCALHO



LOCAL OBRA: GASPAR LOPES E BAIRRO FERRADURA RASPAGEM E CASCALHO

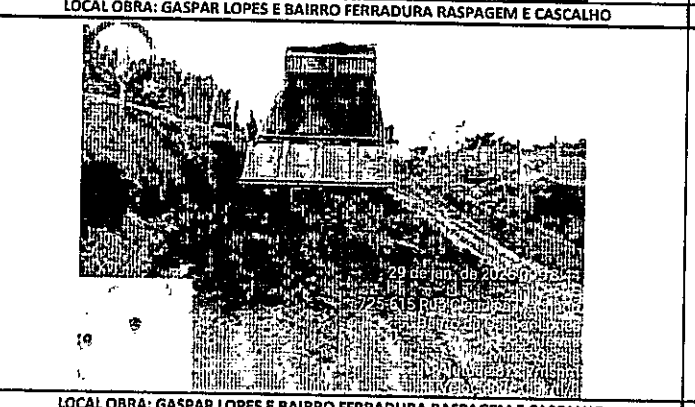

LOCAL OBRA: GASPAR LOPES E BAIRRO FERRADURA RASPAGEM E CASCALHO

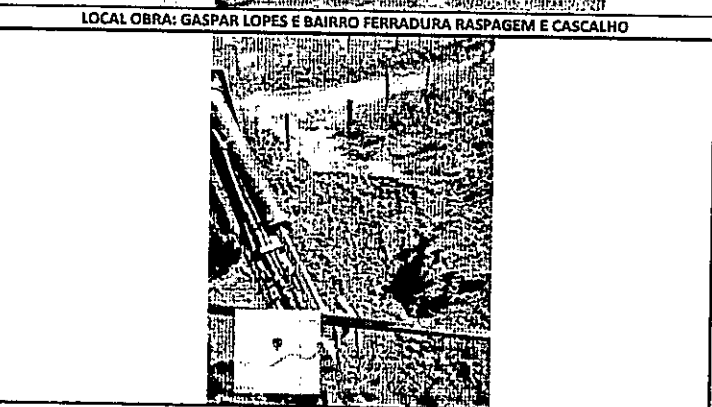


LOCAL OBRA: GASPAR LOPES E BAIRRO FERRADURA RASPAGEM E CASCALHO

N.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

CONTRATO	OBJETO		GESTOR DO CONTRATO	RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA
081/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS.		RODOLFO BORGES	RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
QUANTIDADE	DADOS DE INÍCIO DE EXECUÇÃO		DADOS DE INÍCIO DE EXECUÇÃO	PERÍODO DE ANÁLISE
180	DIA(M)	TER(M)	DIA(M)	TER(M)
	23/07/2025	23/01/2026	23/07/2025	28/07/2026
			18/01/2026	02/02/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

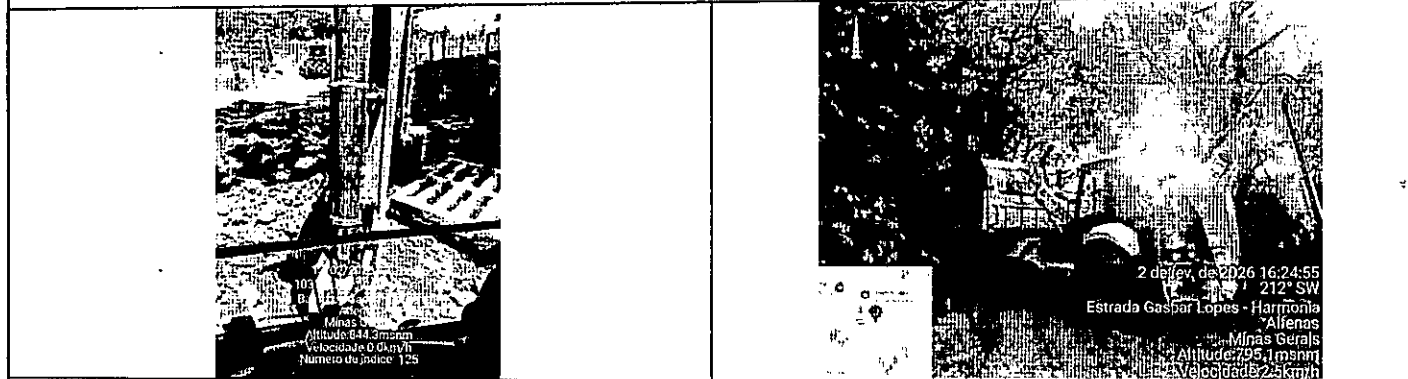


LOCAL OBRA: GASPAR LOPES E BAIRRO FERRADURA RASPAGEM E CASCALHO


LOCAL OBRA: GASPAR LOPES E BAIRRO FERRADURA RASPAGEM E CASCALHO



LOCAL OBRA: GASPAR LOPES E BAIRRO FERRADURA RASPAGEM E CASCALHO

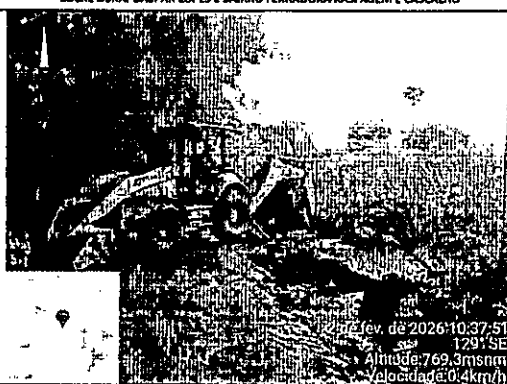

LOCAL OBRA: GASPAR LOPES E BAIRRO FERRADURA RASPAGEM E CASCALHO

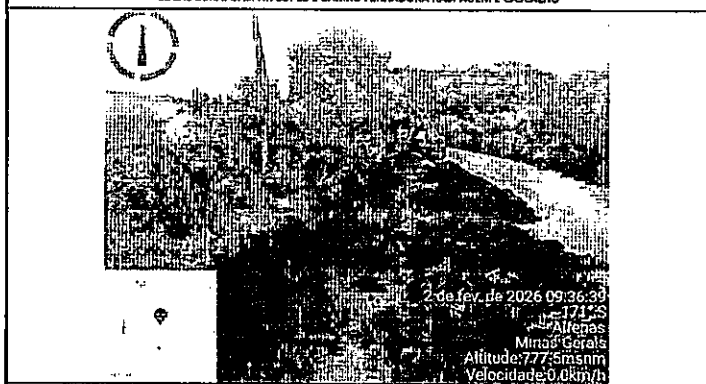


LOCAL OBRA: GASPAR LOPES E BAIRRO FERRADURA RASPAGEM E CASCALHO



LOCAL OBRA: GASPAR LOPES E BAIRRO FERRADURA RASPAGEM E CASCALHO



LOCAL OBRA: GASPAR LOPES E BAIRRO FERRADURA RASPAGEM E CASCALHO



LOCAL OBRA: GASPAR LOPES E BAIRRO FERRADURA RASPAGEM E CASCALHO

Handwritten mark or signature.



REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

7ª MEDIÇÃO



ENDEREÇO: TV. Dinah Aparecida Fronteira Theodoro, nº 40, PQ Gabriel, Hortolândia-SP

TELEFONE: 19 - 98730-7976 FAX:
 CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

E-MAIL: REPLANLOCAÇÕES@OUTLOOK.COM

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
 Ref.: Contrato nº 081/2025
 Ref.: Dispensa Emergencial

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.

LOCAL DA OBRA: ESTRADAS DO MUQUIRANA (ALFENAS-MG)
 ORDENS DE SERVIÇOS Nº 003/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. C/ BDI	VALOR DE CONTRATO	QTDE. EXE. PERIODO	VALOR PERIODO	ACUMULADO	ACUMULADO	SALDO QTDE.	SALDO DE CONTRATO	PORC.
1	RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	m³	45.000,00	R\$ 50,60	R\$ 2.277.000,00	-	R\$ -	9.558,00	R\$ 483.634,80	35.442,00	R\$ 1.793.365,20	21%
2	RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS E CORTE	m³	5.000,00	R\$ 64,40	R\$ 322.000,00	-	R\$ -	2.432,40	R\$ 156.646,56	2.567,60	R\$ 165.353,44	49%
3	LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE CANALETAS, BUEIROS, ESCADAS D'ÁGUA, CAIXAS E ALAS) COM ÊNFASE NA DRENAGEM E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES)	m²	19.993,75	R\$ 18,40	R\$ 367.885,00	-	R\$ -	-	R\$ -	19.993,75	R\$ 367.885,00	0%
4	ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE CONCRETO	uni.	10,00	R\$ 4.255,00	R\$ 42.550,00	-	R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 42.550,00	0%
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	uni.	10,00	R\$ 299,00	R\$ 2.990,00	-	R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 2.990,00	0%
6	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250.	m	2.000,00	R\$ 46,00	R\$ 92.000,00	-	R\$ -	-	R\$ -	2.000,00	R\$ 92.000,00	0%
7	DESOBSTRUÇÃO DE VIAS	m³	1.895,00	R\$ 345,00	R\$ 653.775,00	-	R\$ -	400,80	R\$ 138.276,00	1.494,20	R\$ 515.499,00	21%
8	TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	m³	1.000,00	R\$ 80,50	R\$ 80.500,00	-	R\$ -	300,00	R\$ 24.150,00	700,00	R\$ 56.350,00	30%
9	LIMPEZA E REPAROS SIMPLES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	m	200,00	R\$ 494,50	R\$ 98.900,00	-	R\$ -	-	R\$ -	200,00	R\$ 98.900,00	0%
10	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA ARTICULADA	m²	40.000,00	R\$ 1,15	R\$ 46.000,00	-	R\$ -	1.200,00	R\$ 1.380,00	38.800,00	R\$ 44.620,00	3%
11	IMPLEMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE BOLSÕES D'ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS	m³	3.750,00	R\$ 59,80	R\$ 224.250,00	657,37	R\$ 39.310,73	3.750,00	R\$ 224.250,00	-	R\$ -	100%
12	PODA	m³	1.200,00	R\$ 57,50	R\$ 69.000,00	-	R\$ -	1.200,00	R\$ 69.000,00	-	R\$ -	100%
13	REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	300.000,00	R\$ 2,30	R\$ 690.000,00	165.960,00	R\$ 381.708,00	236.122,00	R\$ 543.080,60	63.878,00	R\$ 146.919,40	79%
SUBTOTAL ITEM 6:					R\$ 4.966.850,00		R\$ 421.018,73				R\$ 3.326.432,04	
					CONTRATADO		MED. PERIODO		ACUMULADO		SALD CONTRATO	
					R\$ 4.966.850,00		R\$ 421.018,73		R\$ 1.640.417,96		R\$ 3.326.432,04	
					SUBTOTAL	R\$ 4.966.850,00	R\$ 421.018,73		R\$ 1.640.417,96		R\$ 3.326.432,04	
					R\$ 4.966.850,00	R\$ 421.018,73		R\$ 1.640.417,96		R\$ 3.326.432,04	33%	

VALOR DA MEDIÇÃO NO PERIODO: R\$ 421.018,73 (Quatrocentos e vinte um mil dezoito reais e setenta tres centavos)

R

Alfenas-MG, 18 de fevereiro de 2026.

PROPONENTE: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66



STEFANI ALVES DOS SANTOS

FISCAL DE CONTRATO - ENGº CIVIL - CREA - MG 235594-D
MATRICULA - 48143/1



RODOLFO BORGES

SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
MATRICULA - 523738

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

PROponente: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
 ENDEREÇO: TV. Dinah Aparecida Fronteira Theodoro, nº 40, PQ Gabriel, Hortolândia-SP
 CEP: 13186-616 CIDADE: HORTOLÂNDIA - SP ESTADO: SÃO PAULO
 7ª MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO	MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO			
1	Serviços Preliminares								
1	RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO	M3	45.000,00						
	Tij Comprimento M	H	Largura	M3	Comprimento M	Largura	H	M3	
TRECHO I		0,15	6,00	-	-	6,00	0,15	-	
TRECHO II		0,15	6,00	-	-			-	
DAS DO ML	0,00	0,15	6,00	-	-			-	
SERVIÇOS Nº 003/2026									
					Total	=		-	
2	RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS E CORTE	M3	5.000,00						
	TRECHO I	H	0,20	X	Comprimento	Largura		Quant. M3	
					-	6,00	=	-	
			9.558,00		Total	=		-	
3	LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE CANALETAS, BUEIROS, ESCADAS	M2	19.993,75						
	TRECHO I	H		X	Comprimento	Largura		Quant.	
					-	-	=	-	
					Total	=		-	
4	ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE CONCRETO	UNI	10,00						
	TRECHO I	H	400,80	X	Comprimento	Largura		Quant.	
					-	-	=	-	
					Total	=		-	
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	UNI	10,00						
	TRECHO I	H	3.092,63	X	Comprimento	Largura		Quant.	
					-	-	=	-	
					Total	=		-	
6	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M.	M	#VALOR!						
	TRECHO I	H	28.960,00	X	Comprimento	Largura		Quant.	
					-	-	=	-	
					Total	=		-	
7	DESOBSTRUÇÃO DE VIAS	M3	1.895,00						
	TRECHO I	H	0,33	X	Comprimento	Largura		Quant.	
					-	1,00	=	100,80	
					Total	=		100,80	
Quatrocentos e vinte um mil dezoito reais e setenta tres centavos)									
8	TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	M3	1.000,00						
	TRECHO I	H	1,00	X	Comprimento	Largura		Quant.	
					35,00	1,50	=	-	
					Total	=		-	
9	LIMPEZA E REPAROS SIMPLES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	M	200,00						
	TRECHO I	H		X	Comprimento	Largura		Quant.	
					-	1,00	=	-	
					Total	=		-	
10	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA ARTICULADA	M2							
	TRECHO I	H	0,00		Comprimento	Largura		Quant.	
	TRECHO II	0,00	3,00	0,00	X	X			
					Total	=		-	
11	IMPLEMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE BOLSÕES D'ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS	M3	3.750,00						
	BOLSÃO I	H		EMPOLAMENTO	X	30%	X	Quant.	
	BOLSÃO II	0,00					657,37	657,37	
	BOLSÃO III	0,00					Total	657,37	
12	PODA	M3	1.200,00						
	TRECHO I	H	0,00	1,00	0,50			Quant.	
	TRECHO II	0,00	1,00	0,50	X	X			
					Total	=		-	
13	REGULARIZAÇÃO DE BASE (RASPAGE)								
	Tij Comprimento	H	Largura	Quant.	Comprimento	Largura		Quant.	
TRECHO I		0,00	6,00	165.960,00				27.660,00	
TRECHO II		0,00	6,00	-	27.660,00	X	6,00	165.960,00	
TRECHO III	0,00	0,00	6,00	-					
TRECHO IV	0,00	0,00	6,00	-					
					Total	=		165.960,00	
						Quantidade	=	Total (UN)	
						VALOR	MEDIÇÃO	Total	= 421.018,73

Alfenas-MG, 18 de fevereiro de 2026.

PROponente: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
 CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

STEFANI ALVES DOS SANTOS
 FISCAL DE CONTRATO - ENGº CIVIL - C
 MATRICULA - 48143/1

RODOLFO BORGES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
 MATRICULA - 523730


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

18/12/2026


CONTRATO: 081/2025	OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.	GESTOR DO CONTRATO: RODOLFO BORGES	RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA: RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PRAZO DIAS: 7ª MEDIÇÃO	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL: INICIO: 23/07/2025 TERMINO: 23/01/2026	DATAS LINHA DE BASE REPLANEJADA: INICIO: _____ TERMINO: _____	DATAS CRONOGRAMA CORRENTE: INICIO: 23/07/2025 TERMINO: 28/07/2026
PERÍODO DE ANÁLISE:		18/01/2026 - 02/02/2026	



LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA

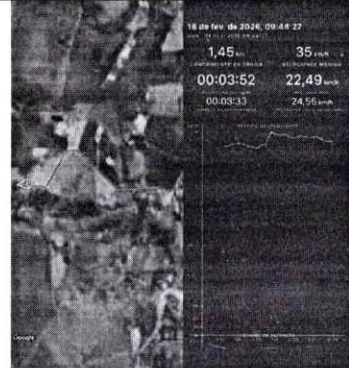


LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA

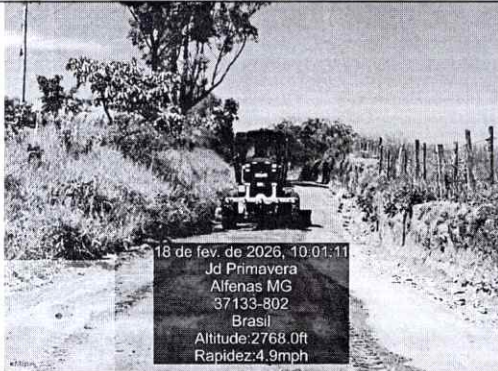

LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA




LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA

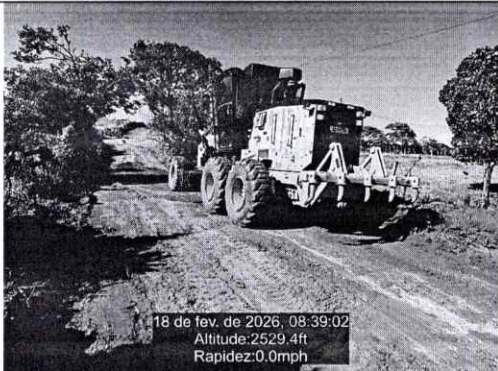


LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA



LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA

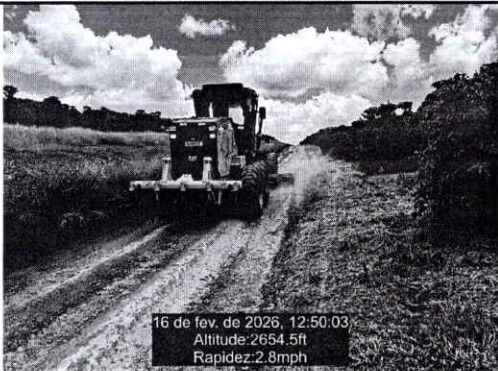

LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA

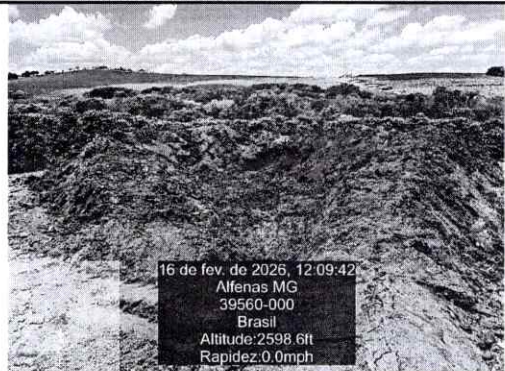

LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA

(Handwritten blue scribbles and marks)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

18/12/2026

CONTRATO:	OBJETO:	GESTOR DO CONTRATO:	RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA:	
081/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.	RODOLFO BORGES	RICARDO ELTRE SILVA GERALDO	
PRAZO DIAS:	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL:		DATAS LINHA DE BASE REPLANEJADA:	
7ª MEDIÇÃO	INICIO: 23/07/2025	TERMINO: 23/01/2026	INICIO: _____	TERMINO: _____
	DATAS CRONOGRAMA CORRENTE:		PERÍODO DE ANÁLISE:	
	INICIO: 23/07/2025	TERMINO: 28/07/2026	18/01/2026	02/02/2026



LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA




LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA




LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA



LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA

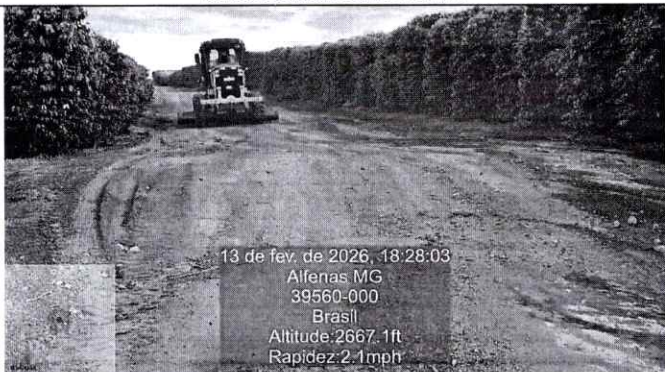

LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA

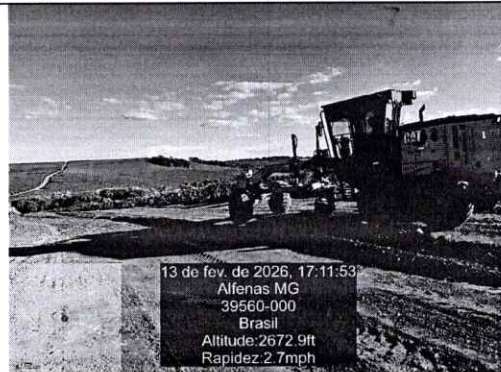

LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA



LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA



LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

18/12/2026

CONTRATO 081/2025	OBJETO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.	GESTOR DO CONTRATO RODOLFO BORGES	RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PRAZO DIAS 180	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL INICIO: 23/07/2025 TERMINO: 23/01/2026	DATAS LINHA DE BASE REPLANEJADA INICIO: _____ TERMINO: _____	DATAS CROQUIGRAMA CORRENTE INICIO: 23/07/2025 TERMINO: 28/07/2026
PERIODO DE ANALISE: 27/01/2026 18/02/2026			

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA



LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA



LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA



LOCAL OBRA: ESTRADAS DO BAIRRO MUQUIRANA

LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

LOCAL OBRA: ANGOLINHA RASPAGEM E CASCALHO

Handwritten signature in blue ink.



REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66

8ª MEDIÇÃO



ENDEREÇO: TV. Dinah Aparecida Fronteira Theodoro, nº 40, PQ Gabriel, Hortolândia-SP

TELEFONE: 19 - 98730-7976 FAX:

E-MAIL: REPLANLOCAÇÕES@OUTLOOK.COM

Ref.: Contrato nº 081/2025

Ref.: Dispensa Emergencial

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.

LOCAL DA OBRA: Paulinho Dr Euclides, Pílo Veio (ALFENAS-MG)

ORDENS DE SERVIÇOS Nº 002/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

COMPOSIÇÃO ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. C/ BDI	VALOR DE SALDO CONTRATO	QTDE. EXE. PERIODO	VALOR PERIODO	ACUMULADO	ACUMULADO	SALDO QTDE.	SALDO DE CONTRATO	PORC.
1	RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	m³	15.442,00	R\$ 50,60	R\$ 781.365,20	1.779,30	R\$ 90.032,58	1.779,30	R\$ 90.032,58	13.662,70	R\$ 691.332,62	12%
2	RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS E CORTE	m³	-	R\$ 64,40	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0%
3	LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE CANALETAS, BUEIROS, ESCADAS D'ÁGUA, CAIXAS E ALAS) COM ÊNFASE NA DRENAGEM E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES)	m²	-	R\$ 18,40	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100%
4	ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE CONCRETO	uni.	-	R\$ 4.255,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100%
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	uni.	-	R\$ 299,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100%
6	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250.	m	-	R\$ 46,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100%
7	DESOBSTRUÇÃO DE VIAS	m³	300,00	R\$ 345,00	R\$ 103.500,00	-	R\$ -	-	R\$ -	300,00	R\$ 103.500,00	0%
8	TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	m³	-	R\$ 80,50	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
9	LIMPEZA E REPAROS SIMPLES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	m	-	R\$ 494,50	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100%
10	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA ARTICULADA	m²	-	R\$ 1,15	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
11	IMPLEMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE BOLSÕES D'ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS	m³	10.000,00	R\$ 59,80	R\$ 598.000,00	1.937,84	R\$ 115.882,83	1.937,84	R\$ 115.882,83	8.062,16	R\$ 482.117,17	19%
12	PODA	m³	-	R\$ 57,50	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
13	REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	763.530,30	R\$ 2,30	R\$ 1.756.119,69	129.666,00	R\$ 298.231,80	129.666,00	R\$ 298.231,80	633.864,30	R\$ 1.457.887,89	17%
SUBTOTAL ITEM 6:					R\$ 3.238.984,89		R\$ 504.147,21		R\$ 504.147,21		R\$ 2.734.837,68	
					CONTRATADO		MED. PERIODO		ACUMULADO		SALD CONTRATO	
					R\$ 4.966.850,00		R\$ 504.147,21				R\$ 2.734.837,68	
EXECUTADO					SUBTOTAL	R\$ 1.727.865,11	R\$ 504.147,21		R\$ 2.232.012,32		R\$ 2.734.837,68	55%
					R\$ 1.727.865,11		R\$ 504.147,21		R\$ 2.232.012,32		R\$ 2.734.837,68	55%
VALOR DA MEDIÇÃO NO PERIODO: R\$ 504.147,21 (Quinhentos e quatro mil cento e quarenta sete reais e vinte um centavos)												

(Handwritten signature and mark)

Afenas-MG, 14 de abril de 2026.

PROPONENTE: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
0



STEFANI ALVES DOS SANTOS
FISCAL DE CONTRATO - ENGº CIVIL - CREA - MG 235594-D
MATRICULA - 48143/1



RODOLFO BORGES
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
MATRICULA - 523730

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

PROponente: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
 ENDEREÇO: TV. Dinah Aparecida Fronteira Theodoro, nº 40, PQ Gabriel, Hortolândia-SP
 CEP: 13186-816 CIDADE: HORTOLÂNDIA - SP ESTADO: SÃO PAULO
 8ª MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO	MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO
Serviços Preliminares						
1	RECOMPOSIÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASAREM COM ROSTRO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	M3	45.000,00			
	Til Comprimento M H Largura M3			Comprimento M	Largura H M3	
TRECHO I				-	6,00 0,15	-
TRECHO II	0,00 0,15 6,00			-		-
	0,00 0,15 6,00					-
					Total =	-
2	RECOMPOSIÇÃO DE ATERRIS E CORTE	M3	5.000,00			
	TRECHO I		H 0,20 X	Comprimento - X	Largura 6,00	Quant. M3 =
					Total 1,977,00	-
3	LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE CANALETAS, BUEIROS, ESCADAS	M2				1.779,30
			H X	Comprimento - X	100%	Quant. =
					100%	-
					100%	-
4	ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE CONCRETO	UNI				100%
			- X	- X	Largura	Quant. =
					100%	-
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	UNI				657,37
			- X	- X	Largura	1.947,21
					Total	-
6	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M.	M		#	#	
			X	- X	Largura	Quant. =
					Total	-
7	DESOBSTRUÇÃO DE VIAS	M3	300,00			
			H 0,33 X	Comprimento - X	Largura 1,00	Quant. =
					Total	-
Quatrocentos e vinte um mil dezoito reais e setenta tres centavos)						
8	TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	M3	1.000,00			
	TRECHO I		H 1,00 X	Comprimento 35,00 X	Largura 1,50	Quant. =
					Total	-
9	LIMPEZA E REPAROS SIMPLES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	M	200,00			
			- X	- X	Largura 1,00	Quant. =
					Total	-
Alfenas-MG, 14 de abril de 2026.						
10	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA ARTICULADA	M2				
	TRECHO I		0,00 3,00 0,00	Comprimento	Largura	
	TRECHO II		0,00 3,00 0,00	X	X	
					Total	=
11	IMPLEMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE BOLSÕES D'ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS	M3	10.000,00			
	BOLSÃO I		TOTAL M3 BOLSÕES	H	Comprimento	Largura
	BOLSÃO II	0,00		EMPOLAMENTO X	30% X	657,37
	BOLSÃO III	0,00			Total	=
12	PODA	M3	1.200,00			
	TRECHO I		0,00 1,00 0,50	H	Comprimento	Largura
	TRECHO II		0,00 1,00 0,50	X	X	
					Total	=
13	REGULARIZAÇÃO DE BASE (RASPAGE)					
	Til Comprimento Largura Quant.			Comprimento	Largura	Quant.
	TRECHO I		6,00			27.660,00
	TRECHO II		6,00	27,660,00 X	6,00	=
	TRECHO III	0,00	6,00			-
	TRECHO IV	0,00	6,00			-
					Total	=
					Quantidade	Total (UN)
				VALOR	MEDIÇÃO	Total = 504.147,21

Alfenas-MG, 14 de abril de 2026.

PROponente: REPLAN LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
 CNPJ/MF: 53.778.325/0001-66


STEFANI ALVES DOS SANTOS
 FISCAL DE CONTRATO - ENGº CIVIL - C
 MATRICULA - 48143/1

RODOLFO BORGES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
 MATRICULA - 523730


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

14/04/2026


CONTRATO 081/2025	OBJETO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.	GESTOR DO CONTRATO RODOLFO BORGES	RESPONSÁVEL DA OBRA- CONTRATADA RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PRAZO DIAS 8ª MEDIÇÃO	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL INICIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 23/01/2026	DATAS LINHA DE BASE REPLANEJADA INICIO: _____ TÉRMINO: _____	DATAS CROMOGRAMA CORRENTE INICIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 28/07/2026
		PERÍODO DE ANÁLISE 26/12/2025 06/03/2026	

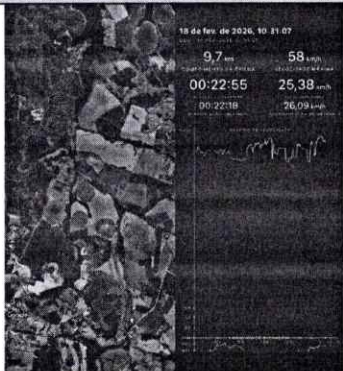

LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO

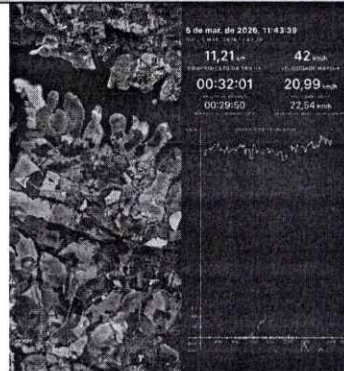


LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO

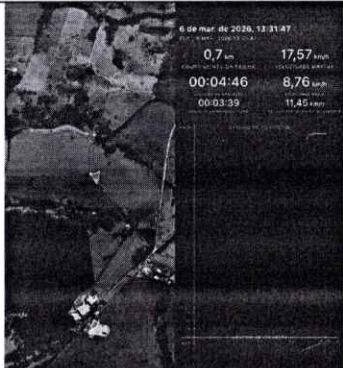

LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO



LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO

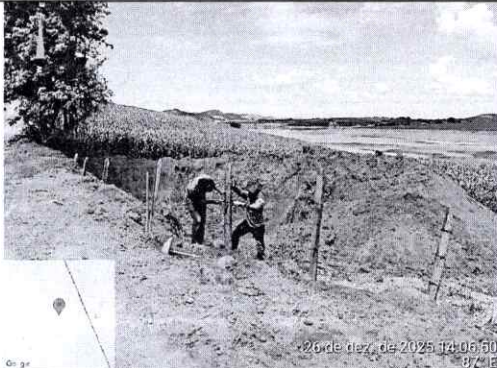

LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO



LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO



LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO




LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

14/04/2026


CONTRATO		OBJETO		GESTOR DO CONTRATO		RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA	
081/2025		CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.		RODOLFO BORGES		RICARDO ELTRE SILVA GERALDO	
PRAZO DIAS		DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL		DATAS LINHA DE BASE REPLANEJADA		DATAS CRONOGRAMA CORRENTE	
8ª MEDIÇÃO		INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
		23/07/2025	23/01/2026			23/07/2025	28/07/2026
						PERIODO DE ANALISE	
						26/12/2025 06/03/2026	

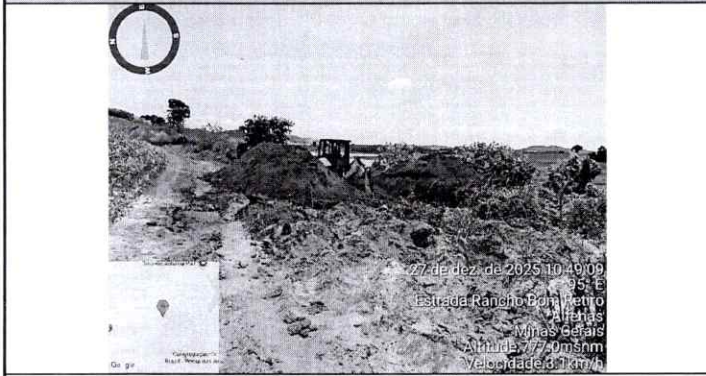


LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO




LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO

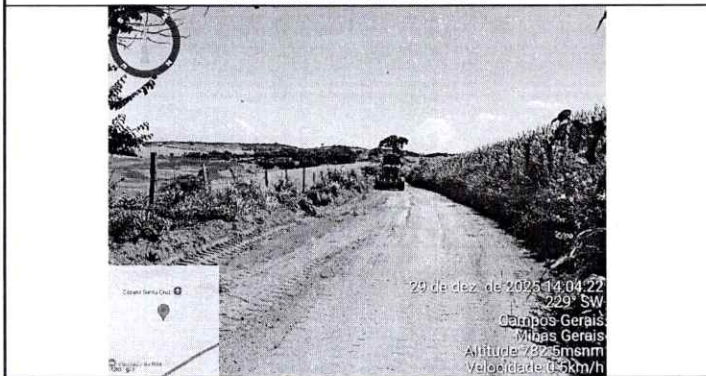

LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO

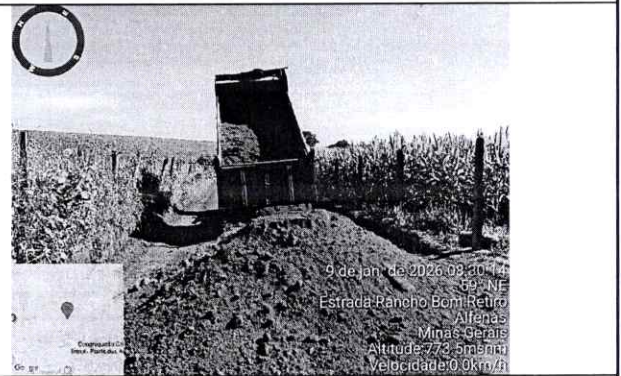

LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO

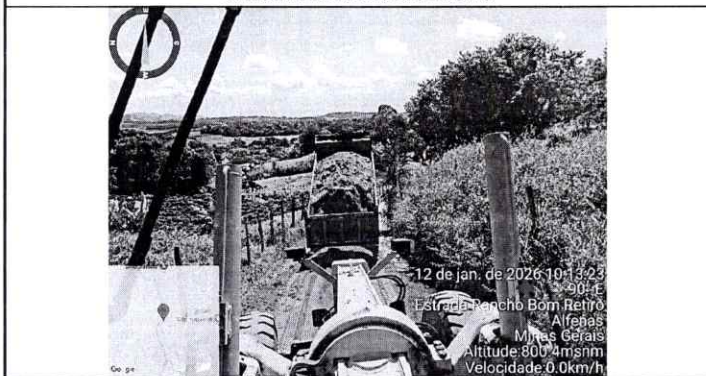


LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO



LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO



LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO

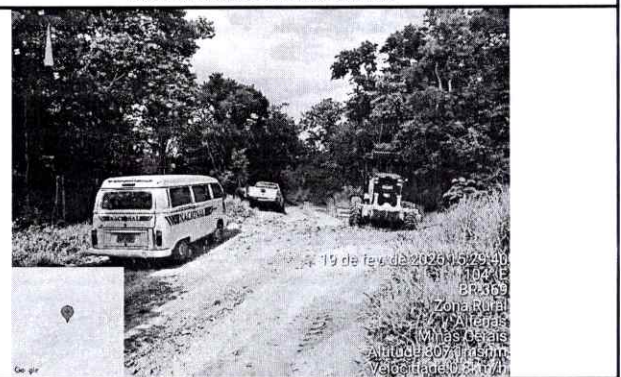

LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

14/04/2026

CONTRATO: 081/2025	OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.	GESTOR DO CONTRATO: RODOLFO BORGES	RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA: RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PRAZO DIAS: 8ª MEDIÇÃO	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL: INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 23/01/2026	DATAS LINHA DE BASE REPLANADA: INÍCIO: _____ TÉRMINO: _____	DATAS CRONOGRAMA CORRENTE: INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 28/07/2026
		PERÍODO DE ANÁLISE: 26/12/2025 06/03/2026	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO



LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO



LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO



LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO



LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO



LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO



LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO



LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO

A









R

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

14/04/2026

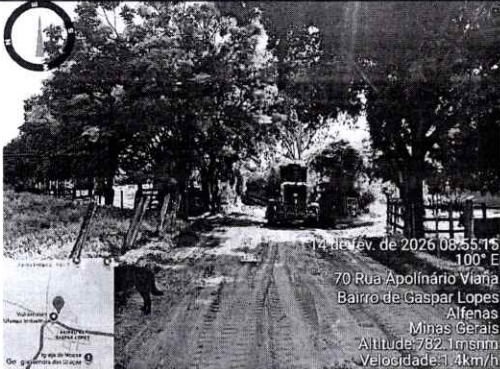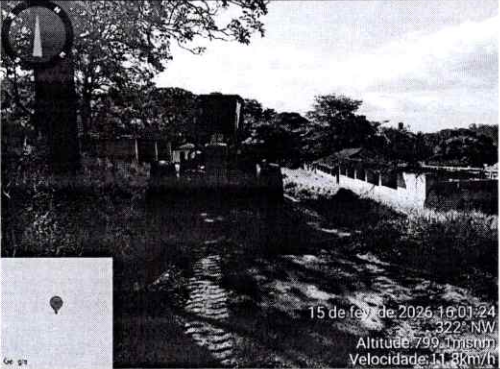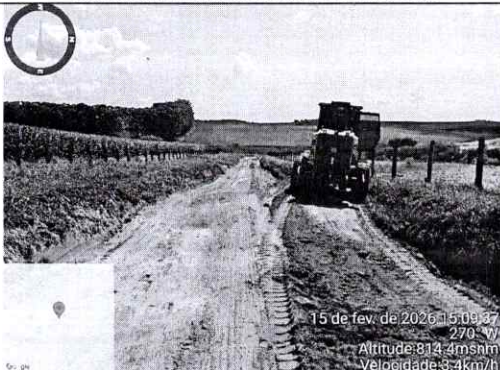CONTRATO	OBJETO	GESTOR DO CONTRATO	RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA
081/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.	RODOLFO BORGES	RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PRAZO DIAS	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL		PERÍODO DE ANÁLISE
8ª MEDIÇÃO	INÍCIO	TERMINO	
	23/07/2025	23/01/2026	26/12/2025
	DATAS LINHA DE BASE REPLANEJADA		
	INÍCIO	TERMINO	
	DATAS CRONOGRAMA CORRENTE		
	INÍCIO	TERMINO	
	23/07/2025	28/07/2026	

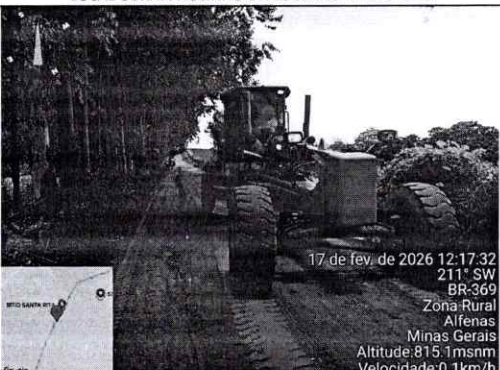RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

 <p style="font-size: small;">14 de fev. de 2026 08:55:15 100° E 70 Rua Apolinário Vianna Bairro de Gaspar Lopes Alfenas Minas Gerais Altitude: 782,1msnm Velocidade: 1,4km/h</p> <p>LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO</p>	 <p style="font-size: small;">15 de fev. de 2026 16:01:24 322° NW Altitude: 799,1msnm Velocidade: 11,3km/h</p> <p>LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO</p>
 <p style="font-size: small;">15 de fev. de 2026 15:09:37 270° W Altitude: 814,4msnm Velocidade: 3,3km/h</p> <p>LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO</p>	 <p style="font-size: small;">16 de fev. de 2026 09:22:43 120° SE Alfenas Minas Gerais Altitude: 793,6msnm Velocidade: 14,7km/h</p> <p>LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO</p>
 <p style="font-size: small;">16 de fev. de 2026 16:32:25 97° E Altitude: 763,3msnm Velocidade: 20,0km/h</p> <p>LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO</p>	 <p style="font-size: small;">17 de fev. de 2026 12:17:32 211° SW BR-369 Zona Rural Alfenas Minas Gerais Altitude: 815,1msnm Velocidade: 0,1km/h</p> <p>LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO</p>
 <p style="font-size: small;">17 de fev. de 2026 08:57:20 944° N Alfenas Minas Gerais Altitude: 828,8msnm Velocidade: 1,2km/h</p> <p>LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO</p>	 <p style="font-size: small;">17 de fev. de 2026 13:28:10 189° S Altitude: 790,6msnm Velocidade: 0,4km/h</p> <p>LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO</p>

R

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

14/04/2026

CONTRATO 081/2025	OBJETO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REFERENTES AS VIAS E ESTRADAS PUBLICAS.	GESTOR DO CONTRATO RODOLFO BORGES	RESPONSÁVEL DA OBRA - CONTRATADA RICARDO ELTRE SILVA GERALDO
PERÍODO DIAS 8ª MEDIÇÃO	DATAS LINHA DE BASE ORIGINAL INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 23/01/2026	DATAS LINHA DE BASE REPLANEJADA INÍCIO: _____ TÉRMINO: _____	DATAS CRONOGRAMA CORRENTE INÍCIO: 23/07/2025 TÉRMINO: 28/07/2026
		PERÍODO DE ANÁLISE 26/12/2025 06/03/2026	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO



LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO



LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO

LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO

LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO

LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO

LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO

LOCAL OBRA: PAULINHO DR EUCLIDES - PILÃO VEIO

Handwritten signature and mark in blue ink.
