

Junho



PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2025 / 2028

Secretaria Municipal de
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 202A/2025

De: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Para: Setor de Compras

A/C: Márcia Cristina Rodrigues

Prezado(a) Senhor(a),

Por meio desta, solicitamos a **autorização de fornecimento** referente à ordem de serviço realizada nas seguintes estradas:

- Estrada do Barranco Alto – Etapa 1: R\$ 102.509,36
- Estrada do Coroadó – Etapa 2: R\$ 29.283,13
- Estrada do Matão: R\$ 42.566,40
- Estrada do Aterro Sanitário: R\$ 15.523,20
- Estrada do Baguari: R\$ 334.282,65
- Estrada da Prainha: R\$ 59.467,16

Os serviços foram prestados pela empresa Minas e referem-se ao Subsídio do mês de junho de 2025, totalizando o valor de R\$ 604.876,74.

Dotação orçamentária: Ficha nº 628

Observação: Conforme orientação do procurador, o serviço que havia sido solicitado antes da Recomendação foi autorizado para execução.

Alfenas, 19 de setembro de 2025.


Décio Paulino da Costa

Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS GESTÃO 2025 / 2028	SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS
RECEBIDO EM		
Em: 24/09/25 às 15:12		
Procedência: _____		
_____ Nome Legível		



Alfenas, 07 de Maio de 2025.

Serviços a serem executados por ordem de prioridade

De: Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Para: Minas Concessionária

Relação de Estradas

Pontos Crítico por ordem de urgência

- 1) Monjolinho Já começou 07/05/2025
- 2) Mandassala Já começou 12/05/2025
- 3) Cascalho projeção de terminar o Monjolinho vai pra lá
- 4) Coroadó e Lage é só raspagem com água
- 5) Matão, Raspagem com água, poda, cerca, limpeza de bolsão
- 6) Fazenda da Ilha prioridade do prefeito
- 7) Baguari Raspagem com água
- 8) Prainha até o portão da Itapuã
- 9) Orlando Paulino / Angolinha
- 10) Caprivama raspagem
- 11) Barranco alto, Raspagem com água
- 12) Estrada Recanto dos Canarinos raspagem com água

Rodolfo Borges

Coordenador de Serviços



Prefeitura Municipal de Alfenas

CNPJ 18243220/0001-01

Prça Dr. Fausto Monteiro, 54 - Centro - CEP 37130-000 - Alfenas (MG)

Fone: (0xx35)3698-2030 - Fax: (0xx35)3698-2035 ou 3698-2039

E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br

Correspondência Interna

CI 106/2025

De: Procuradoria Geral do Município

Para: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural

A/C Sr. Décio Paulino da Costa/Andréa Araújo Carvalho Dias Lopes

Assunto: Parecer consulta pagamento Minas Concessionária.

Prezado Secretário,

Trata-se de consulta formulada pelo ilustre Secretário de Agricultura, Sr. Décio Paulino da Costa, sobre requerimento da empresa Minas Concessionária para que sejam empenhados os serviços constantes do relatório anexo, em que constam o número da Comunicação Interna (CI) em que se materializa a autorização de fornecimento, bem como, as datas de entrega do serviço para conferência e o respectivo valor.

A soma dos valores postulados se dá no valor de R\$2.170.803,65 (dois milhões, cento e setenta mil, oitocentos e três reais e sessenta e cinco centavos) na forma de tarifa.

O questionamento se dá em razão do fato de que o contrato celebrado com aquela empresa fazia a previsão expressa de que a apuração dos valores e os respectivos pagamentos seriam feitos na forma de subsídio, não de tarifa, que somente seria aplicada caso excedido o limite de valor para subsídio.

Informa, ainda, que o subsídio fora utilizado nos meses de janeiro e fevereiro, sendo que a partir do mês de março, quando o contrato com a referida empresa fora suspenso em razão de recomendação oriunda do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, não fora mais utilizado.

Posta a questão, a resposta é que as despesas devem ser cobradas e empenhadas na forma de subsídio, conforme previsto em contrato.

Ofício n.º: 06/2025

Assunto: Encaminha Relatório Mensal de Conformidade

Data: 23/05/2025

Ilustríssimo Senhor,


A **MINAS CONCESSIONÁRIA S.A**, por seu Presidente, Sr. **Abrão Adolpho Engel Neto**, vem, respeitosamente, através do presente, em cumprimento ao estabelecido na obrigação "ff" da Cláusula 8ª do Contrato de Concessão, encaminhar o Relatório Mensal de Conformidade referente ao mês de **Junho** de 2025.

Ante o exposto, conforme determina o § 2º do art. 3º da Lei nº 4.979/20, após o atesto de conformidade pelos órgãos de fiscalização e controle da execução contratual, requer-se a liberação do valor de **R\$ 604.876,74**, previstos à título de subsídio para o citado período, sendo **R\$ 453.657,55** referente ao item 2.1 Manutenção Corretiva - Máquinas e Equipamentos (regularização de superfícies com motoniveladora (cód. 100575); e outros **R\$ 151.219,18**, referente ao item 4.1 Manutenção Preventiva - Revestimento Primário; ambos da Planilha própria da tabela IX do Edital de Licitação.

Ao ensejo, elevamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos, como sempre, à vossa disposição para quaisquer outros novos esclarecimentos e providências que Vossa Senhoria julgue necessários.


ABRÃO ADOLPHO ENGEL NETO
Presidente


Ilmo. Sr. **Dedio Paulino**
DD. Secretário Municipal de Agricultura
Prefeitura Municipal



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS / MG
 OBRA: Estradas Barranco Alto Etapa 01
 LOCAL: ALFENAS-MG

EXECUÇÃO : Junho/25
 Orçamento Onerado

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista		Custo (R\$)		
					Compr.	Largura	Área	Unitário	Total
			Regularização de Base (Raspagem)	M2	21356,12	5,0	106780,6	0,96	102.509,36
			Recomposição e ou Construção de Camada de Cascalho Compactado (Revestimento Primário) (SEM UTILIZACAO De CASCALHO) Utilizado FRESA	M2			-	15,62	-
			Recomposição e ou Construção de Camada de Cascalho Compactado (Revestimento Primário)	M2			-	22,23	-
9	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	M2			4.611,31	22,23	102.509,36
10	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M3			-	41,26	-
11	Proc. 205/2021		LIPEZA E REPAROS SIMPLES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	M			-	7,51	-
12	Proc. 205/2021		CAPINA MECÂNICA COM ROÇADEIRAS PORTÁTEIS	M2			-	1,71	-
13	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS E CORTES	M3			-	36,56	-
14	Proc. 205/2021		REPAROS, LIPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE (CANALETAS, BUEIROS, ESCADAS D´ ÁGUA, CAIXAS E ALAS) COM ÊNFASE NA DRENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	M2			-	10,40	-
15	Proc. 205/2021		SINALIZAÇÃO VERTICAL	PLACA			-	513,12	-
16	Proc. 205/2021		MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE DIVISA	M			-	46,32	-
17	Proc. 205/2021		RECOLHIMENTO DE BARREIRAS	M3			-	62,50	-
18	Proc. 205/2021		TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	M2			-	68,28	-
19	Proc. 205/2021		MANUTENÇÃO DE CERCAS E MOURÕES E ARAMES	M			-	46,31	-
20	Proc. 205/2021		IMPLEMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÕES DE BOLSOES D´ ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS	M3			-	55,81	-
21	Proc. 205/2021		PAVIMENTAÇÃO SIMPLES ASFÁLTICA	M2			-	90,34	-
									102.509,36



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Objeto: Estrada Do Barranco Alto Etapa 01

Contrato:

Empresa Executora: Minas Concessionária

Serviços Executados

1. Regularização de Base (raspagem)

- Medição: 21356,12 m x 5 m = 106780,6,0m²
- Valor unitário: R\$ 0,96
- Valor total: R\$ 102.509,36

Total Geral da Obra: R\$ 102.509,36


Pagamento com Parte do Subsidio do mês de Junho de 2025

Referente a ordem de serviço de 07 de Maio /2025 foi usado o subsidio para com devida aprovação da procuradoria em anexo para bater os valores dos subsídios dividimos as planilhas tudo com autorização da procuradoria (em anexo)

Evidências da Execução

- Regularização de base (raspagem)



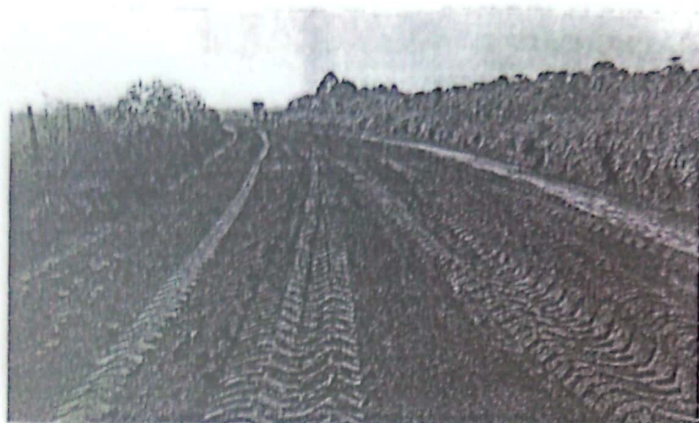

A foto acima mostra uma área que dificultava o trânsito de carretas pesadas, especialmente



em períodos de chuva.





PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2025 / 2028

Secretaria Municipal de
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL



Andréa Araújo Carvalho Dias Lopes

Engenheira Agrônoma

Fiscal do Contrato

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS / MG
 OBRA: Estrada Prainha (Santa Clara x Portaria Itapuan 2)
 LOCAL: ALFENAS-MG

EXECUÇÃO : Julho/25
 Orçamento Onerado

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Área	Unitário	Custo (R\$)	Total
					Compr.	Largura			
9	Proc. 205/2021		Regularização de Base (Raspagem)	M2	2708,29	5,0	13541,5	0,96	12.999,79
10	Proc. 205/2021		Recomposição e ou Construção de Camada de Cascalho Compactado (Revestimento Primário) (SEM UTILIZAÇÃO DE CASCALHO) Utilizado FRESA	M2			-	15,62	-
11	Proc. 205/2021		Recomposição e ou Construção de Camada de Cascalho Compactado (Revestimento Primário)	M2	418,06	5,0	2.090,30	22,23	46.467,37
12	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	M2			2.675,09	22,23	59.467,16
13	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M3			-	41,26	-
14	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M3			-	7,51	-
15	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M3			-	1,71	-
16	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M3			-	36,56	-
17	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M2			-	10,40	-
18	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M2			-	513,12	-
19	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M			-	46,32	-
20	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M2			-	62,50	-
21	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M			-	68,28	-
			RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M			-	46,31	-
			RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M3			-	55,81	-
			RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M2			-	90,34	-
			RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS				-		59.467,16



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Objeto: Estrada da Prainha (trecho do Bairro Santa Clara até o portão da Fazenda Itapuã)

Contrato:

Empresa Executora: Minas Concessionária

Serviços Executados

1. Regularização de Base (raspagem)

- Medição: 2.708,29 m x 5 m = **13.541,5 m²**
- Valor unitário: R\$ 0,96
- Valor total: R\$ 12.999,79

2. Recomposição ou Construção de Camada de cascalho Compactado (revestimento Primário)

- Medição: 418 m x 5 m = **2.090,30 m²**
- Valor unitário: R\$ 0,96
- Valor total: R\$ 46.467,37

Total Geral da Obra: R\$ 59.467,16

Pagamento Parte do Subsidio do mês de junho de 2025

Evidências da Execução


- Regularização de base (raspagem)
- Recomposição ou Construção de Camada de cascalho Compactado (revestimento Primário)





PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2025 / 2028

Secretaria Municipal de
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

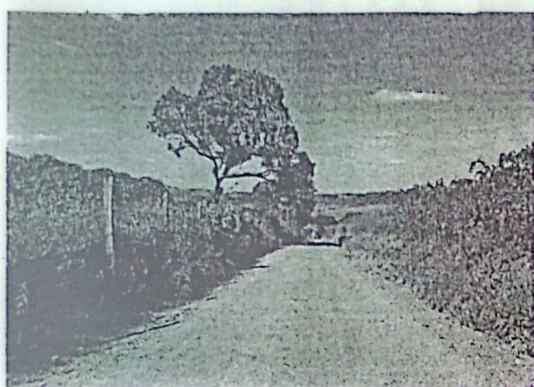

**OBS: foi utilizado cascalho somente
nos pontos críticos.**


Andréa Araújo Carvalho Dias Lopes
Fiscal do Contrato

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS / MG
 OBRA: Estradas Baguari
 LOCAL: ALFENAS-MG

EXECUÇÃO : Julho/25
 Orçamento Onerado

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Compr.	Largura	Area	Unitário	Custo (R\$)	Total
			Regularização de Base (Raspagem)	M2	1586,00	5,0	7930,0	0,96	15,62	7.612,80
			Recomposição e ou Construção de Camada de Cascalho Compactado (Revestimento Primário) (SEM UTILIZACAO De CASCALHO) Utilizado FRESA	M2			-			-
			Recomposição e ou Construção de Camada de Cascalho Compactado (Revestimento Primário)	M2	2939,00	5,0	14.695,00	22,23	326.669,85	326.669,85
9	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	M2			15.037,46	22,23	334.282,65	334.282,65
10	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M3			-	41,26		-
11	Proc. 205/2021		LIMPEZA E REPAROS SIMPLES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	M			-	7,51		-
12	Proc. 205/2021		CAPINA MECÂNICA COM ROÇADEIRAS PORTÁTEIS	M2			-	1,71		-
13	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS E CORTES	M3			-	36,56		-
14	Proc. 205/2021		REPAROS, LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE (CANALETAS, BUEIROS, ESCADAS D'ÁGUA, CAIXAS E ALAS) COM ÊNFASE NA DRENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	M2			-	10,40		-
15	Proc. 205/2021		SINALIZAÇÃO VERTICAL	PLACA			-	513,12		-
16	Proc. 205/2021		MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE DIVISA	M			-	46,32		-
17	Proc. 205/2021		RECOLHIMENTO DE BARREIRAS	M3			-	62,50		-
18	Proc. 205/2021		TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	M2			-	68,28		-
19	Proc. 205/2021		MANUTENÇÃO DE CERCAS E MOURÕES E ARAMES	M			-	46,31		-
20	Proc. 205/2021		IMPLEMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÕES DE BOLSOES D'ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS	M3			-	55,81		-
21	Proc. 205/2021		PAVIMENTAÇÃO SIMPLES ASFALTICA	M2			-	90,34		-
										334.282,65



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Objeto: Estrada do Baguari

Contrato:

Empresa Executora: Minas Concessionária

Serviços Executados

1. Regularização de Base (raspagem)

- Medição: 1.586,0 m x 5 m = 7.930,0m²
- Valor unitário: R\$ 0,96
- Valor total: R\$ 7.612,80

2. Recomposição ou Construção de Camada de cascalho Compactado (revestimento Primário)

- Medição: 2939,0 m x 5 m = 14.695,0 m²
- Valor unitário: R\$ 0,96
- Valor total: R\$ 326.669,85

Total Geral da Obra: R\$ 334.282,65

Pagamento Parte do Subsidio do mês de junho de 2025

Evidências da Execução

- Regularização de base (raspagem)
- Recomposição ou Construção de Camada de cascalho Compactado (revestimento Primário)





OBS: foi utilizado cascalho somente nos pontos críticos.





PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2025 / 2028

Secretaria Municipal de
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL






Andréa Araújo Carvalho Dias Lopes
Fiscal do Contrato

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS / MG
 OBRA: Estrada Coroado 2 Etapa 02 (Matão x Estrada Coroado)
 LOCAL: ALFENAS-MG

EXECUÇÃO : Junho/25
 Orçamento Onerado

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista		Unitário	Custo (R\$)	Total
					Compr.	Largura	Area		
		</							



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Objeto: Estrada do Coroadó (Matao até o coroadó continuação) 2º Etapa

Contrato:

Empresa Executora: Minas Concessionária

Serviços Executados

1. Recomposição ou Construção de Camada de Cascalho compactado (Revestimento Primário)

- Medição: 263,46 m x 5 m = 1.317,28m²
- Valor unitário: R\$ 22,23
- Valor total: R\$ 29.283,13

Justificativa: foi um perímetro que necessitou atenção pois os moradores tem muita dificuldade no tempo de chuvas, para que não houvesse transtornos aumentamos mais esta área após análise da necessidade.

Total Geral da Obra: R\$29.283,13

Pagamento do Subsidio do mês de junho de 2025

OBS: estes pagamentos são referentes a ordem de Serviço do dia 07 de maio.

Como estava atendendo a recomendação do MP o subsídio de Março não tinha sido usado, em esclarecimento com a procuradoria utilizamos o subsidio para pagamento.


Referente a ordem de serviço de 07 de Maio /2025 foi usado o subsidio para com devida aprovação da procuradoria em anexo para bater os valores dos subsídios dividimos as planilhas tudo com autorização da procuradoria (em anexo)



Evidências da Execução



Este trecho a patrol vindo com a lamina deitada limpando e

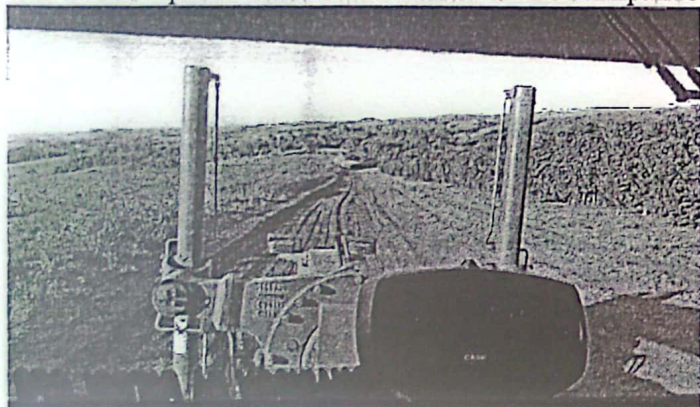

logo após esparramando o cascalho onde necessitou foi em um curto espaço.



PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2025 / 2028

Secretaria Municipal de
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL



Andréa Araújo Carvalho Dias Lopes
Fiscal do Contrato

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS / MG

OBRA: Estrada Matão

LOCAL: ALFENAS-MG

EXECUÇÃO: Junho/25

Orçamento Operado

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Compr.	Largura	Area	Unitário	Custo (R\$)	Total
			Regularização de Base (Raspagem)	M2	7390,00	6,0	44340,0	0,96	42.566,40	
			Recomposição e ou Construção de Camada de Cascalho Compactado (Revestimento Primário) (SEM UTILIZAÇÃO DE CASCALHO) Utilizado FRESA	M2			-	15,62		
			Recomposição e ou Construção de Camada de Cascalho Compactado (Revestimento Primário)	M2			-	22,23		
9	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	M2			1.914,82	22,23	42.566,40	
10	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M3			-	41,26		
11	Proc. 205/2021		LIMEZA E REPAROS SIMPLES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	M			-	7,51		
12	Proc. 205/2021		CAPINA MECÂNICA COM ROÇADEIRAS PORTÁTEIS	M2			-	1,71		
13	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS E CORTES	M3			-	36,56		
14	Proc. 205/2021		REPAROS, LIMEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE (CANALETAS, BUEIROS, ESCADAS D' ÁGUA, CAIXAS E ALAS) COM ÊNFASE NA DRENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	M2			-	10,40		
15	Proc. 205/2021		SINALIZAÇÃO VERTICAL	PLACA			-	513,12		
16	Proc. 205/2021		MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE DIVISA	M			-	46,32		
17	Proc. 205/2021		RECULHIMENTO DE BARREIRAS	M3			-	62,50		
18	Proc. 205/2021		TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	M2			-	68,28		
19	Proc. 205/2021		MANUTENÇÃO DE CERCAS E MOURÕES E ARAMES	M			-	46,31		
20	Proc. 205/2021		IMPLEMANTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÕES DE BOLSOES D' ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS	M3			-	55,81		
21	Proc. 205/2021		PAVIMENTAÇÃO SIMPLES ASFALTICA	M2			-	90,34		
									42.566,40	



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Objeto: Estrada do Matao

Contrato:

Empresa Executora: Minas Concessionária

Serviços Executados

A estrada do Matão foi somente regularização de Base já Havia feito um serviço anterior onde desta vez só retiramos as imperfeições pois já havia material na estrada e aproveitamos o mesmo.

1. Regularização de Base (raspagem)

- Medição: $7390,0\text{m} \times 6\text{m} = 44340,0\text{m}^2$
- Valor unitário: R\$ 0,96
- Valor total: R\$ 42.556,40

Total Geral da Obra: R\$ 42.566,40

Pagamento Parte do Subsidio do mês de junho de 2025

Referente a ordem de serviço de 07 de Maio /2025 foi usado o subsidio para com devida aprovação da procuradoria em anexo para bater os valores dos subsídios dividimos as planilhas tudo com autorização da procuradoria (em anexo)

Evidências da Execução


- Regularização de base (raspagem) com agua para assentar o material





PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2025 / 2028

Secretaria Municipal de
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

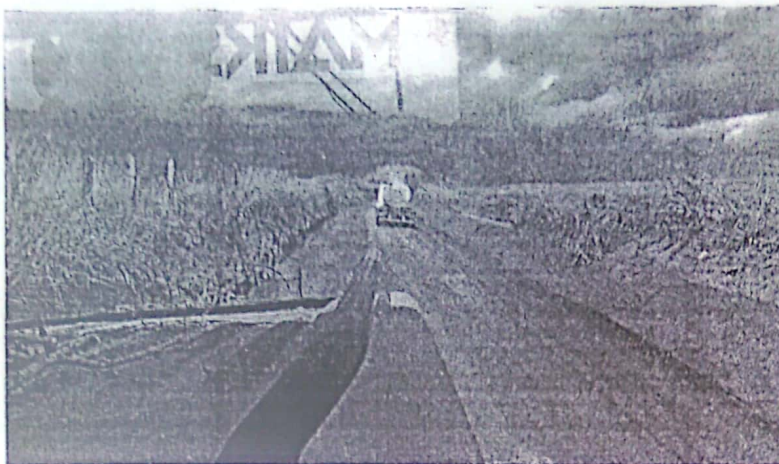

Andrea Araujo Carvalho Dias Lopes

Fiscal do Contrato

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS / MG
 OBRA: Estrada Aterro Sanitário
 LOCAL: ALFENAS-MG

EXECUÇÃO: Julho/25

Orçamento Onerado

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista			Custo (R\$)	
					Compr.	Largura	Area	Unitário	Total
			Regularização de Base (Raspagem)	M2	2940,00	5,5	16170,0	0,96	15.523,20
			Recomposição e ou Construção de Camada de Cascalho Compactado (Revestimento Primário) (SEM UTILIZAÇÃO De CASCALHO) Utilizado FRESA	M2			-	15,62	-
			Recomposição e ou Construção de Camada de Cascalho Compactado (Revestimento Primário)	M2			-	22,23	-
9	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	M2			698,30	22,23	15.523,20
10	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M3			-	41,26	-
11	Proc. 205/2021		LIMPEZA E REPAROS SIMPLES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	M			-	7,51	-
12	Proc. 205/2021		CAPINA MECÂNICA COM ROÇADEIRAS PORTÁTEIS	M2			-	1,71	-
13	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS E CORTES	M3			-	36,56	-
14	Proc. 205/2021		REPAROS, LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE (CANALETAS, BUEIROS, ESCADAS D'ÁGUA, CAIXAS E ALAS) COM ÊNFASE NA DRENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	M2			-	10,40	-
15	Proc. 205/2021		SINALIZAÇÃO VERTICAL	PLACA			-	513,12	-
16	Proc. 205/2021		MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE DIVISA	M			-	46,32	-
17	Proc. 205/2021		RECOLHIMENTO DE BARREIRAS	M3			-	62,50	-
18	Proc. 205/2021		TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	M2			-	68,28	-
19	Proc. 205/2021		MANUTENÇÃO DE CERCAS E MOURÕES E ARMAS	M			-	46,31	-
20	Proc. 205/2021		IMPLEMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÕES DE BOLSOES D'ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS	M3			-	55,81	-
21	Proc. 205/2021		PAVIMENTAÇÃO SIMPLES ASFÁLTICA	M2			-	90,34	-
									15.523,20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Objeto: Estrada do Aterro sanitário

Contrato:

Empresa Executora: Minas Concessionária

Serviços Executados

O Aterro sanitário faz parte do coroado/ laje saindo por baixo liga ao aterro.

1. Regularização de Base (raspagem)

- Medição: $2940,0\text{m} \times 5,5\text{m} = 16170,0\text{m}^2$
- Valor unitário: R\$ 0,96
- Valor total: R\$ 15.523,20

Total Geral da Obra: R\$ 15.523,20

Pagamento Parte do Subsidio do mês de junho de 2025

Referente a ordem de serviço de 07 de Maio /2025 foi usado o subsidio para com devida aprovação da procuradoria em anexo para bater os valores dos subsídios dividimos as planilhas tudo com autorização da procuradoria (em anexo)

Evidências da Execução

- Regularização de base (raspagem)





PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2025 / 2028

Secretaria Municipal de
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL



Andréa Araújo Carvalho Dias Lopes

Fiscal do Contrato

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS / MG
 OBRA: Estrada Laje + Acessos
 LOCAL: ALFENAS-MG

EXECUÇÃO: Julho/25

Organismo Onerado

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Compl.	Quantidade Prevista	Area	Unitário	Custo (R\$)	Total
						Largura				
9	Proc. 205/2021		Regularização de Base (Raspagem)	M2	4917,78	4,5	22130,0	0,96	21,244,80	
10	Proc. 205/2021		Recomposição e ou Construção de Camada de Cascalho Compactado (Revestimento Primário) (SEM UTILIZAÇÃO DE CASCALHO) Utilizado FRESA	M2				15,62		
11	Proc. 205/2021		Recomposição e ou Construção de Camada de Cascalho Compactado (Revestimento Primário)	M2				22,23		
12	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CAMADA DE CASCALHO COMPACTADO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	M2			955,68	22,23	21,244,80	
13	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M3				41,26		
14	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M3				7,51		
15	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M3				1,71		
16	Proc. 205/2021		RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS	M3				36,56		
17	Proc. 205/2021		REPAROS, LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTE (CANALETAS, BUEIROS, ESCADAS D' ÁGUA, CAIXAS E ALAS) COM ÊNFASE NA DRENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	M2				10,40		
18	Proc. 205/2021		SINALIZAÇÃO VERTICAL	PLACA				513,12		
19	Proc. 205/2021		MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE DIVISA	M				46,32		
20	Proc. 205/2021		RECOLHIMENTO DE BARREIRAS	M3				62,50		
21	Proc. 205/2021		TAPA BURACOS EM PONTOS LOCALIZADOS	M2				68,28		
			MANUTENÇÃO DE CERCAS E MOURÕES E ARAMES	M				46,31		
			IMPLEMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÕES DE BOLSOES D' ÁGUA AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS	M3				55,81		
			PAVIMENTAÇÃO SIMPLES ASFÁLTICA	M2				90,34		
										21.244,80





RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Objeto: Estrada que liga o Coroado a Laje Laje acessos

Contrato:

Empresa Executora: Minas Concessionária

Serviços Executados

1. Regularização de Base (raspagem).

- Medição: $4914,78\text{m} \times 4,5\text{m} = 22.130,0\text{m}^2$
- Valor unitário: R\$ 0,96
- Valor total: R\$ 21.244,80

Total Geral da Obra: R\$ 21.244,80

Pagamento Parte do Subsidio do mês de junho de 2025

Referente a ordem de serviço de 07 de Maio /2025 foi usado o subsidio para com devida aprovação da procuradoria em anexo para bater os valores dos subsídios dividimos as planilhas tudo com autorização da procuradoria (em anexo)

Evidências da Execução

- Regularização de base (raspagem)





PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2025 / 2028

Secretaria Municipal de
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL





PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2025 / 2028

Secretaria Municipal de
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Andréa Araújo Carvalho Dias Lopes

Fiscal do Contrato
